



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 22 de junho de 2022.

Memorando Nº 349/2022 – SEMOSP/PMP

CÓPIA

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

Senhor Prefeito,



AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML e TERMO CONTRATO Nº 008-2022-SEMOSP,, contendo os anexos listados abaixo da Empresa T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.351.686/0001-75, referente à 1ª (primeira) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 129/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 007 no valor de R\$ 85.277,59 (oitenta e cinco mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) Medição dos Serviços Executados
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico.
- ✓ Diário de Obras.

Fonte pagadora: 010 – Recursos Próprios

Atenciosamente,



Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 29.06.2022
Hora: 9:15

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 22 de junho de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 129/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		JUNHO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML - CARTA CONTRATO Nº 008/2022-SEMOSP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL/BOLETO DE RRT/ART		Nº	7
CREDOR:	T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
CNPJ/ CPF	37.351.686/0001-75		PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Cel. Conrado Niemeyer, 120 - Manaus-AM			FONE:	
OBJETO:	Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Unid.	Ref. a 1º (primeira) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.		R\$85.277,59	85.277,59
FICHA Nº		RECURSO:	DADOS BANCÁRIOS:		
				SOMA:	R\$ 85.277,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PARINTINS-AM

At.: Engº. Denner Cardoso Brelaz

Engenheiro Fiscal do Contrato.

Ref.: Medição 1 do Contrato 008/2022

A empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob CNPJ **37.351.686/0001-75**, aqui representada por seu Sócio Administrador **SR. FABIANO FONSECA DA SILVA**, inscrito sob CPF **012.275.862-56**, vem através deste solicitar **ANALISE** do processo da **PRIMEIRA MEDIÇÃO**, no valor de **R\$85.277,59**, referente a **ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICIPIO DE PARINTINS-AM.**

Aguardando retorno sobre os assuntos tratados,

Parintins – AM, 20 de Junho de 2022


T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ 37.351.686/0001-75
FABIANO FONSECA DA SILVA
CPF 012.275.862-56

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO CORA - 403

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 1602544-9

[37.351.686/0001-75]

T F COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Coronel Conrado Niemeyer, n 120 Petropolis

CEP 69 063-550

[MANAUS

AM]



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

78F2.9752.D61B

Data/Hora da emissão

22/06/2022 - 10:35:17

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

7

Prestador de Serviços

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, 120,
PETRÓPOLIS, Telefone: .
CEP 69063550 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 37.351.686/0001-75
Email JSANTOSNAVEGACAO@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

46672401

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 11.429.713/0001-91
Endereço PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,
Bairro CENTRO, Telefone: .
69151271
Cidade PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA REFERENTE A MEDIÇÃO 1 CUJO OBJETO É ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM DE ACORDO COM CONTRATO 008.2022 - BASE DE CÁLCULO INSS: R\$85.277,59 X 40% (MÃO DE OBRA) = R\$34.111,04 X 3,5% = R\$1.193,89 (MIL CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
85.277,59	1,00	0,00	0,00	85.277,59	0,00	0,00	85.277,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.277,59

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	85.277,59	

Outras Informações

- Competência: Junho/2022- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materiais foram
entregues serviços
prestados de conformidade com

a Nota de Empenho.

Em: 22/06/2022

Denner Cardoso Breiaz
DENNER CARDOSO BRELAZ

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148





ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%/Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
1			ADMINISTRAÇÃO					42.201,11		21100,55		21100,55		
1.1	100319	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	16.590,89	20.658,97	20.658,97	0,50	10329,48	0,50	10329,48	50,00%	50,00%
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.650,08	10.771,07	21.542,14	1,00	10771,07	1,00	10771,07	50,00%	50,00%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.362,44		0,00		2362,44		
2.1	CPU - 01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	316,21	393,74	2.362,44		0,00	6,00	2362,44	0,00%	100,00%
3			DEMOLIÇÕES					4.608,19		2950,23		1657,96		
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	28,87	50,47	62,84	1.814,19	28,87	1814,19	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.2	97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	6	141,96	176,76	1.060,56				1060,56	0,00%	100,00%
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	145	3,31	4,12	597,40		0,00	145,00	597,40	0,00%	100,00%
3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,88	8,12	10,11	59,44	5,88	59,44	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM
Fábio de Souza da Silva



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
3.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	28	30,88	38,45	1,076,60	28,00	1076,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4			ESTRUTURA DA LAJE CAIXA D'ÁGUA					23.315,81		23315,81		0,00		
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	8,64	87,48	108,93	941,15		941,15	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	2,25	114,95	143,13	322,04		322,04	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	5,76	172,48	214,77	1,237,07		1237,07	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	22,46	87,30	108,70	2,441,40		2441,40	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.5	92781	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	84,08	13,08	16,28	1,368,82		1368,82	0,00	0,00	100,00%	0,00%

CREA 21642 D/AM
Engenheiro Civil
Rubiano Cordeiro da Silva



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
4.6	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	602,31	10,55	13,13	7.908,33	602,31	7908,33	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.7	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,17	437,85	545,21	92,68	0,17	92,68	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,32	579,95	722,15	6.730,43	9,32	6730,43	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,32	195,94	243,98	2.273,89	9,32	2273,89	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5			COBERTURA					55.045,19		0,00		55045,19		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,72	54,97	68,44	10.794,35			157,72	10794,35	0,00%	100,00%



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
5.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7	2.343,84	2.918,54	20.429,78	0,00	0,00	7,00	20429,78	0,00%	100,00%
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	157,72	95,78	119,26	18.809,68	0,00	0,00	157,72	18809,68	0,00%	100,00%
5.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,96	57,20	71,22	709,35	0,00	0,00	9,96	709,35	0,00%	100,00%
5.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,8	70,49	87,77	3.493,24	0,00	0,00	39,80	3493,24	0,00%	100,00%
5.6	CPU REF. SINAPI COD 75220	Próprio	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m²	12,05	53,91	67,12	808,79	0,00	0,00	12,05	808,79	0,00%	100,00%
6			VEDAÇÃO					55.572,15	24503,22			31068,93		

Fabiano Crispina da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%/Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01			SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE			
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	142,32	84,25	104,90	14.929,36	142,32	14929,36	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	284,64	4,68	5,82	1.656,60	284,64	1656,60	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	284,64	44,68	55,63	15.834,52						
6.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021 P	m²	27,39	678,82	845,26	23.151,67						
7			PISOS E REVESTIMENTOS											
7.1	GPU2 REF. SINAPI-11/19 COD 72137	Próprio	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	105,63	112,57	140,17	25.052,93		0,00		25052,93	0,00%	100,00%
								14.806,15		0,00	105,63	14806,15	0,00%	100,00%

Fabiano Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
7.2	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	113,79	72,32	90,05		10.246,78				
8			FORRO										
8.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	122,08	84,26	104,92		12.808,63		12.808,63		
9			ESQUADRIAS										
9.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	32,76	826,21	1.028,79		47.417,56		47.417,56		
9.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,2	451,28	561,93		2.360,10		2.360,10		

Fabiano Fagundes da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642-D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%; Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
9.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,4	735,36	915,67		11.354,30				
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	213,26	265,55		7.695,18 6.373,20		7695,18		
10.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11	39,33	48,97		538,67				
10.3	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22	25,55	31,81		699,82				

Engenheiro Civil
CRM: 212942-2/DIAM
Fidelidade Profissional



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%/Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
10.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	67,05	83,49	83,49						
11			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					25.856,11		6334,86		19521,25		
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16	128,24	159,68	2.554,88		0,00	16,00	2554,88	0,00%	100,00%
11.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	63,48	79,04	1.976,00		0,00	25,00	1976,00	0,00%	100,00%

Edição corrigida SINAPI
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								Quantidade	Total	Quantidade	Total		
11.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	52,53	65,41		1.635,25	0,00	1635,25	0,00%	100,00%
11.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	2.308,90	2.875,04		2.875,04				
11.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	2.778,53	3.459,82	1,00	3.459,82	0,00	0,00	100,00%	0,00%

01/12/2022
Engenharia E
Materiais de Construção
CREA 2121642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	418,15	520,68	0,00	520,68	1,00	520,68	0,00%	100,00%
11.7	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	336,24	418,68	0,00	1.674,72	4,00	1674,72	0,00%	100,00%
11.8	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	317,09	394,84	0,00	1.974,20	5,00	1974,20	0,00%	100,00%

Prof. Dr. Sílvia
Ilvian C. de
F. de
Engenheiro Civil
CREA 224622 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDERECO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERIODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	504,58	628,30		628,30	0,00	628,30	0,00%	100,00%
11.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	306,44	381,57		763,14	0,00	763,14	0,00%	100,00%
11.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.150,70	1.432,85		5.731,40	0,00	5731,40	0,00%	100,00%
11.12	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	13,54	16,86		118,02	0,00	118,02	0,00%	100,00%

Edição: 12/2021
Engenheiro Civil
CREA 21643 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 01 (PRIMEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 1: R\$85.277,59
SALDO REMANESCENTE: R\$243.213,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO 01		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)	
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL			
11.13	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	780,87	972,33	1.944,66							
12			PINTURA					18.612,35		0,00		18612,35			
12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	422,72	2,05	2,55	1.077,93		0,00		422,72	0,00%	100,00%	
12.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	422,72	22,40	27,89	11.789,66		0,00		422,72	0,00%	100,00%	
12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	422,72	10,92	13,59	5.744,76		0,00		422,72	0,00%	100,00%	
13			DIVERSOS					7.943,61		7072,92		870,69			
13.1	CPU 3.9.2	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TRIPULAÇÃO	CHP	12	473,35	589,41	7.072,92	12,00	7072,92		0,00	100,00%	0,00%	
13.2	CPU 115	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40" CM X *60" CM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1	699,24	870,69	870,69		0,00		1,00	0,00%	100,00%	
Total Geral =>						328.491,26			MEDIÇÃO 01 =>		85.277,59		SALDO =>		
												243.213,66		25,96%	
OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS															
												74,04%			

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os _____ materiais _____ foram entregues _____ serviços _____ prestados _____ de conformidade com a Nota de Empenho.
Em _____, _____ de _____, 2022

Denner Brelaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA /AM - 32148

CREA 21642 D/AM
Engenheiro Civil
Fidelidade Profissional
Símbolo



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

TRANSPORTE MATERIAL VIA FLUVIAL



MATERIAL DESCARREGADO



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO



ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO



Fabiano Engesa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO



ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO

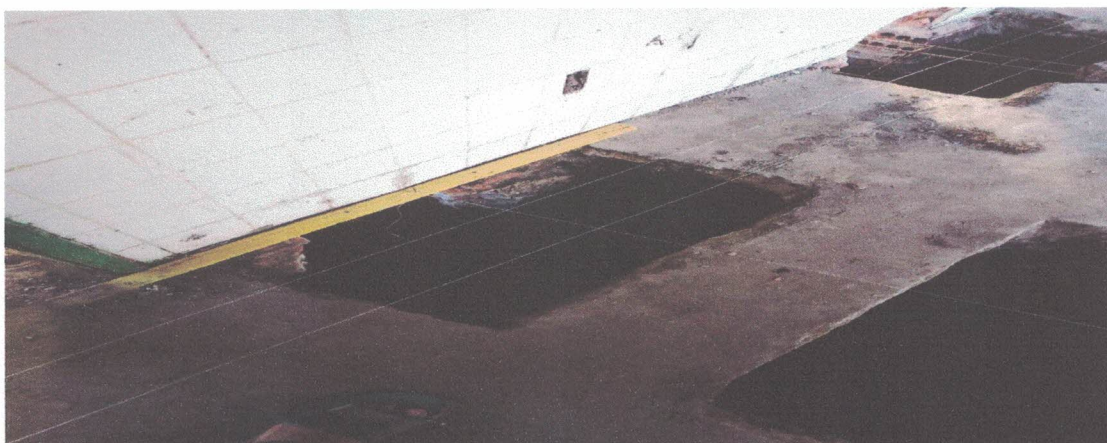

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDACAO

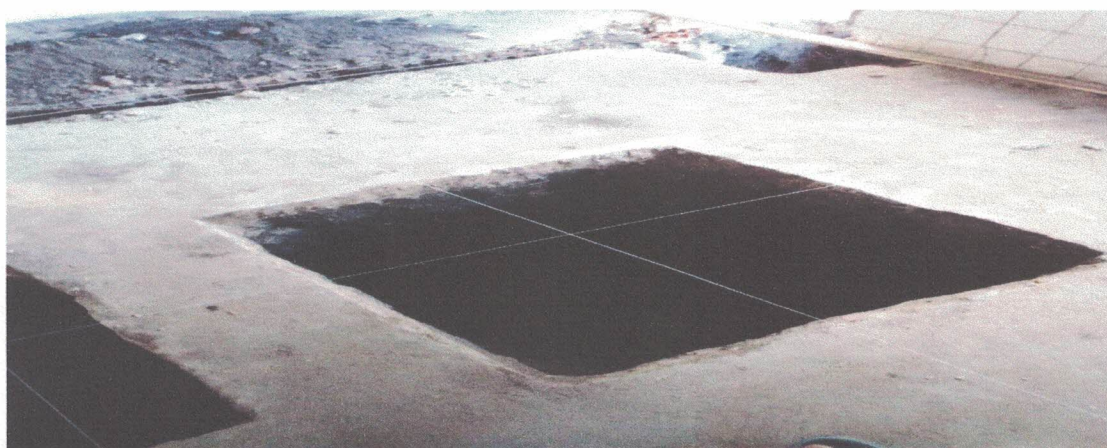

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO



CONCRETAGEM DOS ARRANQUES DOS PILARES E VIGAS DE FUNDAÇÃO



Fabiano Ferreira da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CONCRETAGEM DOS ARRANQUES DOS PILARES E VIGAS DE FUNDAÇÃO



CONCRETAGEM DOS ARRANQUES DOS PILARES E VIGAS DE FUNDAÇÃO



Fabiano Cordeiro da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CONCRETAGEM DOS ARRANQUES DOS PILARES E VIGAS DE FUNDAÇÃO



DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO



Fabiano F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA

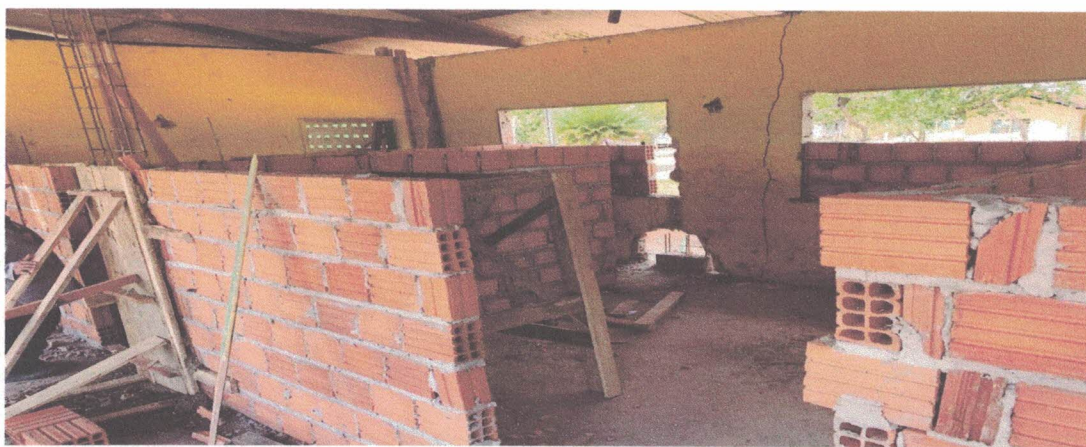

SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiana Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiana Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiano Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA

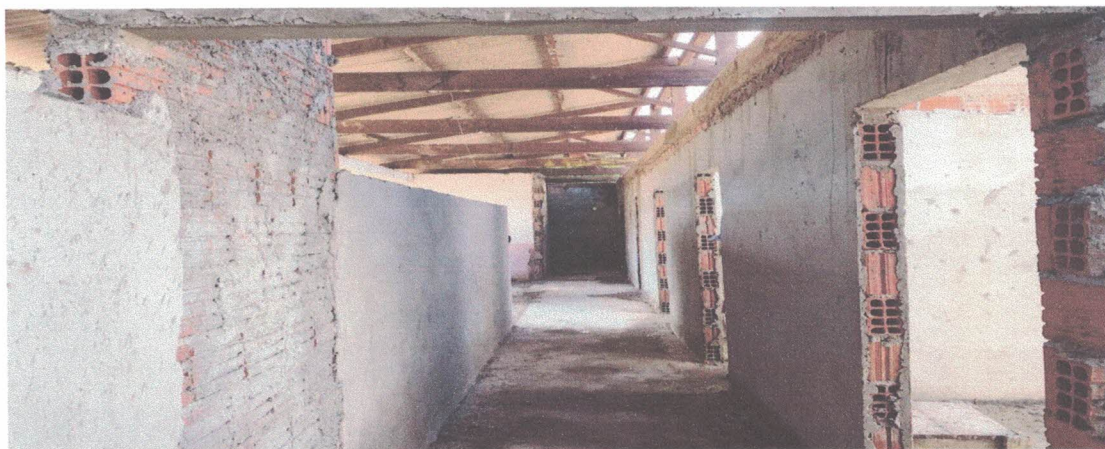

SERVIÇOS DE ALVENARIA

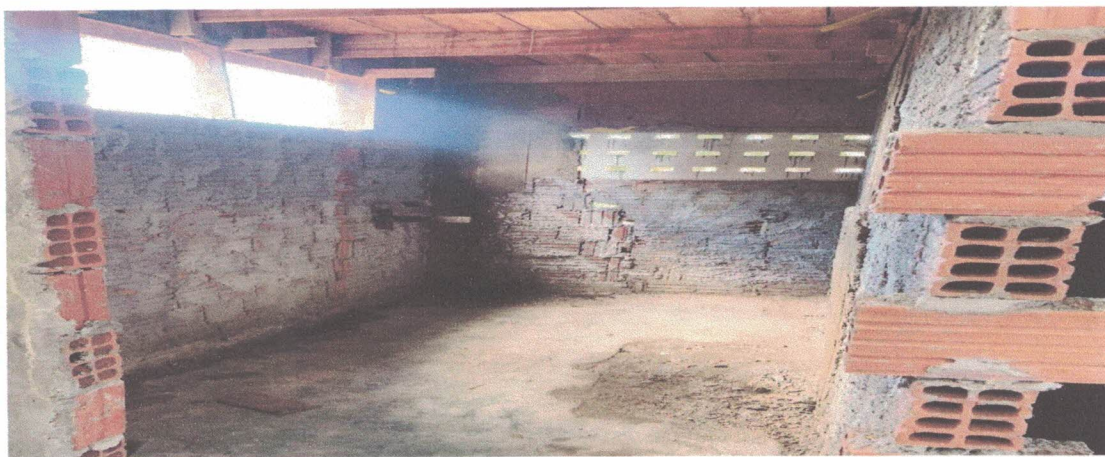

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



SERVIÇOS DE ALVENARIA



Fabiano F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE ALVENARIA



REMOÇÃO PARCIAL DA COBERTURA PARA CONFECÇÃO DA LAJE

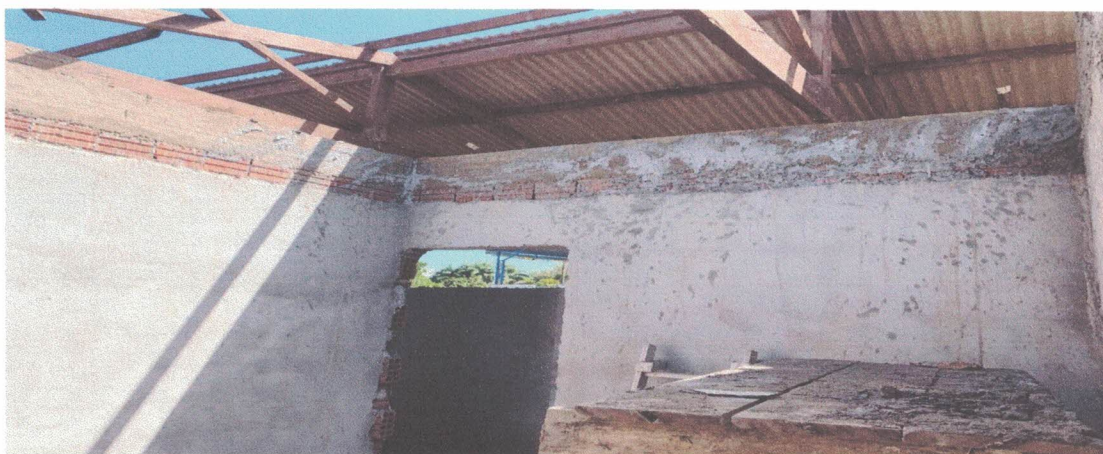

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO



VISTA FRONTAL DA OBRA



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

VISTA FRONTAL DA OBRA



VISTA FRONTAL DA OBRA



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

VISTA FRONTAL DA OBRA



VISTA FRONTAL DA OBRA



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

COBERTURA PARCIALMENTE RETIRADA PARA CONCRETAGEM DA LAJE



COBERTURA PARCIALMENTE RETIRADA PARA CONCRETAGEM DA LAJE



Fabiano F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

COBERTURA PARCIALMENTE RETIRADA PARA CONCRETAGEM DA LAJE



SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



Fabiano Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO

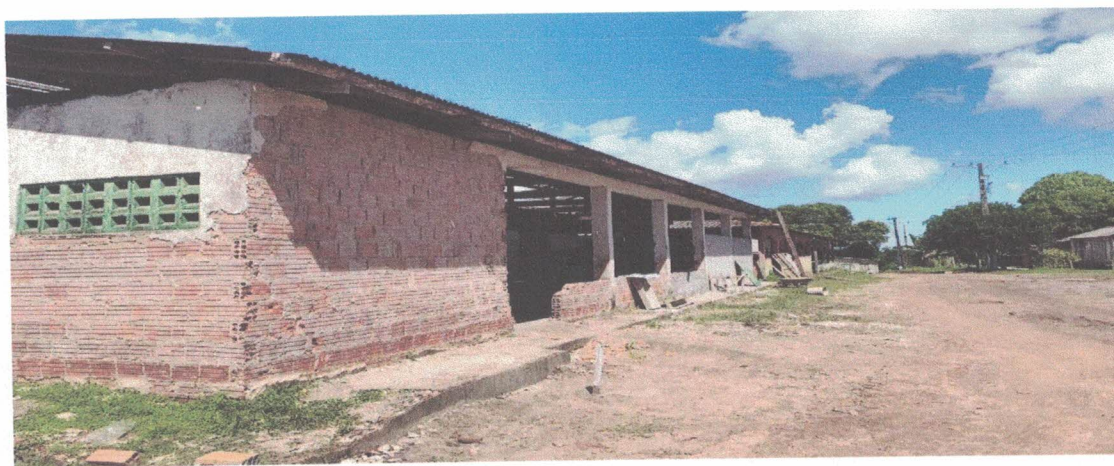

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO

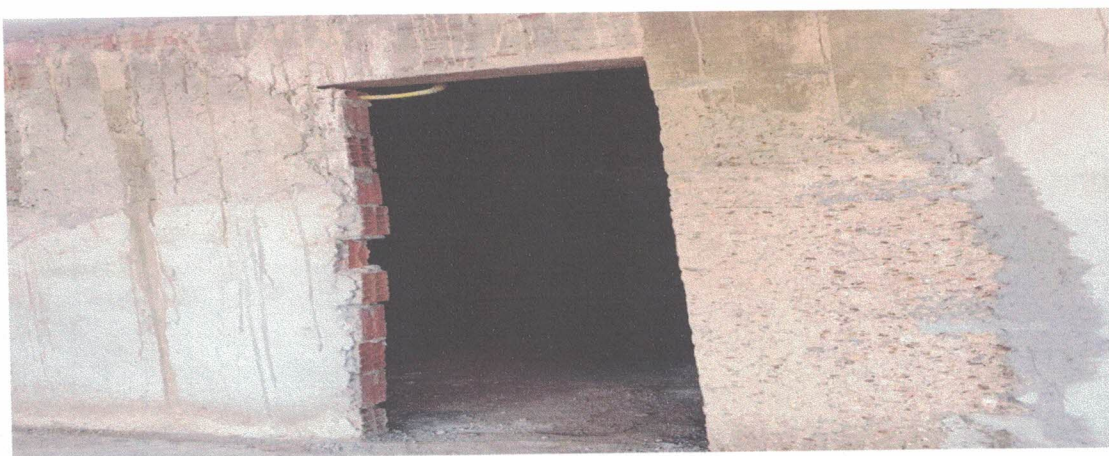

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO

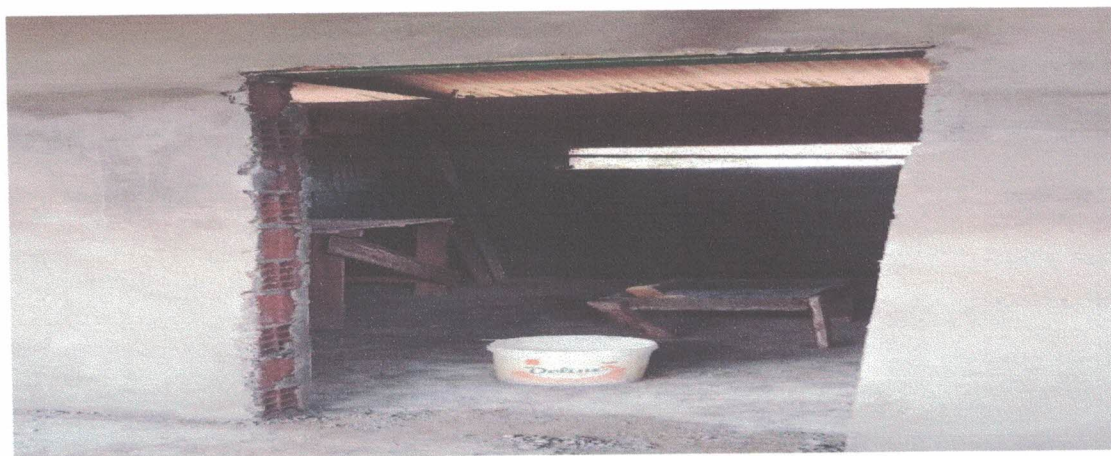

SERVIÇOS DE CHAPISCO E REBOCO



Rubiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

REMOÇÃO DE PORTAS E JANELAS



COBERTURA PARCIALMENTE RETIRADA PARA CONCRETAGEM DA LAJE



Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DA FOSSA E SUMIDOURO



ESCAVAÇÃO DA FOSSA E SUMIDOURO



Fabiano Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 19/05/2022 - 19/06/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CONFEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO



CONFEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO



Fabiana Engenheira da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	19/05/2022	1
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		1	Prazo Restante:		59
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	ASSINATURA DO CONTRATO				
	ASSINATURA D A ORDEM DE SERVIÇO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	


 Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21542 D/AM

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/05/2022	2	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		2	Prazo Restante:	58		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		60				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Assistente Engenharia		1
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
	Servente		7	Vigia		1
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS					
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:						
Visto Engº Contratada:						
Visto Fiscalização:				Data		

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	21/05/2022	3
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		3	Prazo Restante:	57	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/05/2022	4
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		4	Prazo Restante:	56	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro		1	Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro	
	Carpinteiro		1	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador		1	Vidraceiro	
	Servente		7	Vigia	
				1	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DA UBS				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:					
Data					

Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/05/2022	5
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		5	Prazo Restante:	55	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DA UBS				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA 041295093-6		
		24/05/2022		6		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		6		Prazo Restante:		
		54				
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		60				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro		1		Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Bombeiro	
	Carpinteiro		1		Eletricista	
	Pedreiro				Pintor	
	Armador		1		Vidraceiro	
	Servente		7		Vigia	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DA UBS					
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:						
Visto Engº Contratada:						
Visto Fiscalização:				Data		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642-DIAM						

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	25/05/2022	7
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		7	Prazo Restante:	53	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	


 Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21642 D/AM

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/05/2022	8
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		8	Prazo Restante:	52	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS				
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642-D/AM

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		27/05/2022		
CREA		041295093-6		9		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		9		Prazo Restante:		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00		51		
Prazo da Obra		60				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro		1		Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Bombeiro	
	Carpinteiro		1		Eletricista	
	Pedreiro				Pintor	
	Armador		1		Vidraceiro	
	Servente		7		Vigia	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS					
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:						
Visto Engº Contratada:						
Visto Fiscalização:				Data		

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA 041295093-6		
		28/05/2022		10		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		10		Prazo Restante:		
		50				
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		60				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro		1		Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1		Bombeiro	
	Carpinteiro		1		Eletricista	
	Pedreiro				Pintor	
	Armador		1		Vidraceiro	
	Servente		7		Vigia	
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE FORMA E ARMADURA PRA INFRA ESUTRUTURA E SUPRAESTRUTURA DA ESTRUTURA DA CAIX D'AGUA DA UBS					
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:						
Visto Engº Contratada:						
Visto Fiscalização:				Data		

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	29/05/2022	11
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		11	Prazo Restante:	49	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E ARRANQUE DOS PILARES DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.				
	INICIO DA ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data  Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM	

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	30/05/2022	12
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		12	Prazo Restante:		48
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E ARRANQUE DOS PILARES DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.				
	SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	31/05/2022 13
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		13	Prazo Restante:		47
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	1	Assistente Engenharia	1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro		
	Carpinteiro	1	Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador	1	Vidraceiro		
	Servente	7	Vigia	1	
Serviços Executados	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME E ARRANQUE DOS PILARES DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.				
	SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:				Data	

Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21642 D/AM

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	01/06/2022	14	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		14	Prazo Restante:	46		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		60				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		1	Assistente Engenharia		1
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro		
	Carpinteiro		1	Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador		1	Vidraceiro		
	Servente		7	Vigia		1
Serviços Executados	CONCRETAGEM DOS PILARES DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.					
	SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:						
Visto Engº Contratada:						
Visto Fiscalização:				Data		

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

02/06/2022

15

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

15

Prazo Restante:

45

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

CONCRETAGEM DOS PILARES DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

03/06/2022

16

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

16

Prazo Restante:

44

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Se. ções Executadas

CONCRETAGEM DAS VIGAS AEREAS DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

04/06/2022

17

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

17

Prazo Restante:

43

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDADA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Carpinteiro

1

Pedreiro

Armador

1

Servente

7

Descrição

Assistente Engenharia

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Vidraceiro

Vigia

Quant.

1

1

Serviços Executados

CONCRETAGEM DAS VIGAS AEREAS DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

05/06/2022

18

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

18

Prazo Restante:

42

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

CONCRETAGEM DAS VIGAS AEREAS DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

06/06/2022

19

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

19

Prazo Restante:

41

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

CONCRETAGEM DA LAJE DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

07/06/2022

20

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

20

Prazo Restante:

40

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

CONCRETAGEM DA LAJE DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA.

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	08/06/2022	21
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		21	Prazo Restante:	39	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		60			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro		1	Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro	
	Carpinteiro		1	Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador		1	Vidraceiro	
	Servente		7	Vigia	
				1	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO				
	SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:					
Visto Engº Contratada:					
Visto Fiscalização:					
Data					


 Fabiano Fonseca da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

09/06/2022

22

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

22

Prazo Restante:

38

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

MAQUINA SOLDA - 02

BANCADA SERRA - 01

GERADOR 6.5 KVA - 01

SERRA MARMORE -01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

FURADEIRA - 01

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

10/06/2022

23

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

23

Prazo Restante:

37

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Carpinteiro

1

Pedreiro

Armador

1

Servente

7

Descrição

Quant.

Assistente Engenharia

1

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Vidraceiro

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

11/06/2022

24

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

24

Prazo Restante:

36

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Carpinteiro

1

Pedreiro

Armador

1

Servente

7

Descrição

Quant.

Assistente Engenharia

1

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Vidraceiro

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

12/06/2022

25

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

25

Prazo Restante:

35

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/A

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

13/06/2022

26

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

26

Prazo Restante:

34

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

14/06/2022

27

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

27

Prazo Restante:

33

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro CIVIL
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

15/06/2022

28

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

28

Prazo Restante:

32

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

16/06/2022

29

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

29

Prazo Restante:

31

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

17/06/2022

30

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

30

Prazo Restante:

30

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Carpinteiro

1

Pedreiro

Armador

1

Servente

7

Descrição

Quant.

Assistente Engenharia

1

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Vidraceiro

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21042 D/AM



T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

18/06/2022

31

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

31

Prazo Restante:

29

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFEÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

19/06/2022

32

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

32

Prazo Restante:

28

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

60

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

1

Assistente Engenharia

1

Mestre de Obras/ Encarregado

1

Bombeiro

Carpinteiro

1

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Armador

1

Vidraceiro

Servente

7

Vigia

1

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ALVENARIA CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO NA ALVENARIA EXECUTADA

CONFECÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO ATRAS DA UBS

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Visto Engº Contratada:

Visto Fiscalização:

Data

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.351.686/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:46 do dia 03/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2022.

Código de controle da certidão: **DAB3.A758.9122.53C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51636738

Data: 08/06/2022

Hora: 11:57:31

Válida até: 08/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

102956/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 120, CEP: 69063550**
BAIRRO : **PETRÓPOLIS** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **46672401**
CNPJ/CPF : **37351686000175**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

10/05/2022

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº102956/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **AAA.B2E.B45.01B**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 10/05/2022

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.351.686/0001-75

Razão Social: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER 0120 / PETROPOLIS / MANAUS / AM
/ 69063-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/06/2022 a 09/07/2022

Certificação Número: 2022061001435443086722

Informação obtida em 18/06/2022 11:37:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.351.686/0001-75

Certidão nº: 18297100/2022

Expedição: 08/06/2022, às 12:48:10

Validade: 05/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.351.686/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006130933

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 07/06/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

TF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, residente na RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº 120, PETROPOLIS, CEP: 69063-550, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 8 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

0006130933





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CARTA CONTRATO 008/2022-SEMOSP

CARTA CONTRATO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, PARA A "AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM", NA FORMA ABAIXO.

Saibam todos quanto o presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (19/05/2022)**, nesta cidade na sede da Prefeitura - situada na Praça Eduardo Ribeiro, 2042, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 - Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins - Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 - SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53, e de outro a empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, os quais tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo nº 008/2022-CML, Carta Convite Nº 008/2022-CML**, firmam, a presente **CARTA CONTRATO**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendida as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto desta **CARTA CONTRATO** tem por Objetivo a "**AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM**", com o prazo de execução de **60 (sessenta)** dias contados a partir da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência contratual será de **90 (noventa)** dias, contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Rua Jonathas Pedrosa - Centro - CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. - 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

3.1 - O valor global da presente CARTA CONTRATO é R\$ 328.491,26 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavo), a ser empenhado no exercício vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - O regime de execução será efetuado obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis após apresentação da respectiva Nota Fiscal, em duas vias, devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas acautelatórias necessárias para evitar danos a terceiros, em razão da execução dos serviços ajustados, sendo sua exclusiva responsabilidade eventuais danos por atos comissivos ou omissos.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - A despesa decorrente desta CARTA CONTRATO correrá à conta da seguinte dotação do orçamento do CONTRATANTE:

- **Unidade Orçamentária:** 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- **Programa de Trabalho:** 10.302.0052.1025.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município;
- **Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
- **Fonte de Recurso:** 010 – Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 com as consequências, conforme o caso, elencadas nos arts. 86 e 87, tudo da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA e seu representante legal apresentarem neste ato os documentos comprobatórios das condições jurídicos – pessoais relativos à empresa

Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP. 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. – 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

contratada e a seu representante, indispensáveis à lavratura deste Termo, inclusive quitações de impostos municipais e Certificados de Regularidade da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO DO TERMO

10.1 - A **CONTRATANTE** obriga-se a promover, às suas expensas a publicação, da presente **CARTA CONTRATO**, no prazo de lei, no quadro de Aviso Legal da Prefeitura Municipal.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FÔRO

11.1 - Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas de execução do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Parintins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por estarem acordados, firmam a presente **CARTA CONTRATO** em 2 (duas) vias de igual teor e valor probante, as quais vão assinadas pelas partes contratadas.

Parintins (AM), 19 de maio de 2022.


FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
 Prefeito Municipal de Parintins
CONTRATANTE


T.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº 37.351.686/0001-75
CONTRATADA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220321798

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABIANO FONSECA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0412950936

Registro: 0412950936AM

Empresa contratada: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Registro: 0049489712-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: PARINTINS

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nº: 2052

CEP: 69151271

Contrato: 008/2022

Celebrado em: 19/05/2022

Valor: R\$ 328.491,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA DA VALÉRIA

Complemento:

Cidade: PARINTINS

Data de Início: 19/05/2022

Previsão de término: 18/07/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Bairro: ZONA RURAL

UF: AM

Nº: SN

CEP: 69151271

Coordenadas Geográficas: -2.629841, 56.722253

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 -
REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

Unidade

136,88

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 012.273.862-56

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - CNPJ: 04.329.736/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Conduas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 17/06/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304790869

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: BZ152
Impresso em: 18/06/2022 às 10:06:36 por: , ip: 131.255.10.227

www.crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br

Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas

