



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 19 de outubro de 2022.

Memorando N° 533/2022 – SEMOSP/PMP

CÓPIA

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

Senhor Prefeito,


AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da CARTA CONVITE N° 008/2022-CML e TERMO CONTRATO N° 008-2022-SEMOSP,, contendo os anexos listados abaixo da Empresa T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.351.686/0001-75, referente à 2ª (segunda) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM, para pagamento.


Anexos:

- ✓ CI N° 216/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços N° 10 no valor de R\$ 96.663,64 (noventa e seis mil seiscientos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) Medição dos Serviços Executados
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico.
- ✓ Diário de Obras.

Fonte pagadora: 010 – Recursos Próprios

Atenciosamente,


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEBIDO
27/10/22
Ass.: 

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 19 de outubro de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 216/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		OUTUBRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML - CARTA CONTRATO Nº 008/2022-SEMOSP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL/BOLETO DE RRT/ART		Nº	10
CREDOR:	T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
CNPJ/ CPF	37.351.686/0001-75		PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Cel. Conrado Niemeyer, 120 - Manaus-AM			FONE:	
OBJETO:	Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Unid.	Ref. a 2ª (segunda) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.		R\$96.663,64	96.663,64
FICHA Nº		RECURSO:	DADOS BANCÁRIOS:		SOMA: R\$ 96.663,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PARINTINS-AM

At.: Engº. Denner Cardoso Brelaz

Engenheiro Fiscal do Contrato.

Ref.: Medição 2 do Contrato 008/2022

A empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob **CNPJ 37.351.686/0001-75**, aqui representada por seu Sócio Administrador **SR. FABIANO FONSECA DA SILVA**, inscrito sob **CPF 012.275.862-56**, vem através deste solicitar **ANALISE** do processo da **SEGUNDA MEDIÇÃO**, no valor de **R\$96.663,64**, referente a **ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM.**

Aguardando retorno sobre os assuntos tratados,

Parintins – AM, 19 de Outubro de 2022

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ 37.351.686/0001-75
FABIANO FONSECA DA SILVA
CPF 012.275.862-56

37.351.686/0001-75
T F COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Coronel Conrado Wemeyer n 120 Pólispolis
CEP: 69.063-550

MANAUS

AM

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO CORA - 403

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 1602544-9



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de verificação.

Código de verificação

522A.93C2.4F2B

Data/Hora da emissão

19/10/2022 - 12:59:33

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

10**Prestador de Serviços**

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, 120,
PETRÓPOLIS, Telefone: .
CEP 69063550 - MANAUS - - BRASIL
CPF/CNPJ 37.351.686/0001-75
Email JSANTOSNAVEGACAO@GMAIL.COM

Inscrição Municipal **46672401**
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CPF/CNPJ **11.429.713/0001-91**
Endereço **PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,**
Bairro **CENTRO, Telefone: .**
Cep **69151-271**
Cidade **PARINTINS - AM - BRASIL**
Email

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA REFERENTE A MEDIÇÃO 2 CUJO OBJETO É ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM DE ACORDO COM CONTRATO 008.2022 - BASE DE CÁLCULO INSS: R\$96.663,64 X 40% (MÃO DE OBRA) = R\$38.665,46 X 3,5% = R\$1.353,29 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
96.663,64	1,00	0,00	0,00	96.663,64	0,00	0,00	96.663,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.663,64**Retenções**

INSS (R\$)	PLS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	96.663,64

Outras Informações

- Competência: Outubro/2022- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materiais foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.

Em: 19/10/2022

Denner Cardoso Breiaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AM-132148





ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%; Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.663,84
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
1.1	100319	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	16.590,89	20.658,97	20.658,97	0,50	10329,48	0,25	5164,74	0,25	5164,74	75,00%	25,00%
1.2	94296	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.600,06	10.771,07	21.542,14	1,00	10771,07	0,50	5385,53	0,50	5385,53	75,00%	25,00%
2.1	CPJ-01	Proton	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	316,21	393,74	2.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2362,44	0,00%	100,00%
3.1	97922	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	28,87	50,47	62,94	1.814,19	28,87	1814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.2	97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	8	141,96	176,78	1.080,56	0,00	0,00	8,00	1080,56	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	145	3,31	4,12	597,40	0,00	0,00	145,00	597,40	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	5,88	8,12	10,11	59,44	5,88	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM




ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.560,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com EDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
3.5	97643 SINAPI		REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	28	30,86	38,45	1.076,60	28,00	1076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.1	96523 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORORAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	m³	8,64	87,48	106,93	941,15	8,64	941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.2	96527 SINAPI		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	m³	2,25	114,95	143,13	322,04	2,25	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.3	96533 SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	5,76	172,48	214,77	1.237,07	5,76	1237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.4	96533 SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	22,46	67,30	106,70	2.441,40	22,46	2441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.5	92791 SINAPI		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LANCES. AF 12/2015	KG	84,08	13,08	16,26	1.368,82	84,08	1368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM




ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horta: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
5.2	82620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLÍSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF_122015	UN	7	2.343,84	2.918,54	20.429,78	0,00	0,00	7,00	20.429,78	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.3	84213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_072019	m²	157,72	85,78	118,26	18.899,88	0,00	0,00	157,72	18.899,88	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_072019	M	9,86	57,20	71,22	709,35	0,00	0,00	9,86	709,35	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M	39,8	70,49	87,77	3.493,24	0,00	0,00	39,80	3.493,24	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.6	CPU REF. SINAPI COD 78320	Próprio	CLAMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m²	12,05	53,81	67,12	808,79	0,00	0,00	12,05	808,79	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%/Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.580,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO DE		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	142,32	64,25	104,00	14.629,36	142,32	14629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	284,64	4,68	5,62	1.656,80	284,64	1656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.3	87830	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	284,64	44,68	55,63	15.834,52	142,32	7917,26	142,32	7917,26	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.4	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021 P	m²	27,39	678,62	845,25	23.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	23151,67	0,00%	100,00%
									41.610,54				41.610,54			

Fabiana
Fabiana Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/07/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$98.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
9.3	94599	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	12,4	735,36	915,67	11.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	11354,30	0,00%	100,00%
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), AF. 01/2018	UN	24	213,26	265,56	6.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	6373,20	0,00%	100,00%
10.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBRERPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	11	39,33	46,57	536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	536,67	0,00%	100,00%
10.3	97612	SINAPI	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	22	25,55	31,61	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	699,82	0,00%	100,00%

Valeria
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$98.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		EXECUTADO (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	
11.3	91792	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	26	52,53	66,41	1.695,26	0,00	0,00	0,00%
									25,00	1636,26	100,00%
11.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDO, CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,70X1,40 M, VOLUME DE 1,500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	2.308,80	2.875,04	2.875,04	1,00	2875,04	100,00%
11.5	98062	SINAPI	SUMIDUJO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,09 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF. 12/2020	UN	1	2.776,53	3.459,82	3.459,82	1,00	3459,82	100,00%

Valerine
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM




**ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado; Hora: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.663,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com EDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.8	96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L) RETANGULAR EM ALUMINARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF. 12/2020	UN	1	418,15	520,88	520,88	0,00	0,00	1,00	520,88	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.7	96601	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	4	336,24	418,68	1.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1674,72	0,00%	100,00%
11.8	96039	SINAPI	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	5	317,09	394,84	1.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1974,20	0,00%	100,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,58%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$96.863,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.8	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FUMO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1	504,58	628,30	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	628,30	0,00%	100,00%
11.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	305,44	381,57	763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	763,14	0,00%	100,00%
11.11	95442	SINAPI	BANCADEA MARMORE BRANCO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	1.150,70	1.432,86	5.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5731,40	0,00%	100,00%
11.12	89708	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	7	13,54	16,88	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	118,02	0,00%	100,00%

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%; Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 02 (SEGUNDA)
VALOR DA MEDIÇÃO 2: R\$98.563,64
SALDO REMANESCENTE: R\$146.550,01

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02																	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)	
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL			
11.13	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUIBOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	750,97	972,33	1.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1944,66	0,00%	100,00%	
12.1	66465	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	422,72	2,05	2,55	1077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	1077,93	0,00%	100,00%	
12.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	422,72	22,40	27,89	11789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	11789,66	0,00%	100,00%	
12.3	66469	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	422,72	10,92	13,59	5744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	5744,76	0,00%	100,00%	
13.1	CPU 3.9.2	Proprio	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TRIBULAÇÃO	CHP	12	473,35	588,41	7072,92	12,00	7072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
13.2	CPU 115	Proprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, 400 CM X 500 CM, INCLUIDO INSTALADOR	UN	1	699,24	870,59	870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	870,59	0,00%	100,00%	
Total Geral =>								338.491,26	EXECUTADO =>	86.277,99	338.491,26	0,00	0,00	146.550,01	146.550,01	55,39%	44,61%
NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS																	

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os _____ materiais _____ foram entregues _____ de conformidade com prestados _____

a Nota de Empenho.

Em: 19/10/2022

DENNER CARDOSO BRELIAZ

ENGENHEIRO CIVIL

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51891317
Data: 14/10/2022
Hora: 14:43:30
Válida até: 13/11/2022


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

170943/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO : RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 120, CEP: 69063550
BAIRRO : PETRÓPOLIS COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 46672401
CNPJ/CPF : 37351686000175

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

02/08/2022

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 31/10/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº 170943/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **A88.19A.EB7.4BE**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 02/08/2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.351.686/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:17:26 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2022.

Código de controle da certidão: **FC68.196D.1F09.2A32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.351.686/0001-75

Razão Social: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER 0120 / PETROPOLIS / MANAUS / AM
/ 69063-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/10/2022 a 31/10/2022

Certificação Número: 2022100201310918336469

Informação obtida em 14/10/2022 13:45:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.351.686/0001-75

Certidão n°: 25754024/2022

Expedição: 11/08/2022, às 12:37:47

Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.351.686/0001-75, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006377944

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 13/10/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, residente na R CORONEL
CONRADO NIEMEYER, NUMERO 120, PETROPOLIS, CEP: 69063-550, Manaus - AM,
vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *******

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 14 de outubro de 2022.

PEDIDO Nº:

0006377944





**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

CARTA CONTRATO 008/2022-SEMOSP

CARTA CONTRATO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, PARA A "AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM", NA FORMA ABAIXO.

Saibam todos quanto o presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (19/05/2022)**, nesta cidade na sede da Prefeitura - situada na Praça Eduardo Ribeiro, 2042, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 – Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins – Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 – SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53, e de outro a empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, os quais tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 008/2022-CML, Carta Convite Nº 008/2022-CML, firmam, a presente **CARTA CONTRATO**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendida as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto desta **CARTA CONTRATO** tem por Objetivo a **"AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM"**, com o prazo de execução de **60 (sessenta) dias** contados a partir da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência contratual será de **90 (noventa) dias**, contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP: 69151-530
e-mail: lcitapin@hotmail.com - Parintins – AM
C.N.P.J. – 04.329.735/0005 – 69



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

3.1 - O valor global da presente CARTA CONTRATO é R\$ 328.491,26 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavo), a ser empenhado no exercício vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - O regime de execução será efetuado obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis após apresentação da respectiva Nota Fiscal, em duas vias, devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas acautelatórias necessárias para evitar danos a terceiros, em razão da execução dos serviços ajustados, sendo sua exclusiva responsabilidade eventuais danos por atos comissivos ou omissos.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - A despesa decorrente desta CARTA CONTRATO correrá à conta da seguinte dotação do orçamento do CONTRATANTE:

- Unidade Orçamentária: 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- Programa de Trabalho: 10.302.0052.1025.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município;
- Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
- Fonte de Recurso: 010 – Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 com as consequências, conforme o caso, elencadas nos arts. 86 e 87, tudo da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA e seu representante legal apresentarem neste ato os documentos comprobatórios das condições jurídicas – pessoais relativos à empresa

Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP: 69151-530
e-mail: licitacin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. – 04.329.736/0005 - 69



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

contratada e a seu representante, indispensáveis à lavratura deste Termo, inclusive quitações de impostos municipais e Certificados de Regularidade da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO DO TERMO


10.1 - A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas a publicação, da presente CARTA CONTRATO, no prazo de lei, no quadro de Aviso Legal da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FÓRO

11.1 - Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas de execução do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Parintins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por estarem acordados, firmam a presente CARTA CONTRATO em 2 (duas) vias de igual teor e valor probante, as quais vão assinadas pelas partes contratadas.

Parintins (AM), 19 de maio de 2022.


FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins
CONTRATANTE


**T.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ Nº 37.351.686/0001-75
CONTRATADA

folha



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220321798

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABIANO FONSECA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0412950936

Registro: 0412950936AM

Empresa contratada: **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Registro: 0049489712-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

Nº: **2052**

CEP: **69151271**

Contrato: **008/2022**

Celebrado em: **19/05/2022**

Valor: **R\$ 328.491,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA DA VALÉRIA

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Data de início: **19/05/2022**

Previsão de término: **18/07/2022**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **AM**

Nº: **SN**

CEP: **69151271**

Coordenadas Geográficas: **-2.629841, 66.722263**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

136,68

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 012.275.962-66

de _____ de _____
Local _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - CNPJ: 04.329.736/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condições Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **17/06/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8304790869**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: BZ152
Impresso em: 19/06/2022 às 10:08:36 por: ip: 131.256.10.227

www.crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br

Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO

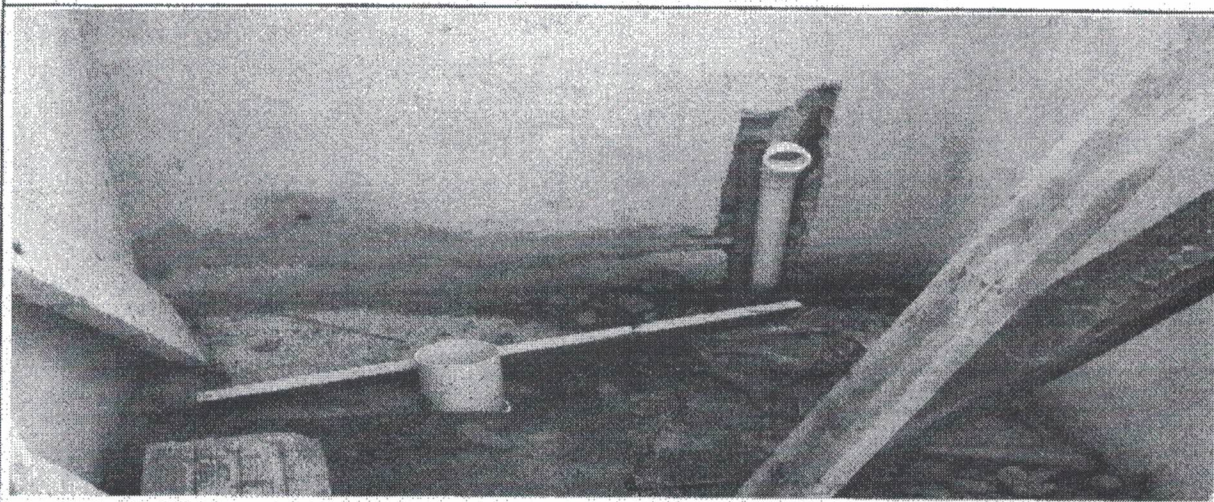

CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

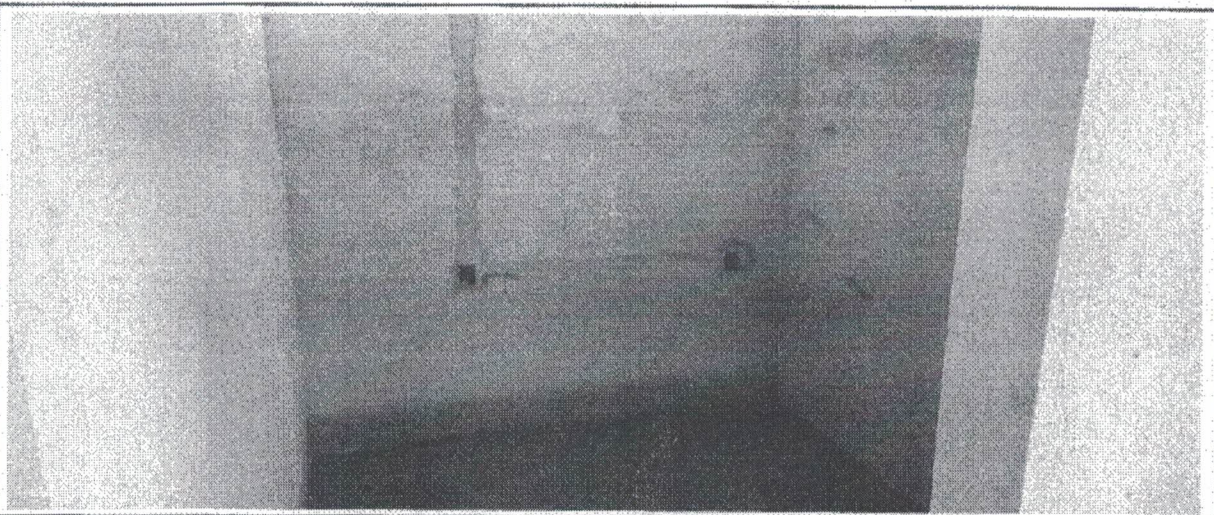

Adriano
Fátima Fátima da Silva
Engenheira Civil
CREA 21142 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO

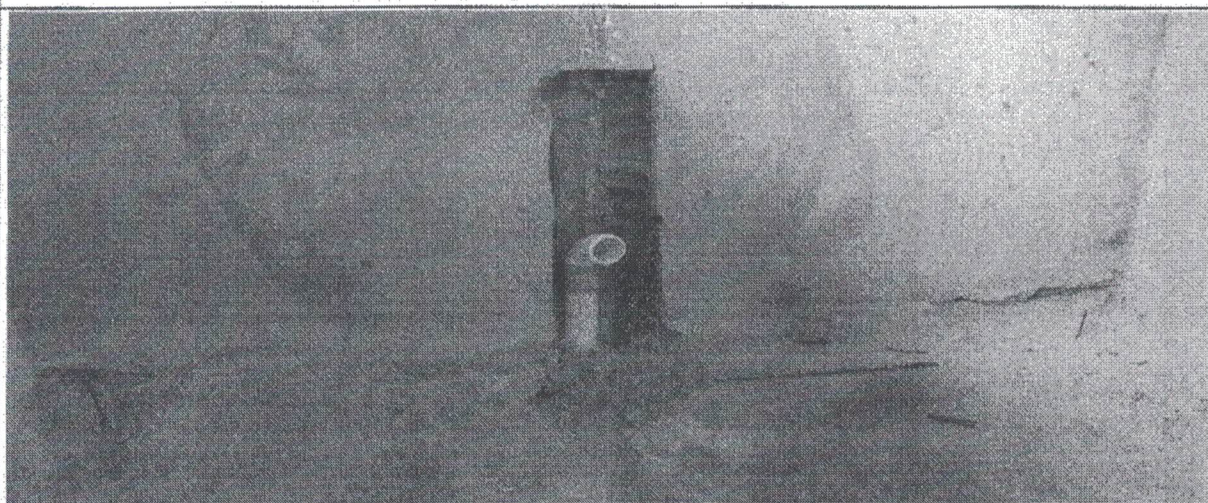

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO



Adriano
Fátima Fátima da Silva
Engenheira Civil
CREA 21642 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO



CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

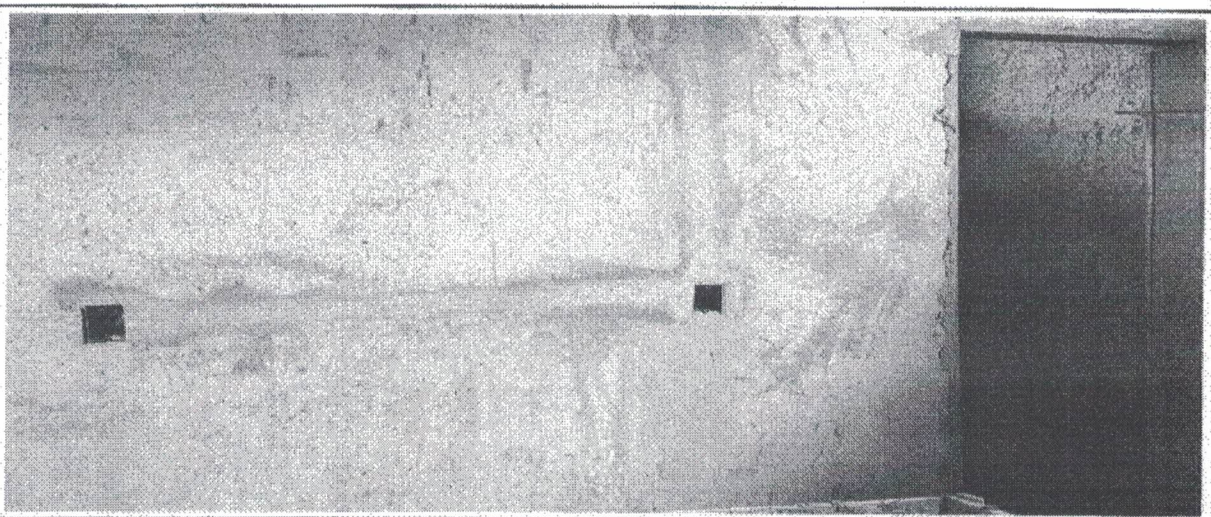

Adriano
Foliano Farias da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 DMS



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO

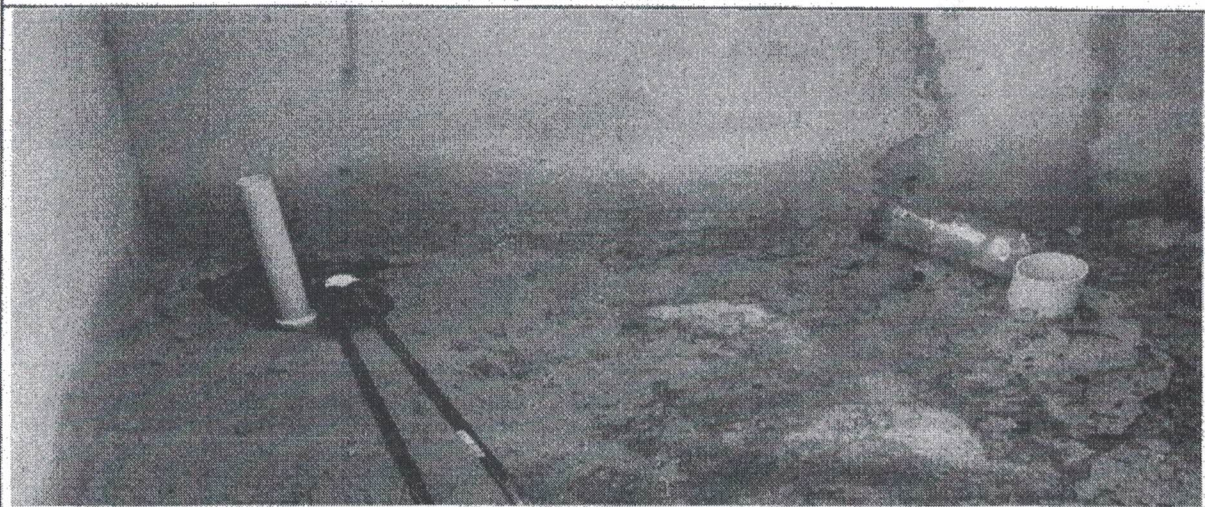

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO



Adriano
Fábio de Fátima de Souza
Engenheiro Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

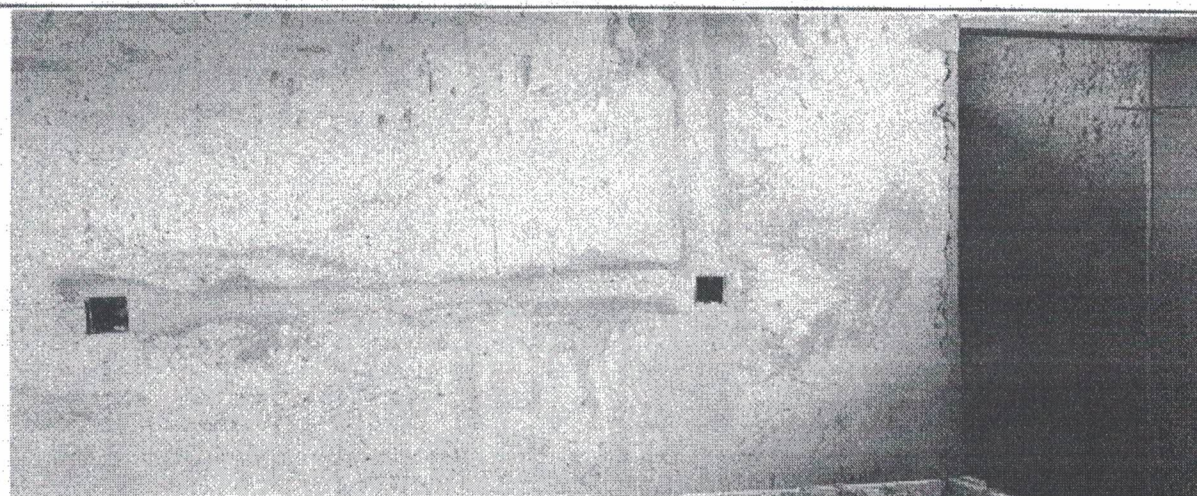

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO



Felipe
Felipe F. de S. Silva
Engenheiro Civil
CREA 21542 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

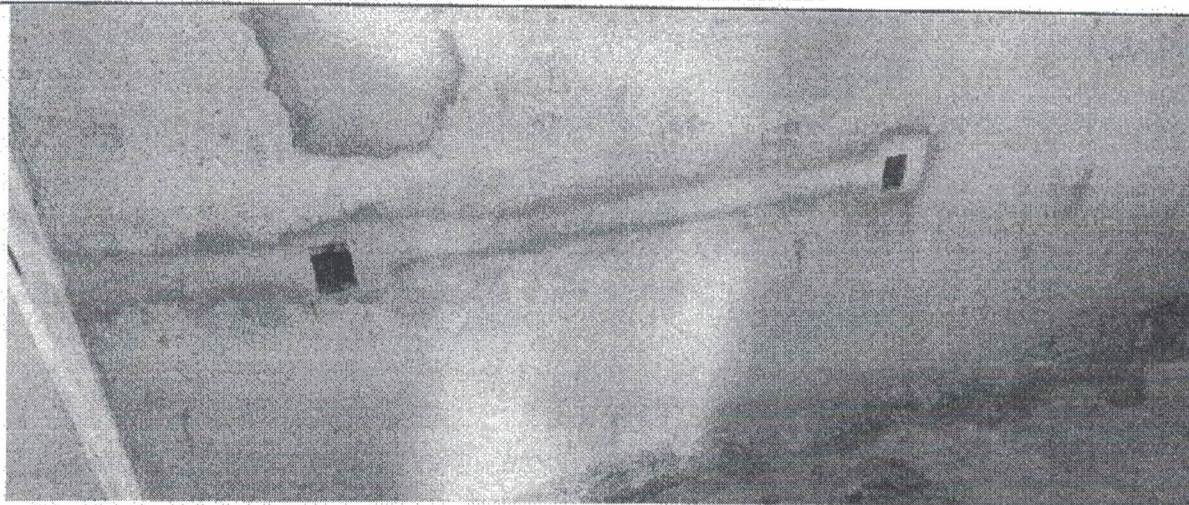

INSTALAÇÃO DA REDE HIDRO - SANITÁRIO



Adriano
Fotógrafo Profissional em 3D
Engenheiro Civil
CREA 21642 DALL



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

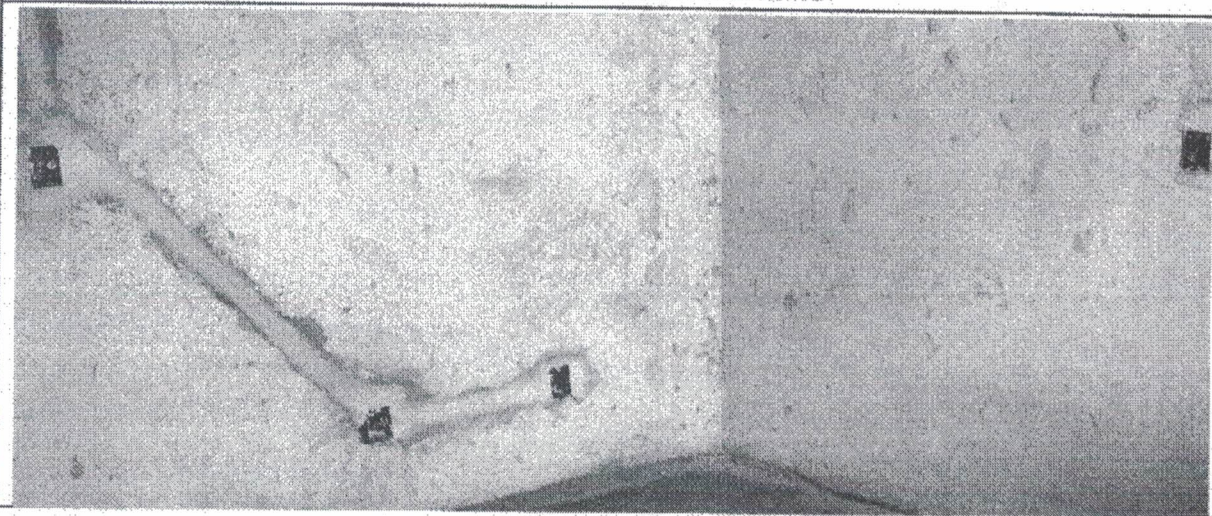

CHUMBAMENTO DAS CAIXAS 4X2 DA REDE ELÉTRICA

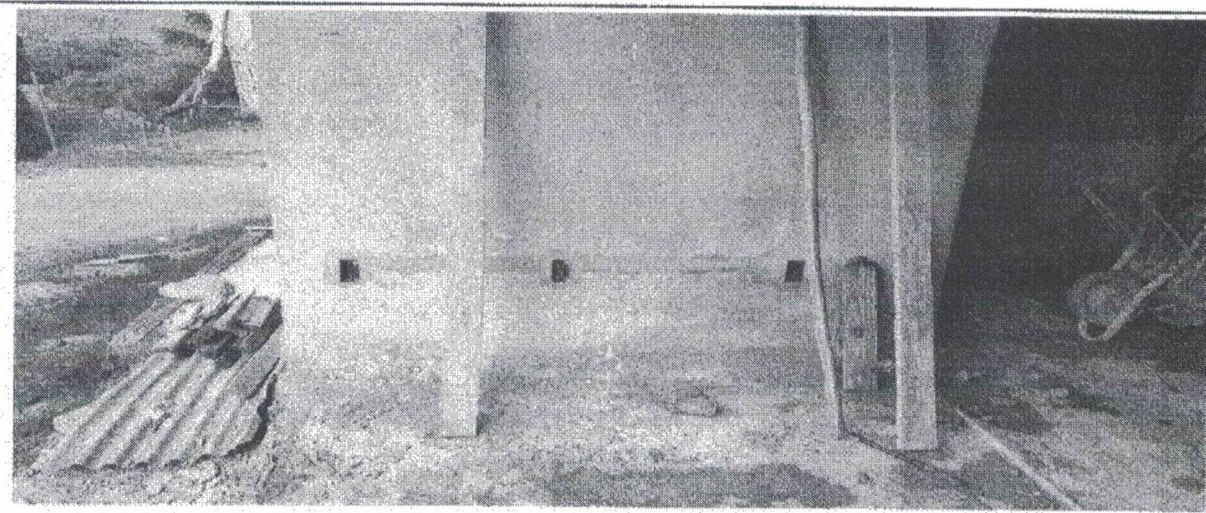

Paulina Pereira da Silva
Engenheira Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DO PISO KORODUR

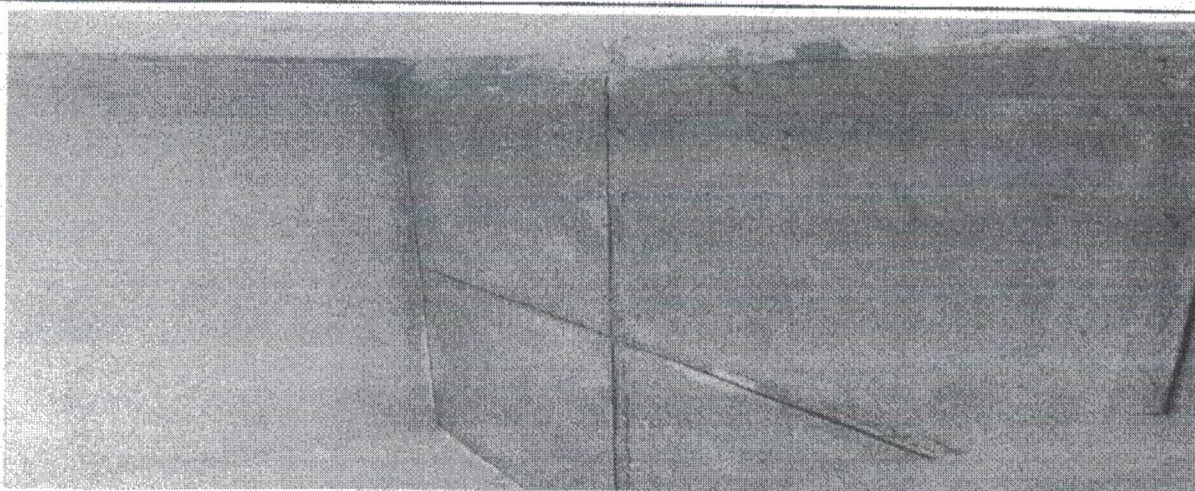

INSTALAÇÃO DO PISO KORODUR

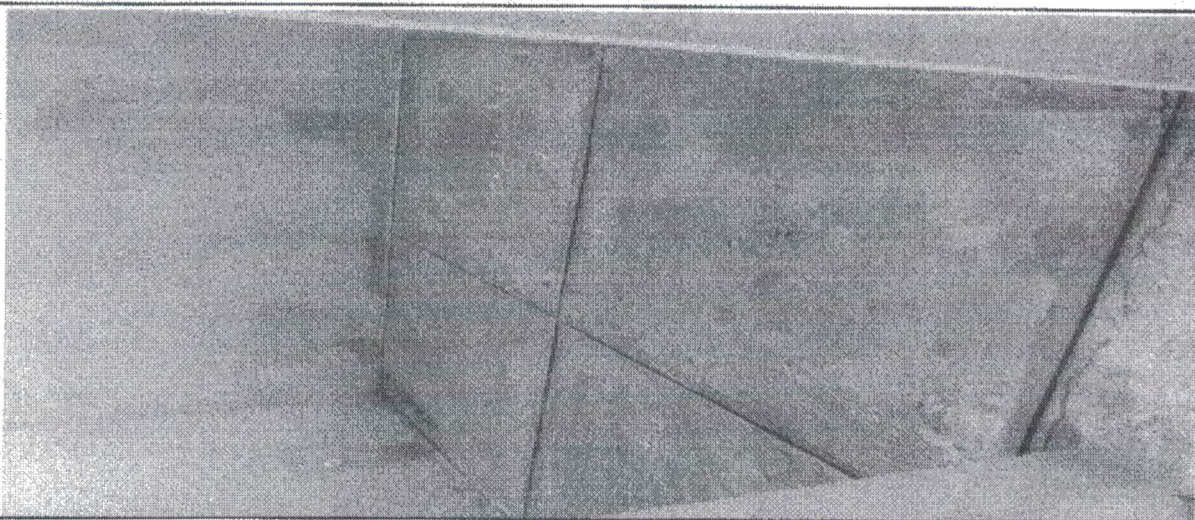

Adriano
Fábio de Fátima de Sá
Engenheiro Civil
CRS 21842 DUA



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DO PISO KORODUR



INSTALAÇÃO DO PISO KORODUR



Adriano
Fábio P. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DO PISO KORODUR

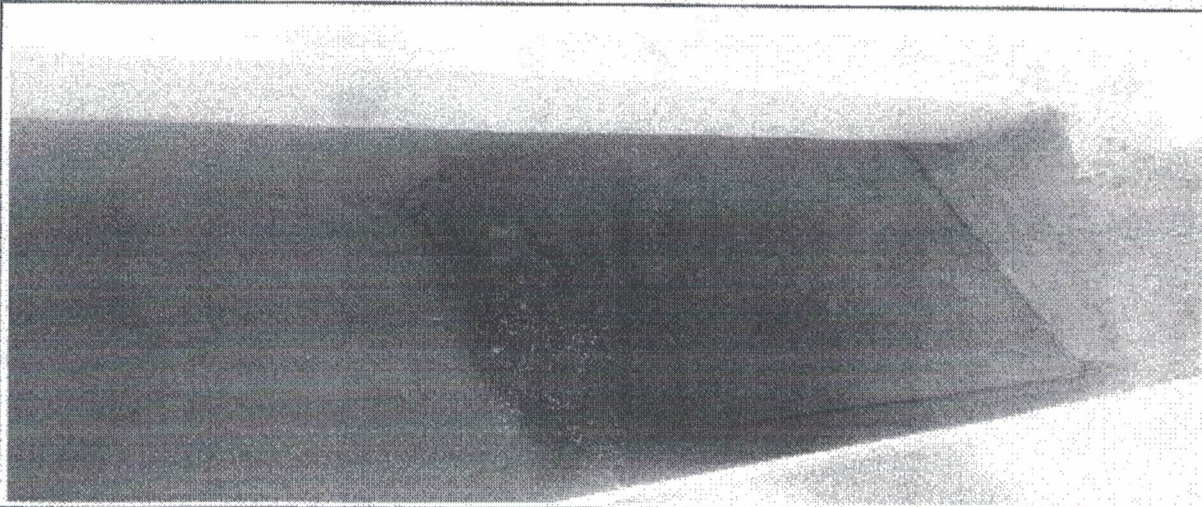

COBERTURA DA UBS



Adriano
Poliana F. de S. Silva
Engenheira Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

COBERTURA DA UBS



COBERTURA DA UBS

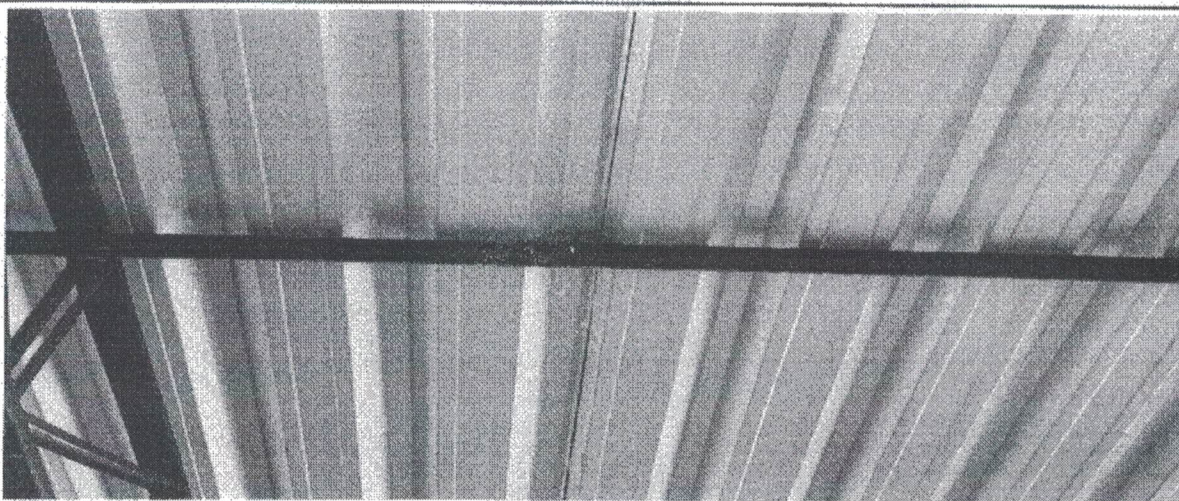

Adriano
Fotógrafo Profissional em 2014
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/06/2022 - 19/10/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

COBERTURA DA UBS

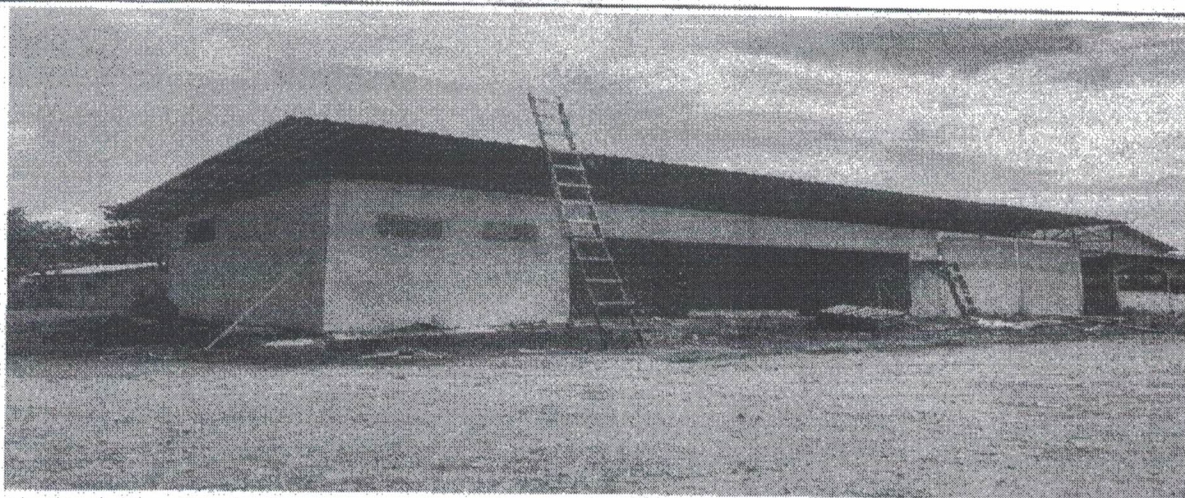

COBERTURA DA UBS

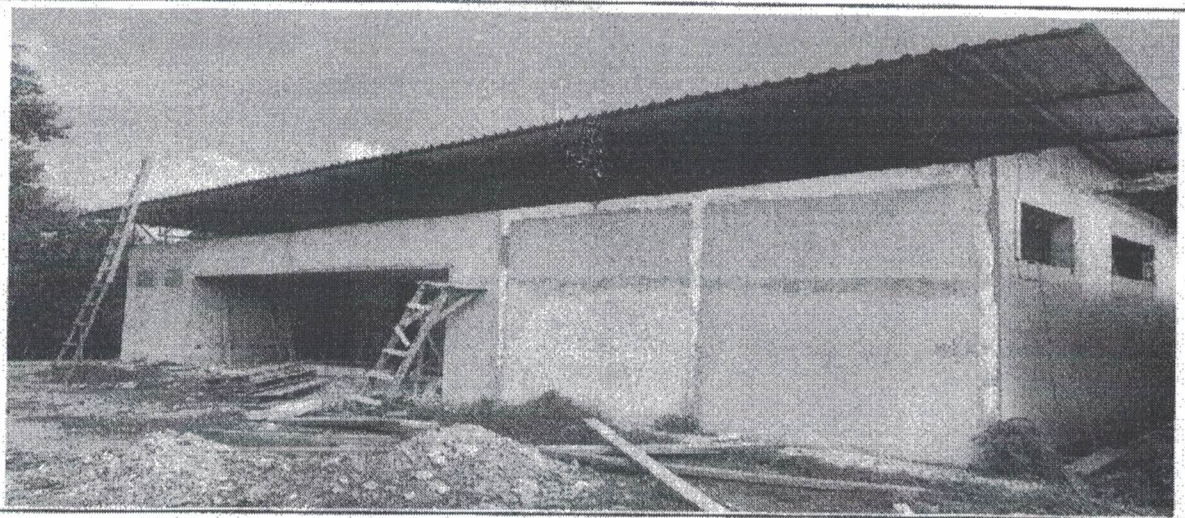

Handwritten signature
Fábio Roberto da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 DALL
