



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 08 de fevereiro de 2023.

Memorando Nº 096/2024 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

COPIA

Senhor Prefeito,

AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 e TERMO DE CONTRATO Nº 034/2023, contendo os anexos listados abaixo da Empresa ANTONIO J. S. MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 40.813.987/0001-88, referente à 2ª (segunda) Medição dos Serviços de Conclusão da casa da Cultura, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 030/2024-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 084 no valor de R\$ 307.224,46 (trezentos e sete mil duzentos e vinte quatro reais e quarenta e seis centavos);
- ✓ Planilha da 2ª (segunda) Medição dos Serviços Executados
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões negativas de débitos;

Fonte pagadora: 0290 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Atenciosamente,

SEFIN
RECEBIDO
Data: 16/02/24
Hora: [assinatura]

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-AM, 08 de fevereiro de 2024

COPIA

C. I. Nº 030/2024-SEMOSP/PMP

ANO: 2024		MÊS DE REFERÊNCIA:		FEVEREIRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO Nº034/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº004/2023-PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 84	
CREADOR:		ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
CNPJ/ CPF		40.813.987/0001-88		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Rua: Rio Jutai, 34, Quadra 36, Conj. Vieiralves N. S. das Graças		FONE:	
OBJETO:		SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	Ref. 2ª (segunda) Medição dos Serviços de Conclusão da Casa da Cultura, no Município de Parintins - AM.		307.224,46	307.224,46
FICHA Nº		RECURSO:		SOMA:	R\$ 307.224,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.10.01	SECRETARIA MUNIUCIPAL DE OBREAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15.451.0091.1009.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
290	OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMAD4 DE PREÇOS Nº001/2023-PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ 40.813.987/0001-88
Rua Rio Jutai, nº 34 Quadra 35 - Conjunto Vialves
Bairro Nossa Senhora das Graças
Telefones: 55 92 3133-3100
E-mail: jrmengenhariaeireli@gmail.com
CEP 69053-020 - Manaus/AM - Brasil

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

Gerencia de Finanças

Ref.: Solicitação de Pagamento da NF 84

Medição do TC 034/2023

A ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, inscrita com o CNPJ nº. 40.813.987/0001-88 sediada a Rua Rio Jutai, 670, Conjunto Vialves – Nossa Senhora das Graças, neste ato representado pelo Sr. Antonio Juciney Silva Maciel- Sócio Administrador CPF nº. 850.978.292-04, vem através deste apresentar a Nota Fiscal de Nº 84 referente a 2ª Medição dos Serviços de Conclusão da Casa de Cultura do município de Parintins/AM. Conforme Termo Contrato nº 034/2023- originado da Tomada de preço Nº 004/2023–PMP, para devidas providências de pagamento.

Dados Bancários:

Banco Santander

Agencia 1403

Conta Corrente 13-0025508


Nestes termos pede deferimento.

Manaus, 08 de Fevereiro de 2024.

J R M ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 40.813.987/0001-88

Antonio Juciney Silva Maciel- Proprietário



ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 40.813.987/0001-88
Rua Rio Jutai, nº 34 Quadra 36 - Conjunto Vieira Alves
Bairro Nossa Senhora das Graças
Telefones: 55 92 3133-3100
E-mail: jmengenhariaeireli@gmail.com
CEP 69053-020 - Manaus/AM - Brasil

RECIBO

R\$307.224,46

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS- AM**, a importância bruta de R\$ 307.224,46 (Trezentos e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e seis Centavos), referente à 2ª medição dos Serviços de Conclusão da Casa de cultura do município de Parintins-Am. Conforme Termo Contrato nº 034/2023, originado da Tomada de Preço N° 004/2023 – PMP, Nota Fiscal de N° 84, Conforme medição anexa, para devidas providências de pagamento. Pelo qual damos plena e total quitação da mesma.

Manaus, 08 de Fevereiro de 2024.


J R M ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ: 40.813.987/0001-88

Antonio Juciney Silva Maciel- Proprietário

CPF: 850.978.292-04

Renato Laet Tashiro CRC AM 015275/O



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

866B.6DA7.5EAD

Data/Hora da emissão

08/02/2024 - 14:11:07

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.manaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Natureza da operação

Recolhimento
Fora

Número da Nota

84

Prestador de Serviços**ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

, 670, LOTM JD AMAZONIA

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Telefone: .

CEP 69053020 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 40.813.987/0001-88

Email JUCINEYMACIEL@YAHOO.COM.BR

Inscrição Municipal

49281701

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

CPF/CNPJ

04.329.736/0001-69

Endereço

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

69151-970

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Email

licitapin@hotmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

2ª Medição dos Serviços de Engenharia para Conclusão da Casa de Cultura do município de Parintins-AM.
Processo Tomada de Preço Nº 004/2023 -PMP -Termo de CONTRATO 034/2023-PMP MÃO DE OBRA 40% R\$
122.889,79 MATERIAL 60% R\$184.334,67 OBS: INSS SOBRE OS 40%DE MÃO DE OBRA. DADOS
BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 AGÊNCIA: 1403 CONTA CORRENTE:13002550-8

Serviço:

70.21-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS
SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO,
DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS,
QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

307.224,46

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

184.334,67

Base de Cálculo(R\$)

122.889,79

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

307.224,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 307.224,46**Retenções**

INSS(R\$)

13.517,87

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.(R\$)

0,00

RRR(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

13.517,87

Valor Líquido da Nota(R\$)

293.706,59

Outras Informações

- Competência: Fevereiro/2024- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM-
Essa Nfse substitui a Nfse Numero: 82- Não gera ISS no Município de origem. ISS
devido no local da prest. do serviço

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materiais foram
entregues serviços
prestados de conformidade com
a Nota de Empenho.


Em: 08/02/24



Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA: CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS
LOCAL: RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM
EMPRESA: JRM ENGENHARIA EIRELI

PERÍODO DA MEDIÇÃO : 01.11.2023 A 30.11.2023

QUADRO RESUMO GERAL DA 2ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR INICIAL DO CONTRATO COM BDI 28,35%	ACUMULADO ANTERIOR BDI 28,35%	2ª MEDIÇÃO FINAL COM BDI 28,35%	ACUMULADO NO PERÍODO BDI 28,35%	SALDO CONTRATUAL BDI 28,35%
1.0	CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS	1.566.828,31	218.451,37	307.224,46	525.675,83	1.041.152,48
TOTAL GERAL:		1.566.828,31	218.451,37	307.224,46	525.675,83	1.041.152,48

Visto dos Engenheiros fiscais:

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os _____ materiais _____ foram entregues _____ de conformidade com a Nota de Empenho.
Em: 08/02/24

Antônio J. S. Maciel
Engenharia & Serviços
Administrativos Ltda
CNPJ: 40.813.987/0001-88

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UNID	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)		
1	ADMINISTRAÇÃO														
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	12		6.339,98	R\$	76.079,76	1,00	R\$	6.339,98	0,00	R\$	-	R\$	69.739,78
						R\$	76.079,76		R\$	6.339,98				R\$	69.739,78
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS														
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	13,5		478,22	R\$	6.428,97	13,50	R\$	6.428,97	0,00	R\$	-	R\$	-
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIOS, PI USO DOS OPERÁRIOS	UN	1		7.815,59	R\$	7.815,59	1,00	R\$	7.815,59	0,00	R\$	-	R\$	-
2.3	ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA BIFÁSICA DE 400, EM POSTE DE ACRÍQUARA DE 6,00M	UN	1		3.629,68	R\$	3.629,68	1,00	R\$	3.629,68	0,00	R\$	-	R\$	-
						R\$	17.874,24		R\$	17.874,24				R\$	-
3	DEMOIÇÕES, REMOÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM														
3.1	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M³	3,46		765,40	R\$	2.648,28	3,46	R\$	2.648,28	0,00	R\$	-	R\$	-
3.2	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M²	30,26		348,72	R\$	10.552,26	30,26	R\$	10.552,26	0,00	R\$	-	R\$	-
3.3	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M³	20,16		70,55	R\$	1.422,28	20,16	R\$	1.422,28	0,00	R\$	-	R\$	-
3.4	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	878,1		23,00	R\$	20.196,30	878,10	R\$	20.196,30	0,00	R\$	-	R\$	-
3.5	DEMOIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M²	314,35		4,09	R\$	1.285,69	314,35	R\$	1.285,69	0,00	R\$	-	R\$	-
3.6	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M²	135,4		29,23	R\$	3.957,74	135,40	R\$	3.957,74	0,00	R\$	-	R\$	-
3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M³	74,79		11,98	R\$	895,96	74,78	R\$	895,96	0,00	R\$	-	R\$	-
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF 07/2020)	M3XKM	373,95		3,78	R\$	1.413,53	373,95	R\$	1.413,53	0,00	R\$	-	R\$	-
						R\$	42.372,06		R\$	42.372,06				R\$	-
4	TRABALHO EM TERRA														
4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF 05/2018	M²	308,06		3,92	R\$	1.207,59	308,06	R\$	1.207,59	0,00	R\$	-	R\$	-
4.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF 08/2017	M²	0,51		160,63	R\$	82,02	0,51	R\$	82,02	0,00	R\$	-	R\$	-
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M²	2,59		7,90	R\$	20,46	2,59	R\$	20,46	0,00	R\$	-	R\$	-
						R\$	1.310,07		R\$	1.310,07				R\$	-
6	SUPERESTRUTURA														
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	M²	16,66		166,50	R\$	2.773,89	16,66	R\$	2.773,89	0,00	R\$	-	R\$	-

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

01.11.2023 A 30.11.2023



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA:		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (\$)	QUANT.	P. TOTAL (\$)		
5.2	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	23,11	18,53	R\$ 428,22	23,11	R\$ 428,22	0,00	R\$ -	23,11	R\$ 428,22	0,00	R\$ -		
5.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	44,42	21,98	R\$ 976,35	44,42	R\$ 976,35	0,00	R\$ -	44,42	R\$ 976,35	0,00	R\$ -		
5.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	28,08	26,31	R\$ 738,78	28,08	R\$ 738,78	0,00	R\$ -	28,08	R\$ 738,78	0,00	R\$ -		
5.5	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1,2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M³	2,41	1.423,29	R\$ 3.430,12	2,41	R\$ 3.430,12	0,00	R\$ -	2,41	R\$ 3.430,12	0,00	R\$ -		
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M²	2,41	274,23	R\$ 660,89	2,41	R\$ 660,89	0,00	R\$ -	2,41	R\$ 660,89	0,00	R\$ -		
6	PAREDES/PAINEIS				R\$ 9.008,25		R\$ 9.008,25		R\$ -		R\$ 9.008,25		R\$ -		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M²	58,8	114,85	R\$ 6.741,42	58,80	R\$ 6.741,42	0,00	R\$ -	58,80	R\$ 6.741,42	0,00	R\$ -		
7	REVESTIMENTO				R\$ 8.741,42		R\$ 8.741,42		R\$ -		R\$ 8.741,42		R\$ -		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M²	581,92	7,08	R\$ 4.125,81	581,92	R\$ 4.125,81	0,00	R\$ -	581,92	R\$ 4.125,81	0,00	R\$ -		
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M²	581,92	58,29	R\$ 33.920,11	581,92	R\$ 33.920,11	0,00	R\$ -	581,92	R\$ 33.920,11	0,00	R\$ -		
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M²	135,4	56,61	R\$ 7.664,99	135,40	R\$ 7.664,99	0,00	R\$ -	135,40	R\$ 7.664,99	0,00	R\$ -		
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	M²	206,97	119,51	R\$ 24.734,98		R\$ -	206,97	R\$ 24.734,98	206,97	R\$ 24.734,98	0,00	R\$ -		
8	ESTRUTURA DA COBERTURA				R\$ 70.445,99		R\$ 45.710,91		R\$ -		R\$ 70.445,99		R\$ -		



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T1)	UN	2	3.874,74	R\$ 7.949,48	2,00	R\$ 7.949,48	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 7.949,48	0,00	R\$ -		
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T2)	UN	4	4.739,40	R\$ 18.957,60	4,00	R\$ 18.957,60	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 18.957,60	0,00	R\$ -		
8.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T3)	UN	1	4.465,65	R\$ 4.465,65	1,00	R\$ 4.465,65	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4.465,65	0,00	R\$ -		
8.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T4)	UN	1	3.639,28	R\$ 3.639,28	1,00	R\$ 3.639,28	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.639,28	0,00	R\$ -		
8.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T5)	UN	3	4.755,23	R\$ 14.265,69	3,00	R\$ 14.265,69	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 14.265,69	0,00	R\$ -		
8.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T6)	UN	2	2.804,37	R\$ 5.608,74	2,00	R\$ 5.608,74	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 5.608,74	0,00	R\$ -		
8.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T7)	UN	10	3.420,80	R\$ 34.208,00	10,00	R\$ 34.208,00	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 34.208,00	0,00	R\$ -		
8.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA, COM BANZOS EM PERFIL "U" DE 75x38x3mm E MONTANTES EM PERFIL "U" DE 68x25 #12, PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL (TIPO T8)	UN	12	3.201,47	R\$ 38.417,64	-	R\$ -	12,00	R\$ 38.417,64	12,00	R\$ 38.417,64	0,00	R\$ -		
8.9	TERCEAMENTO PARA TELHADO DE 1 ÁGUA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	708,3	123,99	R\$ 87.822,11	-	R\$ -	708,30	R\$ 87.822,11	708,30	R\$ 87.822,11	0,00	R\$ -		
9	COBERTURA				R\$ 218.334,19		R\$ 89.094,44		R\$ 126.239,75		R\$ 218.334,19		R\$ -		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO GALVALUMINO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M²	1023,83	105,85	R\$ 108.372,40	-	R\$ -	1.023,83	R\$ 108.372,40	1.023,83	R\$ 108.372,40	0,00	R\$ -		
9.2	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	201,8	78,79	R\$ 15.466,22	-	R\$ -	201,80	R\$ 15.466,22	201,80	R\$ 15.466,22	0,00	R\$ -		
9.3	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P6	M²	891,82	109,03	R\$ 97.236,13	-	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	891,82	R\$ 97.236,13		
9.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF 05/2017_P6	M	450,75	48,77	R\$ 21.983,07	-	R\$ -	450,75	R\$ 21.983,07	450,75	R\$ 21.983,07	0,00	R\$ -		



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS




OBRA:	CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS									
LOCAL:	RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM									
EMPRESA:	JRM ENGENHARIA EIRELI									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS						2ª MEDIÇÃO		
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.
9.5	APERFEIÇOAMENTO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_08/2018	M²	69,65	149,29	R\$ 10.396,04	R\$	-	69,65	R\$ 10.396,04	69,65
					R\$ 263.494,88	R\$	-	R\$ 156.248,73	R\$ 156.248,73	R\$ 37.236,13
10	ENTRADA DE ENERGIA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
10.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	6	78,01	R\$ 468,06	R\$	-	R\$	-	6,00
10.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	2	97,03	R\$ 194,06	R\$	-	R\$	-	2,00
10.3	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	UN	8	63,85	R\$ 510,80	R\$	-	R\$	-	8,00
10.4	CABO MULTIPLEX 4 x 95mm ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50	83,44	R\$ 4.172,00	R\$	-	R\$	-	50,00
10.5	CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	458,36	R\$ 458,36	R\$	-	R\$	-	1,00
10.6	ATRAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	1	254,14	R\$ 254,14	R\$	-	R\$	-	1,00
10.7	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	15	14,78	R\$ 221,70	R\$	-	R\$	-	15,00
10.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	3	111,83	R\$ 335,49	R\$	-	R\$	-	3,00
10.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	1	88,42	R\$ 88,42	R\$	-	R\$	-	1,00
10.10	MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ, DIM. 6,00x2,15x0,25m, COMPLETA	UN	1	77.285,58	R\$ 77.285,58	R\$	-	R\$	-	1,00
10.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	1.172,04	R\$ 1.172,04	R\$	-	R\$	-	1,00
11	CIRCUITOS ALIMENTADORES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 85.140,65	R\$	-	R\$	-	R\$ 85.140,65
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300	37,23	R\$ 11.169,00	R\$	-	R\$	-	300,00
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	450	40,80	R\$ 18.360,00	R\$	-	R\$	-	450,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	200	56,15	R\$ 11.230,00	R\$	-	R\$	-	200,00



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:				01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM															
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS			ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL						
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)						
11.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	25	61,14	R\$ 2.028,50		R\$ -	R\$	0,00	R\$	25,00	R\$ 2.028,50					
11.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 65 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	100	144,79	R\$ 14.479,00		R\$ -	R\$	0,00	R\$	100,00	R\$ 14.479,00					
11.6	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA EM CHAPA 18, 200x100x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34	394,77	R\$ 13.422,18		R\$ -	R\$	0,00	R\$	34,00	R\$ 13.422,18					
11.7	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA EM CHAPA 18, 300x100x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	566,72	R\$ 4.525,76		R\$ -	R\$	0,00	R\$	8,00	R\$ 4.525,76					
11.8	CURVA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFORADA 90° 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	79,12	R\$ 316,48		R\$ -	R\$	0,00	R\$	4,00	R\$ 316,48					
11.9	CURVA HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFORADA 90° 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	133,17	R\$ 399,51		R\$ -	R\$	0,00	R\$	3,00	R\$ 399,51					
11.10	TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL P/ ELETROCALHA 90° 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	112,72	R\$ 112,72		R\$ -	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$ 112,72					
11.11	TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL P/ REDUÇÃO CONCENTRICA PERFORADA PARA ELETROCALHA 300x100mm/200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	139,43	R\$ 697,15		R\$ -	R\$	0,00	R\$	5,00	R\$ 697,15					
11.12		UN	2	86,38	R\$ 176,76		R\$ -	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$ 176,76					
11.13	TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA PERFORADA 90° 300x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	107,62	R\$ 215,24		R\$ -	R\$	0,00	R\$	2,00	R\$ 215,24					
11.14	GANCHO DE SUSPENSÃO DUPLA P/ ELETROCALHA 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44	21,37	R\$ 940,28		R\$ -	R\$	0,00	R\$	44,00	R\$ 940,28					
11.15	GANCHO DE SUSPENSÃO DUPLA P/ ELETROCALHA 300x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	28,26	R\$ 339,12		R\$ -	R\$	0,00	R\$	12,00	R\$ 339,12					
11.16	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA PERFORADA 200x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39	21,99	R\$ 857,61		R\$ -	R\$	0,00	R\$	39,00	R\$ 857,61					
11.17	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA PERFORADA 300x100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	24,81	R\$ 223,29		R\$ -	R\$	0,00	R\$	9,00	R\$ 223,29					
11.18	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETROCALHA PERFORADA 200x100x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	168,81	R\$ 844,05		R\$ -	R\$	0,00	R\$	5,00	R\$ 844,05					
11.19	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETROCALHA PERFORADA 300x100x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	238,71	R\$ 238,71		R\$ -	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$ 238,71					
11.20	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF_12/2020	UN	1	548,28	R\$ 548,28		R\$ -	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$ 548,28					
11.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 65 MM (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	12	79,01	R\$ 936,12		R\$ -	R\$	0,00	R\$	12,00	R\$ 936,12					



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UNID	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)				
11.22	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHA-JADA, DN 90 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	179,85	R\$ 359,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 359,70			
11.23	LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 90 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6	344,51	R\$ 2.067,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 2.067,06			
11.24	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	180	5,39	R\$ 970,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	180,00	R\$ 970,20			
12	QUADROS ELÉTRICOS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 86.486,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 86.486,72			
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	7.041,93	R\$ 7.041,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 7.041,93			
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Q.D.F. 01), DE SOBREPOR, INCLUINDO DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.594,86	R\$ 2.594,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.594,86			
12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Q.D.F. 02), DE SOBREPOR, INCLUINDO DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.664,93	R\$ 2.664,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.664,93			
12.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Q.D.F. 03), DE SOBREPOR, INCLUINDO DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.713,97	R\$ 2.713,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.713,97			
12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Q.D.F. 04), DE SOBREPOR, INCLUINDO DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.735,86	R\$ 2.735,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 2.735,86			
12.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (Q.D.F. 05), DE SOBREPOR, INCLUINDO DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.082,46	R\$ 3.082,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.082,46			
					R\$ 20.844,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ 20.844,13			
13	DISTRIBUIÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA														
13.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	2100	7,36	R\$ 15.456,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2.100,00	R\$ 15.456,00			
13.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	3600	10,74	R\$ 38.664,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	3.600,00	R\$ 38.664,00			
13.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	500	15,01	R\$ 7.505,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	500,00	R\$ 7.505,00			
13.4	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	120	4,12	R\$ 494,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	120,00	R\$ 494,40			
13.5	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 4,0mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	230	4,51	R\$ 1.037,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	230,00	R\$ 1.037,30			
13.6	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 6,0mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	4,86	R\$ 126,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	26,00	R\$ 126,36			
13.7	SAÍDA HORIZONTAL PARA PERFILADO 36x36 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40	17,37	R\$ 694,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 694,80			
13.8	PERFILADO PERFURADO 36x36 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85	87,08	R\$ 7.401,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	85,00	R\$ 7.401,80			




PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINHO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)		
13.9	JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85	15,04	R\$ 1.278,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	85,00	R\$ 1.278,40		
13.10	JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	27,40	R\$ 411,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 411,00		
13.11	JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	27,40	R\$ 411,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	15,00	R\$ 411,00		
13.12	VERGALHO ROSCA TOTAL 1/4" x 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	380	18,91	R\$ 7.374,90		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	380,00	R\$ 7.374,90		
13.13	SUORTE PARA PERFILADO 38mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	255	11,89	R\$ 2.880,95		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	255,00	R\$ 2.880,95		
13.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	255	24,10	R\$ 6.145,50		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	255,00	R\$ 6.145,50		
13.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	60	27,85	R\$ 1.671,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 1.671,00		
13.16	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016, P	UN	145	14,31	R\$ 2.074,95		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	145,00	R\$ 2.074,95		
13.17	ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO TIPO "D" DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100	5,41	R\$ 541,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	100,00	R\$ 541,00		
13.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60	31,08	R\$ 1.864,80		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 1.864,80		
13.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20	33,97	R\$ 679,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 679,40		
13.20	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016, P	UN	40	17,16	R\$ 687,20		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 687,20		
13.21	ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO TIPO "D" DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	5,81	R\$ 174,30		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 174,30		
13.22	SADA LATERAL, DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	6,22	R\$ 62,20		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 62,20		
13.23	SADA LATERAL, DUPLA PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	8,22	R\$ 32,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 32,88		
14	LUMINÁRIAS - INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 97.789,14		R\$ -		R\$ -						
14.1	PLAFONTE LED REDONDO DE EMBUTIR 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40	99,79	R\$ 3.991,60		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	40,00	R\$ 3.991,60		
14.2	PANEL LED QUADRO DE EMBUTIR LEDVANCE 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	212,36	R\$ 10.618,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 10.618,00		
14.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96	189,32	R\$ 18.395,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	96,00	R\$ 18.395,40		
14.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT RETÂNGULAR DE PISO 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33	120,36	R\$ 3.971,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	33,00	R\$ 3.971,88		



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA: CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS

LOCAL: RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM

PERÍODO DA MEDIÇÃO:

01.11.2023 A 30.11.2023

EMPRESA: JRM ENGENHARIA EIRELI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL	
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)
15	TOMADAS E INTERRUPTORES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	90	305,75	R\$ 27.517,50		R\$		R\$	0,00	R\$	90,00	R\$ 27.517,50
15.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	20	342,61	R\$ 6.852,20		R\$		R\$	0,00	R\$	20,00	R\$ 6.852,20
15.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	12	308,67	R\$ 3.704,04		R\$		R\$	0,00	R\$	12,00	R\$ 3.704,04
15.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	18	47,21	R\$ 849,78		R\$		R\$	0,00	R\$	18,00	R\$ 849,78
15.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	18	47,21	R\$ 849,78		R\$		R\$	0,00	R\$	18,00	R\$ 849,78
16	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 38.835,82		R\$		R\$				R\$ 38.835,82
16.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF 07/2021	M²	156,5	67,48	R\$ 10.562,18		R\$		R\$	0,00	R\$	156,50	R\$ 10.562,18
16.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 10MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	863,46	157,53	R\$ 136.020,85		R\$		R\$	0,00	R\$	863,46	R\$ 136.020,85
16.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 02/2023, PE	M²	30,74	250,61	R\$ 7.703,75		R\$		R\$	0,00	R\$	30,74	R\$ 7.703,75
16.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M²	0,5	1.361,24	R\$ 680,62		R\$		R\$	0,00	R\$	0,50	R\$ 680,62
17	ESQUADRIAS				R\$ 164.987,40		R\$		R\$				R\$ 164.987,40
17.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	45,88	1.518,29	R\$ 69.528,77		R\$		R\$	0,00	R\$	45,88	R\$ 69.528,77
17.2	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO, ESPESURA DE 10MM, C/ PORTA PIVOTANTE DE 2 FOLHAS, DIM. 6,07x2,60m, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1	18.806,41	R\$ 18.806,41		R\$		R\$	0,00	R\$	1,00	R\$ 18.806,41
17.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87x210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4	1.018,87	R\$ 4.075,48		R\$		R\$	0,00	R\$	4,00	R\$ 4.075,48
17.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	28,99	770,74	R\$ 22.343,75		R\$		R\$	0,00	R\$	28,99	R\$ 22.343,75
17.5	PORTA DE AÇO DE ENROSCAR ONDULADA CHAPA 24 RALADA LARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,71	564,14	R\$ 964,67		R\$		R\$	0,00	R\$	1,71	R\$ 964,67
17.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021, PS	M²	33,84	494,94	R\$ 16.748,78		R\$		R\$	0,00	R\$	33,84	R\$ 16.748,78



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM										PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL	
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)
17.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	M²	46,76	761,74	R\$ 35.618,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	46,76	R\$ 35.618,96
					R\$ 168.173,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 168.173,80	
18	PINTURA												
18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2419,84	3,13	R\$ 7.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2.419,84	R\$ 7.574,09
18.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, LIMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2419,84	15,68	R\$ 37.943,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2.419,84	R\$ 37.943,09
18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2419,84	13,93	R\$ 33.708,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2.419,84	R\$ 33.708,37
18.4	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	648,21	11,88	R\$ 7.700,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	648,21	R\$ 7.700,73
18.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	648,21	13,84	R\$ 8.841,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	648,21	R\$ 8.841,58
18.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	648,21	13,25	R\$ 8.598,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	648,21	R\$ 8.598,78
					R\$ 104.386,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 104.386,64	
19	ALIMENTAÇÃO - INSTAÇÕES HIDRÁULICAS												
19.1	COLAR DE TOMADA EM PVC 76x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	42,54	R\$ 42,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 42,54
19.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	67,11	R\$ 67,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 67,11
19.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	4,09	R\$ 4,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4,09
19.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROFLOCAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2	38,55	R\$ 76,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 76,10
19.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	11,69	R\$ 70,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 70,14
19.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	35,64	29,84	R\$ 1.067,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	35,64	R\$ 1.067,06
					R\$ 1.330,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 1.330,04	
20	DISTRIBUIÇÃO - INSTAÇÕES HIDRÁULICAS												
20.1	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	3,33	R\$ 33,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 33,30
20.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	53,43	R\$ 53,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 53,43
20.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7	67,11	R\$ 469,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 469,77



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:				01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM															
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL					
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)				
20.4	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2	138,63	R\$ 277,26	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 277,26				
20.5	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1	48,34	R\$ 48,34	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 48,34				
20.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2016	UN	1	57,25	R\$ 57,25	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 57,25				
20.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2016	UN	2	65,85	R\$ 131,70	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 131,70				
20.8	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UN	1	12,62	R\$ 12,62	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12,62				
20.9	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	1	12,36	R\$ 12,36	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12,36				
20.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	8	9,79	R\$ 88,11	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 88,11				
20.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	16	11,89	R\$ 187,04	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 187,04				
20.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	1	16,80	R\$ 16,80	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 16,80				
20.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	1	18,59	R\$ 18,59	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 18,59				
20.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	5	19,63	R\$ 98,15	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 98,15				
20.15	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	8	4,60	R\$ 36,80	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 36,80				
20.16	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7	8,72	R\$ 61,04	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 61,04				
20.17	LULA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	1	8,22	R\$ 8,22	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 8,22				
20.18	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	19,59	R\$ 26,00	R\$ 509,34	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	19,59	R\$ 509,34				
20.19	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	51,32	R\$ 29,94	R\$ 1.536,52	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	51,32	R\$ 1.536,52				



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM													
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UND	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)		
20.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	43,77	42,81	R\$ 1.873,79		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	43,77	R\$ 1.873,79		
20.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	29,83	26,56	R\$ 792,28		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	29,83	R\$ 792,28		
20.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	15,88	29,31	R\$ 465,44		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	15,88	R\$ 465,44		
20.23	RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ESTRUTURALARMADO, IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE 15.000,3	UN	1	18.690,81	R\$ 18.690,81		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 18.690,81		
21	REDE COLETOIRA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 28.489,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 28.489,96		
21.1	CAIXA DE GORJURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	512,57	R\$ 512,57		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 512,57		
21.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 900 MM	UN	1	196,46	R\$ 196,46		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 196,46		
21.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	815,46	R\$ 4.077,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 4.077,40		
21.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_08/2022	UN	7	51,07	R\$ 357,49		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 357,49		
21.5	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	26,65	R\$ 26,65		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 26,65		
21.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	10	58,49	R\$ 584,90		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 584,90		
21.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	16,40	R\$ 164,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 164,00		
21.8	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	22,32	R\$ 468,72		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	21,00	R\$ 468,72		
21.9	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	9	11,57	R\$ 104,13		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	9,00	R\$ 104,13		
21.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	98,75	46,61	R\$ 4.602,73		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	98,75	R\$ 4.602,73		



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS



OBRA:		CONCLUSÃO DA CASA DA CULTURA DE PARINTINS												01.11.2023 A 30.11.2023	
LOCAL:		RUA ARMINIO PRESTES, S/N, CENTRO PARINTINS/AM												PERÍODO DA MEDIÇÃO:	
EMPRESA		JRM ENGENHARIA EIRELI													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATADOS				ACUM. ANTERIOR		2ª MEDIÇÃO		ACUM. NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL			
		UNID	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (R\$)	QUANT.	P. TOTAL (\$)	QUANT.	P. TOTAL (\$)		
21.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	M	66,75	26,18	R\$ 2.596,27	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	66,75	R\$ 2.596,27		
21.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 09/2022	M	7,51	33,47	R\$ 251,35	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	7,51	R\$ 251,35		
22	REDE DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
22.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	UN	10	19,91	R\$ 199,10	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 199,10		
22.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	M	31,97	33,47	R\$ 1.070,03	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	31,97	R\$ 1.070,04		
23	TRATAMENTO - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
23.1	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF 12/2020	UN	1	12.692,62	R\$ 12.692,62	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 12.692,62		
23.2	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,39 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF 12/2020 PA	UN	1	6.763,17	R\$ 6.763,17	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 6.763,17		
					R\$ 19.656,98	R\$ -	-	R\$ -	-		R\$ -		R\$ 19.656,98		
26	APARELHOS E METAIS														
26.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	619,64	R\$ 4.959,52	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 4.959,52		
26.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	970,80	R\$ 1.941,60	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 1.941,60		
26.3	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	66,84	R\$ 668,40	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 668,40		
26.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	68,93	R\$ 275,72	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 275,72		
26.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	45,69	R\$ 456,90	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	10,00	R\$ 456,90		
26.6	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 59CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	451,07	R\$ 1.804,28	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.804,28		
26.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	362,38	R\$ 1.449,52	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.449,52		
26.8	PLACADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	362,38	R\$ 724,76	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 724,76		
26.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	105,97	R\$ 847,76	R\$ -	-	R\$ -	-	0,00	R\$ -	8,00	R\$ 847,76		

Antônio J.S. Maciel
Engenharia e Serviços
Administrativos Ltda
CNPJ: 40.413.987/0001-88

Administrative
CNPJ: 40.813.987/0001-88

Atesto que os	materiais foram
entregues	serviços
prestados	de conformidade com
a Nota de Empenho.	

08/02/24

ENGINE: AM 2600210-
CREA-AM 2600210-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 40.813.987/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:06:05 do dia 02/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/06/2024.

Código de controle da certidão: **91ED.B64C.455D.E978**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.813.987/0001-88

Certidão nº: 55854902/2023

Expedição: 11/10/2023, às 14:45:19

Validade: 08/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.813.987/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.813.987/0001-88
Razão Social: ANTONIO J S MACIEL ENG SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI
Endereço: AV RIO JUTAI 670 LOTM JD AMAZONIA / NOSSA SENHORA DAS G / MANAUS / AM / 69053-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020201532280040714

Informação obtida em 05/02/2024 10:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação


Certidão Nº: 52894581
Data: 30/01/2024
Hora: 08:50:26
Válida até: 29/02/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 40.813.987/0001-88 - ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

305919/2023**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ENDEREÇO : AVENIDA RIO JUTAI, Nº: 670, CEP: 69053020
BAIRRO : NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS COMPLEMENTO : , LOTM JD AMAZONIA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 49281701
CNPJ/CPF : 40813987000188

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

21/12/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 20/03/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS,
MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº305919/2023**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **367.761.E03.190**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 21/12/2023



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007412387

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 04/02/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:


ANTONIO J S MACIEL ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI,
residente na RUA RIO JUTAI N 34, QUADRA 36, VIERALVES, CEP: 69053-020,
vinculado ao CNPJ: 40.813.987/0001-88. *****


Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

PEDIDO Nº: 0007412387



		DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA			
CONTRATO:		Nº			
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: <u>01.11.23</u>	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA	TARDE
				☐ BOM	☐ BOM
				☐ INSTÁVEL	☐ INSTÁVEL
				☐ CHUVOSO	☐ CHUVOSO
				☐ S/ ATIVIDADE	☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :	<u>Quarta Feiz</u>			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente			
Pedreiro		Técnico			
Carpinteiro		Encamegado			
Armador		Almoxarife			
Eletricista		Apontador			
Encanador					
Total		Total			
EQUIPAMENTOS					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <u>Execução de emboco.</u> <u>Demolição de infraestrutura.</u>					
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO		GERENCIAMENTO	
				<u>Antônio S. Maciel</u> Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 02.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA	TARDE	NOITE
	DIA DA SEMANA: Quinta Feia			☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de chopusco.

Execução de embriço.


Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
------------	--------------	---------------

Antônio J.S. Maciel
Engenharia e Serviços
Administrativos Ltda
CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 03. 11. 23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Sexta Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de alvenaria.
Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenheiro de Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 04.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA:		Sábado				


MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>Execução de emboco.</i> <i>Demolição de superestrutura.</i>

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio J.S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 05.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TERMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA: Domingo					

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


Execução de chapisco.
 Execução de emboco.
 Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
------------	--------------	---------------

Antônio J. S. Maciel
 Engenheiro de Serviços
 Administrativos Ltda
 CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 06.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA:		Segunda Feia				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Aportador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de alvenaria.


Demolição de superestrutura.


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
------------	--------------	---------------

Antônio J. S. Maciel
 Engenharia e Serviços
 Administrativos Ltda
 CNPJ: 40.813.987/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA				
CONTRATO:		Nº				
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 07.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR.	DIAS RESTANTES		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
	DIA DA SEMANA:	Temp Fria		NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Aportador				
Encanador						
Total		Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de alvenaria Demolição de superestrutura.						
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO			GERENCIAMENTO Antônio S Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 08.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Quarta Feia				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Aportador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de chapisco.


Execução de emboco.


Demolição de superestrutura.


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
OBJETO: 		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA				
CONTRATO:		Nº				
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 09.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
DIA DA SEMANA :		<i>Quinta Feia</i>		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Aportador				
Encanador						
Total		Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>Execução de emboco.</i> <i>Demolição de superestrutura.</i>						
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO		GERENCIAMENTO <i>Antônio J. Maciel</i> Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88		

		DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETO: CONCLUSÃO CASA DA CULTURA		CONTRATO: Nº			
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 10.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :	Sexto Feiro		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente		EQUIPAMENTOS	
Pedreiro		Técnico			
Carpinteiro		Encarregado			
Armador		Almoxarife			
Eletricista		Apontador			
Encanador					
Total		Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>Execução de alvenaria.</i> <i>Execução de chapisco.</i> <i>Demolição de superestrutura.</i>					
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO		GERENCIAMENTO <i>Antônio J. Maciel</i> Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

		DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA				
CONTRATO:		Nº				
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 11.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TERMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
	DIA DA SEMANA :	Sábado		NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE		
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de alvenaria. Execução de chapisco. Demolição de superestrutura.						
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO			GERENCIAMENTO Antônio L. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 12.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA:	Domingo				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


Execução de embase.


Demolição de infraestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Atencioso Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA						
CONTRATO:		Nº						
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 13.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR.	DIAS RESTANTES		☐ MANHÃ ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE		
DIA DA SEMANA :		<i>Segundo Fuma</i>						
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS				
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador		Alojarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador								
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>- Execução de alvenaria.</i> <i>- Demolição de superestrutura.</i>								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA			FISCALIZAÇÃO			GERENCIAMENTO		
						<i>Antônio L. Maciel</i> Engenharia de Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88		

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
CONTRATO:		Nº	

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 14.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TERMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR.	DIAS RESTANTES		MANHA	TARDE	NOITE
				☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Terça Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apointador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Execução de emboco.
- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 15.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR.	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Quarta Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apoentador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Execução de alvenaria.
- Remediação de infraestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 16.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Quinto Feiro				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


- Execução de emboco.

- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 17.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA	TARDE	NOITE
				☐ BOM	☐ BOM	☐ BOM
				☐ INSTÁVEL	☐ INSTÁVEL	☐ INSTÁVEL
				☐ CHUVOSO	☐ CHUVOSO	☐ CHUVOSO
				☐ S/ ATIVIDADE	☐ S/ ATIVIDADE	☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :		20to Feno			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Aportador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Movimentação de terra.


- Execução de alvenaria e chapisco.

- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antonio S Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
		OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA			
CONTRATO:				Nº			

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 18.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA	TARDE	NOITE
				☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :		<i>sábado</i>			


MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encamegado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apostador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Movimentação de terra

- Execução de alvenaria e chapisco.

- Remoção de infraestrutura.

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		 Antônio J. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 19.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		☐ MANHA ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ TARDE ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ NOITE ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Domingo				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encamegado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Movimentação de Terra.
- Execução de alvenaria e chapisco.
- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
CONTRATO:		Nº	

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 20.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA:		Segunda Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Movimentação de terra.
- Execução de alvario e chapisco.
- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio L. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 21.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR.	DIAS RESTANTES.		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :		Terça Feir			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Execução de alvenaria


- Demolição de superestrutura

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
------------	--------------	---------------

Antônio S. Maciel
 Engenharia de Serviços
 Administrativos Ltda
 CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 22.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Quarta Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Execução de alvenaria.


- Execução de chapisco.

- Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio A. M. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 23.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		Quinta Feira				

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Amador		Almoxarife				
Eletricista		Apostador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


Exatidão de embudo.


Demolição de superestrutura.


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.087/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETO: CONCLUSÃO CASA DA CULTURA		CONTRATO:		Nº	
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: <i>24.11.23</i>	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO	
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		MANHÃ ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
DIA DA SEMANA :		<i>Sexto Feiro</i>		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente			
Pedreiro		Técnico			
Carpinteiro		Encarregado			
Armador		Almoxarfe			
Eletricista		Apointador			
Encanador					
Total		Total			
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>- Execução de embudo.</i> <i>- Demolição de superestrutura.</i>					
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO		GERENCIAMENTO <i>Antonio J. Maciel</i> Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA				
CONTRATO:		Nº				
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 25.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		MANHA	TARDE	
				☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
	DIA DA SEMANA :	Sábado		☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: - Execução de alvenaria. - Execução de chapisco. - Demolição de superestrutura.						
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO						
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO			GERENCIADOR: S. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88	

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 26.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIA DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA: Domingo					

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Amador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				


EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de alvenaria
 Execução de chapisco
 Demolição de superestrutura

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio J. Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 27.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TERMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :		Segunda Feira			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de chapisco.

Execução de embuçes.

Demolição de superestrutura.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
		Antônio Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88

	DIÁRIO DE OBRA		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
	OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA	
	CONTRATO:		

INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 28.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	TARDE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	NOITE ☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :		Terço Fero			

MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente				
Pedreiro		Técnico				
Carpinteiro		Encamegado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador						
Total		Total				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução de emboco.



Demolição de infraestrutura.


ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

CONTRATADA	FISCALIZAÇÃO	GERENCIAMENTO
------------	--------------	---------------

Antônio R. Maciel
 Engenharia e Serviços
 Administrativos Ltda
 CNPJ: 40.813.987/0001-88

		DIÁRIO DE OBRA						
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
		OBJETO:	CONCLUSÃO CASA DA CULTURA					
		CONTRATO:		Nº				
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 29.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
TERMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		MANHA	TARDE	NOITE		
				☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE	☐ BOM ☐ INSTÁVEL ☐ CHUVOSO ☐ S/ ATIVIDADE		
		DIA DA SEMANA :		Quarta Fev				
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO		
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente						
Pedreiro		Técnico						
Carpinteiro		Encarregado						
Armador		Almoxarife						
Eletricista		Apontador						
Encanador								
Total		Total						
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de alvenaria. Execução de chapisco. Demolição de superestrutura.								
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO								
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO								
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO			GERENCIAMENTO			
					 Antônio de Maciel Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.813.987/0001-88			

		DIÁRIO DE OBRA			
		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
OBJETO:		CONCLUSÃO CASA DA CULTURA			
CONTRATO:		Nº			
INÍCIO CONTRATUAL	DATA: 30.11.23	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO	
				MANHA	TARDE
				☐ BOM	☐ BOM
				☐ INSTÁVEL	☐ INSTÁVEL
				☐ CHUVOSO	☐ CHUVOSO
				☐ S/ ATIVIDADE	☐ S/ ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		NOITE	BOM
				☐ INSTÁVEL	☐ INSTÁVEL
				☐ CHUVOSO	☐ CHUVOSO
				☐ S/ ATIVIDADE	☐ S/ ATIVIDADE
	DIA DA SEMANA :	<i>Quinto Feiro</i>			
MÃO DE OBRA DIRETA	QUANT.	MÃO DE OBRA INDIRETA	QUANT.	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante		Engenheiro Residente			
Pedreiro		Técnico			
Carpinteiro		Encarregado			
Armador		Almozarife			
Eletricista		Apostador			
Encanador					
Total		Total			
EQUIPAMENTOS					
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: <i>Execução de alvenaria</i> <i>Execução de chapisco</i> <i>Demolição de superestrutura</i>					
ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO					
CONTRATADA		FISCALIZAÇÃO		GERENCIAMENTO	
				<i>Antônio S. Maciel</i> Engenharia e Serviços Administrativos Ltda CNPJ: 40.811.987/0001-88	



ANTONIO J S ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELE

CNPJ 40.813.987/0001-88

Rua Rio Jutai, nº 34 Quadra 36-Conj. Vieraalves

Bairro N.Srª das Graças

Telefones: 55 92 3133-3100

E-mail: jrmengenhariaeireli@gmail.com

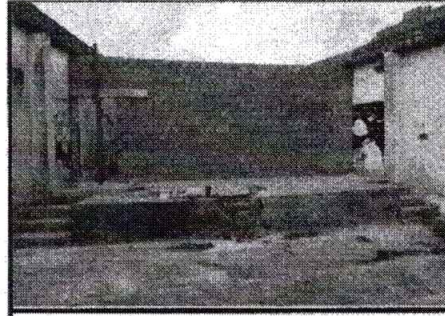
CEP 69053-020 - Manaus/AM - Brasil

CONCLUSÃO CASA DA CULTURA - 2ª MEDIÇÃO

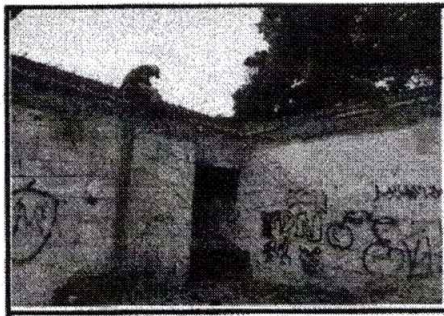
REFORMA



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



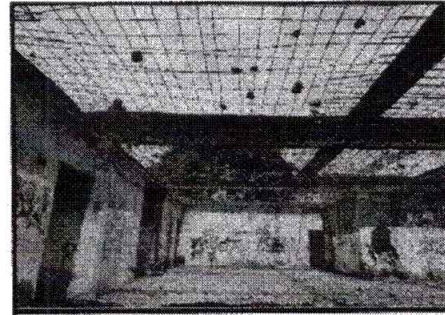
Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



CONCLUSÃO CASA DA CULTURA - 2ª MEDIÇÃO

REFORMA

Rua Rio Jutai, nº 34 Quadra 36-Conj. Vialves
Bairro N.ª Sr.ª das Graças
Telefones: 55 92 3133-3100
E-mail: jrmengenhariaeirelli@gmail.com
CEP 69053-020 - Manaus/AM - Brasil



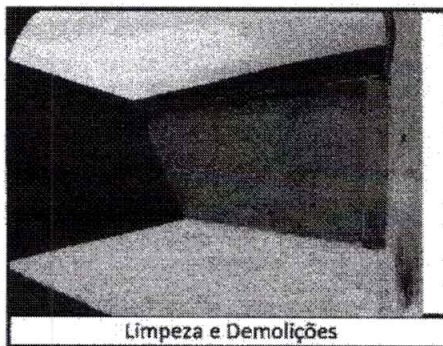
Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Rua Rio Jutai, nº 34 Quadra 36-Conj. Vieraíves
Bairro N.Srª das Graças
Telefones: 55 92 3133-3100
E-mail: jrmengenhariaeireli@gmail.com
CEP 69053-020 - Manaus/AM - Brasil

CONCLUSÃO CASA DA CULTURA - 2ª MEDIÇÃO

REFORMA



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições



Limpeza e Demolições

ANTONIO J S ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELE

Antonio Juciney Silva Maciel
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA nº 25562/AM

JRM - ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

CNPJ sob o nº 40.813.967/0001-86,

Antônio Juciney Silva Maciel

CPF nº. 850.978.292-04
