



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 17 de junho de 2022.

Memorando N° 340/2022 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da TOMADA DE PREÇOS DE N° 008/2022-CML, contendo os anexos listados abaixo da Empresa E. F. N. MESQUITA, CNPJ 09.576.357/0001-97, referente à 1ª (primeira) Medição da Construção de Uma Escola com 10 (dez) Salas der Aula, para Atender a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI N° 124/2022-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços N° 195563 no valor de R\$ 185.800,53 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos reais e cinquenta e três centavos);
- ✓ Planilha da 1ª (primeira) medição com valores e quantitativos;
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico.

Fonte pagadora: 031 – Convênio N° 057/2021-SEDUC/PMP

Atenciosamente,

Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: ____/____/____
Hora: _____

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 17 de junho de 2022

CÓPIA

C. I. Nº 124/2022-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		JUNHO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: TERMO DE CONTRATO N016/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 195563	
CREDOR:		E. F. N. MESQUITA			
CNPJ/ CPF		09.576.357/0001-97		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I			FONE:
OBJETO:		Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	vb	Ref. a 1º (primeira) Medição da Construção da Escola com 10 (dez) Salas de Aula, para Atendimento a Educação Infantil, no Município de Parintins-AM.		R\$185.800,53	R\$185.800,53
RECURSO:		DADOS BANCÁRIOS:		SOMA:	R\$185.800,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
031	CONVÊNIO 057/2021 - SEDUC/PMP		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº008/2022-PMP			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

020489 - E. F. N. Mesquita

Endereço...: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I

Compl.....: Itaúna I

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-97

Número: 195563

CNPJ: 04.329.736/0001-69

Nat. Serviços: À vista

Emissão.....: 17/06/2022

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins


CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Endereço...: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro

Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total
1,00	Und	Referente a 1ª Medição - Construção de 1 (uma) escola com 10 salas de aula no Município de Parintins	185.800,53	185.800,53


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Serviço LC116: 0.00

Valor dos Serviços 185.800,53	Deduções Permitidas	Base de Cálculo 185.800,53	Alíquota % 3,57	Valor do ISS 6.633,08	ISS Retido pelo Tomador SIM
Retenções					
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped. 23,34
					Valor Líquido 179.144,11

Empresa: 207243 - 1.11 ME - Optante Simples

Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal - Lei Municipal.

O valor da Taxa de Expediente e ISS retido e recolhido pelo Tomador do Serviço (Substituto Tributário).

Vencimento do ISS: 10/07/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomasinho Melreiros, 3867 - Itadina I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS						1ª MEDIÇÃO Data: 17/09/2023		
			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
			CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-FMP								
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
Item	Descrição dos serviços	Qtda.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtda.	Valor (R\$)	%	Qtda.	Valor (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS				1.951.953,38						
1.0	ADMINISTRAÇÃO				12.784,00						12.784,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	MES	10.699,02	42.796,08				28,0%	1,00	10.699,02
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.597,08						
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	372,30	2.233,80				100,0%	6,00	2.233,80
2.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	68,00	M2	121,08	8.233,44				100,0%	68,00	8.233,44
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	148,80	M	47,98	7.129,82				100,0%	148,80	7.129,82
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				37.479,86						
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	1.370,20	M2	0,35	480,27				100,0%	1.370,20	480,27
3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 08/2017	143,38	M3	275,00	39.566,78				80,0%	114,70	31.548,82
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	237,75	M2	3,67	1.346,04				80,0%	198,20	1.078,48
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2015	237,75	M2	36,07	8.748,28				30,0%	71,32	2.615,46
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	567,60	M3XKM	2,42	1.487,11				80,0%	454,08	1.189,68
3.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADES: M3). AF. 07/2020	70,95	M3	7,59	538,61				80,0%	56,75	430,60
4.0	INFRAESTRUTURA				285.737,94						
4.1	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	1.091,30	KG	23,37	25.568,08				70,0%	763,91	17.198,21
4.2	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	2.155,40	KG	21,20	45.852,35				70,0%	1.510,86	32.166,63
4.3	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	785,70	KG	19,14	15.055,48				70,0%	555,99	10.258,64
4.4	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2017	40,60	KG	16,24	660,34				70,0%	28,42	461,63
4.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	66,63	M3	959,95	63.743,42				50,0%	34,81	22.871,71
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	69,63	M3	107,06	18.721,26				50,0%	34,81	6.860,84
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM: 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	960,01	M2	83,01	80.427,22				50,0%	479,50	39.213,61
5.0	SUPERESTRUTURA				139.303,90						
5.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	33,04	M3	795,94	27.044,74						
5.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	582,00	KG	23,42	13.611,61						

Assinatura de E. F. N. Mesquita
CREAM 30573

E. F. N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomasinho Melreiros, 3867 - Itadina I - CEP 69153-003 - Parintins/AM
Diego César do César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 09.576.357/0001-97			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BARRIO PAULO CORREA, PARINTINS - AM								
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaipu I			CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								
Parintins - Amazonas			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
										1ª MEDIÇÃO	
										Data	17/09/2022
Item	Descrição dos serviços	Qtd.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtd.	Valor (R\$)	%	Qtd.	Valor (R\$)
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	130,90	KG	21,28	2.785,92						
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	1.102,70	KG	19,07	21.028,48						
5.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 08/2020	482,91	M2	149,15	89.043,02						
6.1	PAVIMENTAÇÃO ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2018	285,94	M3	65,28	18.670,92						
6.2	PISO EM CONCRETO 25 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	1.243,05	M2	83,06	103.247,73						
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES	1.072,07	M2	52,05	55.444,48						
6.4	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2018	48,98	M3	882,04	43.265,23						
6.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2016	78,00	M2	93,52	8.517,94						
6.6	PISO PODOFATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	70,42	M	142,92	10.084,42						
6.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, ENTREGHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	58,02	M	59,88	3.452,06						
7.1	PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2014	2.369,85	M2	20,01	47.400,68						
7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	2.868,35	M2	2,16	6.176,85						
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (SICATO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020. P	1.448,87	M2	19,67	28.518,84						
8.1	ALVENARIA MASSA ÚNICA, PARA REVERIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUDAS. AF. 06/2014	2.754,22	M2	40,98	112.855,80						
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZIO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	1.375,11	M2	95,61	131.289,81						
8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 08/2014	2.758,22	M2	6,94	19.142,04						

Assinatura de E. F. N. Mesquita
CREAM 3575

E. F. N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaipu I - CEP 69153-002 - Parintins/AM
Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913003

Assinatura de Diego Eduardo César

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 09.576.357/0001-97			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
Rua Terezinha Maires, 3897 - Itaúna I			CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								
Parintins - Amazonas			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS-AM								
			1ª MEDIÇÃO								
			Data: 17/08/2022								
Item	Discriminação dos serviços	Qtde.	Und.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtde.	Valor (R\$)	%	Qtde.	Valor (R\$)
9.5	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018	115,20	M	83,78	7.345,16						
9.6	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2018	115,20	M	50,12	6.086,42						
9.8	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2018	21,00	M	36,09	1.118,79						
9.9	ESQUADRIA (PORTA/GRADIL)				88.472,41						
9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNICOES. AF. 12/2019	3,76	M2	357,28	1.350,61						
9.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3"18"	50,15	M2	682,43	34.721,50						
10.0	COBERTURA				279.697,75						
10.1	INSTALAÇÃO DE TESSURA (ITEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 4,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	28,00	UN	261,37	7.318,36						
10.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	1.305,94	M2	65,38	86.265,56						
10.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	1.305,94	M2	119,39	156.251,97						
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	79,50	M	65,06	5.161,47						
11.0	INSTALAÇÃO ELETRIKAS				105.920,22						
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	632,95	632,95						
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	1.047,34	1.047,34						
11.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2019	2,00	UM	206,27	412,54						
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	388,95	M	4,24	1.649,14						
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	8.521,60	M	6,90	24.200,04						
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	39,70	M	6,46	366,10						
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	1.520,70	M	15,55	23.602,50						
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	25,40	M	23,83	605,26						
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	20,50	M	57,76	1.113,92						
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	105,40	M	70,99	7.877,72						

Parintins, 17 de Agosto de 2022
 E. F. N. Mesquita
 CREA-AM 06576

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
 Rua Terezinha Maires, 3897 - Itaúna I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itauna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								1ª MEDIÇÃO
			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
			CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PMP								
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 19 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								Data
											17/06/2022
Item	Descrição dos serviços	Qtds.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtds.	Valor (R\$)	%	Qtds.	Valor (R\$)
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	45,00	UN	13,53	606,85						
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	14,16	14,16						
11.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	3,00	UN	66,27	204,81						
11.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	15,00	UN	69,51	1.042,65						
11.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	74,66	74,66						
11.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00	UN	84,01	84,01						
11.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	2,00	UN	500,72	1.001,44						
11.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	45,00	UN	47,86	1.062,28						
11.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	16,00	UN	61,66	978,64						
11.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	10,00	UN	24,11	241,10						
11.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	5,00	UN	39,09	190,45						
11.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	16,50	UN	62,09	833,44						
11.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	14,30	M	11,81	108,88						
11.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	80,00	M	17,16	1.041,10						
11.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	24,40	M	25,44	675,12						
11.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,50	M	11,28	16,92						
11.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1,40	M	36,43	49,60						
11.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	395,45	M	16,87	6.472,54						
11.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES EM LED 1820W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	172,00	UN	197,83	23.705,79						
11.30	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	91,60	UN	16,02	1.467,82						
11.31	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	186,00	UN	12,50	2.312,50						

Assinatura do Responsável Técnico
Diego Eduardo César
CREA - AM 2603913608

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rue Tomazinho Meireles, 3897 - Itauna I - CEP 69153-003 - Parintins/AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2603913608

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomasinha Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
			CONTRATO: 019/2022 - TOMADA DE PREÇOS 06/2022-PMP								
			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
			1ª MEDIÇÃO								
			Data: 17/04/2022								
Item	Descrição dos serviços	Qtd.	Unid.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtd.	Valor (R\$)	%	Qtd.	Valor (R\$)
11.32	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 90 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	13,00	UN	35,00	455,00						
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	45,00	UN	75,48	3.393,60						
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	397,17	M	39,75	15.787,50						
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	99,08	M	27,61	2.734,50						
12.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	25,69	M	31,34	804,46						
12.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	2,00	UN	480,19	960,38						
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
13.1	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,87 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	1,00	UN	12.990,39	12.990,39						
13.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	138,18	M	19,27	2.664,30						
13.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	49,30	M	17,00	838,10						
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBDUTO AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	249,99	M	28,29	7.069,76						
13.5	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 8272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	1,80	UN	12.331,44	22.196,59						
13.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	42,00	UN	11,76	493,92						
13.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	2,00	UN	27,01	54,02						
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	22,00	UN	8,50	187,00						
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	50,00	UN	12,48	624,00						

REVISÃO: 01
CREAM 30579

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomasinha Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2668913008

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
CNPJ 09.576.357/0001-97			ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORRÊA, PARINTINS - AM								
Rua Tomazinho Melrales, 3897 - Itaipua I			CONTRATO: 016/2022 - TOMADA DE PREÇOS 08/2022-PM								
Parintins - Amazonas			OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS								
			LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM								
			1ª MEDIÇÃO								
			Data: 17/08/2022								
Item	Descrição dos serviços	Qtd.	Und	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtd.	Valor (R\$)	%	Qtd.	Valor (R\$)
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUNHA DE ESGOTO SANITÁRIO DE VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	47,00	UN	5,89	276,93						
13.11	JUNTA DE ENCAMINHAMENTO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	8,00	UN	90,17	641,33						
13.12	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	6,00	UN	58,50	292,50						
13.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	22,00	UN	25,97	671,94						
14.0	LOUÇAS				27.221,28						
14.1	VARO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL, BM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	14,00	M2	300,53	4.227,42						
14.2	MIODÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2,00	UN	561,67	1.123,34						
14.3	BANCADEIRA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2,00	UN	578,93	1.147,86						
14.4	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 1,55 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	2.996,11	5.992,22						
14.5	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 0,65 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	2,00	UN	1.303,18	2.606,36						
14.6	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 2,65 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	2.797,80	2.797,80						
14.7	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 3,52 X 2,60 + 2,34 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	9.326,58	9.326,58						
14.8	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 2,00 X 2,70 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	1,00	UN	4.587,71	4.587,71						
14.9	BANCADEIRA GRANITO CINZA POLIDO 1,00 X 2,30 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR AÇO INOX, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	4.032,06	4.032,06						


 Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
 Rua Tomazinho Melrales, 3897 - Itaipua I - CEP 69153-002 - Parintins/AM


 Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

PLANILHA DE MEDIÇÃO											
E. F. N. MESQUITA - ME CNPJ 09.576.357/0001-97 Rua Tomazinho Meireles, 3897 - Itaúna I Parintins - Amazonas		CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									1ª MEDIÇÃO Data 17/06/2022
		ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO PAULO CORREA, PARINTINS - AM									
		CONTRATO: 018/2022 - TOMADA DE PREÇOS 09/2022-PMR									
		OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PARINTINS									
		LOCAL: CIDADE DE PARINTINS/AM									
Item	Descrição dos serviços	Qtd.	Und.	Valor Unitário R\$	A Realizar R\$	MEDIÇÕES ANTERIORES (Acumuladas)			MEDIÇÃO ATUAL		
						%	Qtd.	Valor (R\$)	%	Qtd.	Valor (R\$)
15.0	ESQUADRIAS				112.866,19						
15.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	34,98	M2	706,10	24.172,67						
15.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	94,32	M2	593,64	55.890,75						
15.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	17,00	UN	286,12	4.863,94						
15.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_1	38,72	M2	752,39	27.927,76						
16.0	REVESTIMENTO				94.271,12						
16.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 05/2014	170,06	M2	66,13	9.426,12						
16.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 05/2014	599,68	M2	83,73	24.946,77						
17.0	DIVERSOS				69.813,08						
17.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 09/2017_1	772,34	M2	76,74	59.269,37						
17.2	ACM - ALUDOBOND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	248,90	M2	515,88	127.918,05						
17.3	BARRA METÁLICA EM BARRAS DE FERRO OATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,95	M2	410,49	15.945,58						
17.4	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	30,56	M2	736,41	22.679,33						
TOTAL					1.055.286,94						

Obs:

O valor desta Fatura é de R\$ 165.800,53 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos reais e cinquenta e três centavos)

SEMOSP / PARINTINS - AM
 Atesto que os materiais foram
 entregues serviços
 prestados de conformidade com
 a Nota de Empenho.
 Em: 17/06/22

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ
09.576.357/0001-97
E. F. N. MESQUITA

RUA TOMASZINHO MEIRELES, 3897
 ITAÚNA I - CEP 69.152-002
 PARINTINS - AM
 AMAZONAS

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-AM 2608913008

E.F.N. MESQUITA - CNPJ 09.576.357/0001-97
 Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I - CEP 69153-002 - Parintins/AM

Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - Mobiliário

Período: 01/01/2017 a 17/06/2022

Número: 20220617207243

Emissão: 17/06/2022 Validade: 60 dias

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação - SMTCA e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 - PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e suas alterações e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS DO IMÓVEL

Matrícula: 207243 Endereço: Rua Tomaszinho Meireles Número: 3897
Bairro: Itaúna I
Compl: Construtora

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL

CPF/CNPJ: 09.576.357/0001-87 E. F. N. Mesquita
Endereço: Rua Tomaszinho Meireles, 3897 - Itaúna I
Compl: Itaúna I

Parintins, 17 de Junho de 2022

Cláudio Sérgio N. Cardoso
Secretário M. de Terras, Cadastro e Arrecadação
Decreto nº 82/2022 - PGMP
SMTCA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 006145515

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 16/06/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

E F N MESQUITA, residente na R TOMASZINHO MEIRELES 3897, , ITAUNA I, CEP: 69152-002, Parintins - AM, vinculado ao CNPJ: 09.576.357/0001-97. *****

Certidão expedida gratuitamente pela Internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 17 de junho de 2022.

PEDIDO Nº: 0006145515





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.576.357/0001-97

Certidão nº: 15638636/2022

Expedição: 16/05/2022, às 15:24:19

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. F. N. MESQUITA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.576.357/0001-97, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.576.357/0001-97

Razão Social: F N MESQUITA

Endereço: R TOMAZINHO MEIRELES 3897 / ITAUNA I / PARINTINS / AM / 69152-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060401344284747023

Informação obtida em 17/06/2022 10:42:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51650838
Data: 17/06/2022
Hora: 09:50:40
Válida até: 17/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.576.357/0001-97 - E. F. N. MESQUITA - ME

Inscrição: 05.442.602-2 - Situação: Ativo

CNAE: 3299-0/99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



ORDEN DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº004/2022-SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Parintins-AM, inscrita no CNPJ 04.329.736/0001-69, **AUTORIZA** a empresa **E F N MESQUITA**, inscrita no CNPJ: 09.576.357/0001-97, a dar INÍCIO a **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA** conforme Termo de Contrato Nº016/2022, cujo objeto é **"CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA, PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM"**, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria Nº 340 de 04 de março de 2013.

Parintins (AM), 06 de Junho de 2022.



Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Diário de obra



E. F. N. MESQUITA - ME

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS.**


REGISTRO DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

DATA	ANOTAÇÕES	CIENTE (PROP)	CIENTE (PROP)
06 / 06 / 2022	1. EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO		
07 / 06 / 2022	1. MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS PARA O LOCAL DA OBRA; 2. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA; 3. LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DA OBRA;		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
08 / 06 / 2022	1. LOCAÇÃO DA OBRA; 2. INÍCIO DA ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DAS SAPATAS.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
09 / 06 / 2022	1. LOCAÇÃO DA OBRA; 2. ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DAS SAPATAS.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
10 / 06 / 2022	1. FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO MANUAL DAS ESCAVAÇÕES DAS VALAS DAS VIGAS BALDRAMES E BLOCOS DAS SAPATAS; 2. EXECUÇÃO DE APOLOAMENTO DOS FUNDOS DAS ESCAVAÇÕES.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
11 / 06 / 2022	1. FINALIZAÇÃO DO APOLOAMENTO DOS FUNDOS DAS ESCAVAÇÕES; 2. LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO; 3. INÍCIO DA CONFECCÃO E MONTAGEM DAS FORMAS PARA AS FUNDAÇÕES; 4. PREPARAÇÃO DAS ARMADURAS DOS BLOCOS DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
12 / 06 / 2022	1. DOMINGO		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
13 / 06 / 2022	1. FINALIZAÇÃO DA CONFECCÃO DAS FORMAS PARA AS FUNDAÇÕES; 2. CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DAS ARMADURAS DOS BLOCOS DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
14 / 06 / 2022	1. FINALIZAÇÃO DA PREPARAÇÃO DAS ARMADURAS DOS BLOCOS DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME; 2. INÍCIO DA PREPARAÇÃO DAS ARMADURAS DA SUPERESTRUTURA.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
15 / 06 / 2022	1. LANÇAMENTO DO CONCRETO NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO; 2. CONTINUAÇÃO DA PREPARAÇÃO DAS ARMADURAS DA SUPERESTRUTURA.		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579
16 / 06 / 2022	1. LANÇAMENTO DO CONCRETO NOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO;		 Fernando Gabriel de M. Garcia Engenheiro Civil CREA/AM 30579

OUTROS FATOS RELEVANTES

ACIDENTES	
OCORRÊNCIA DE ACIDENTES:	
SIM () NÃO (X)	
DATA	TIPO DE ACIDENTE
PERÍODOS DE INTERRUPTÃO	
DATA	MOTIVOS
12/06/2022	DOMINGO - SEM ATIVIDADES


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008


E.F.N. Mesquita
CREA AM 30579

FICHA DE ANDAMENTO DAS ETAPAS

DATA: 17/06/2022

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS HOJE (ASSINALAR COM "X")						ANOTAÇÕES RELEVANTES
ITEM	PROJETOS	INICIADO	ANDAM.	PREJUD.	CONCLUÍDO	
1.0	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 10 (DEZ) SALAS DE AULA.					
1.1	ADMINISTRAÇÃO	X	X			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			X	
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	X			X	
1.4	INFRAESTRUTURA	X	X			
1.5	SUPERESTRUTURA					
1.6	PAVIMENTAÇÃO					
1.7	PINTURA					
1.8	ALVENARIA					
1.9	ESQUADRIA (PORTÃO/GRADE)					
1.10	COBERTURA					
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
1.13	INSTALAÇÕES SANITARIAS					
1.14	LOUÇAS					
1.15	ESQUADRIAS					
1.16	REVESTIMENTO					
1.17	DIVERSOS					

OBS.:


 Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2508913008


 Antonio Roberto de S. Costa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 30579

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Construção de 1(uma) escola com 10 salas de aula no município de Parintins.


Contrato: 016/2022.



Endereço: rua Santa Tereza, bairro – Paulo Corrêa – Parintins, AM.




E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomazinho Meireles, 3897 – Itáúna I – CEP 69153-002 – Parintins/AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008


FERRAZ FILHO & ASSOCIADOS
CREA - AM 30579

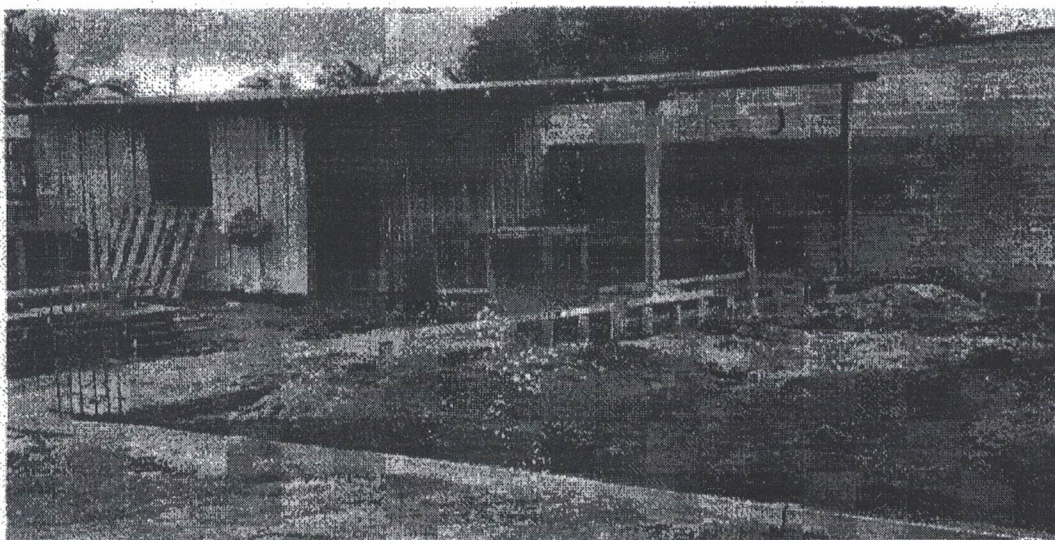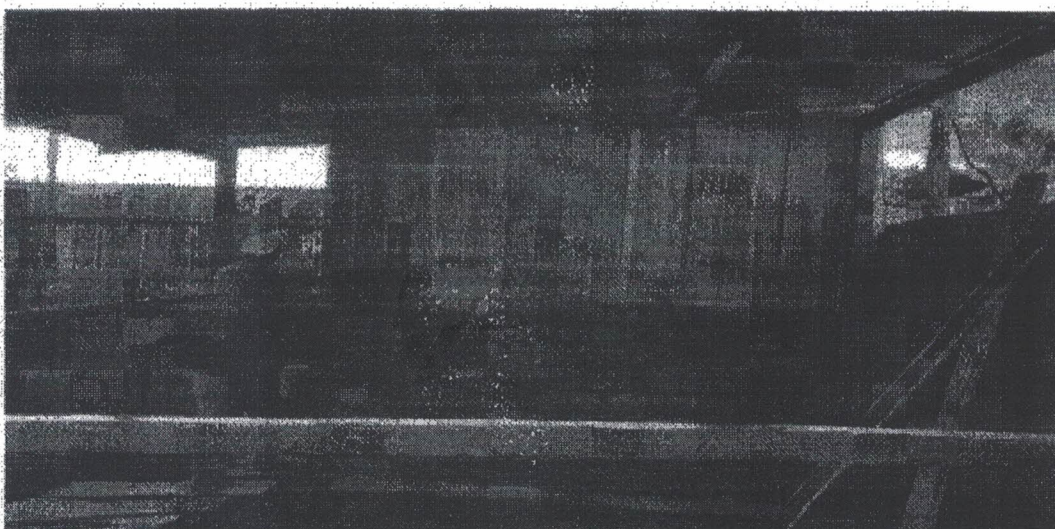

E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomazinho Meireles, 3897 – Itáúna I – CEP 69153-002 – Parintins/AM



Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008




R. Garcia
CREA - AM 30579




E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomasziño Meireles, 3897 – Itaipua I – CEP 69153-002 – Parintins/AM


Diego Santana César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008




FERNANDO DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM 30579

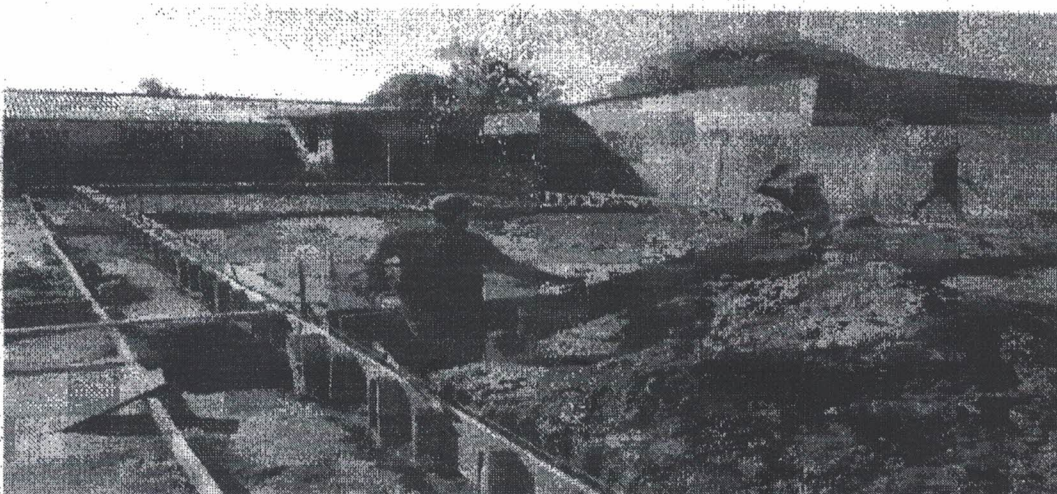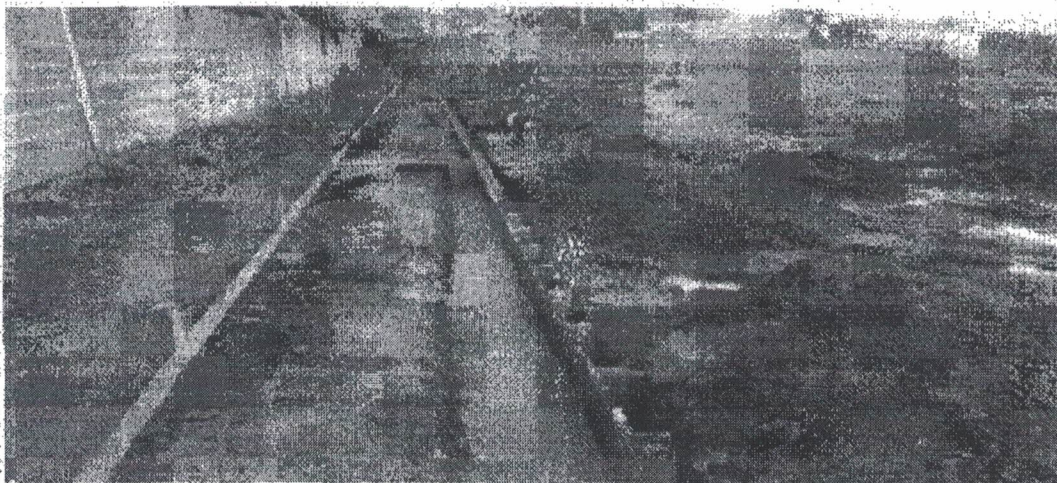

E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 – Itaúna I – CEP 69153-002 – Parintins/AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008





CREA - AM 30579

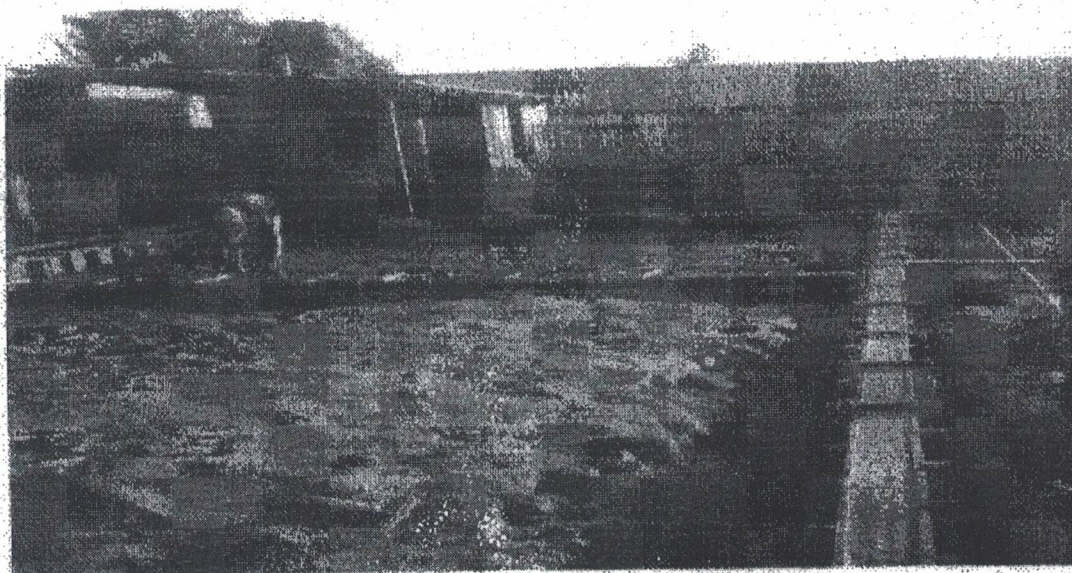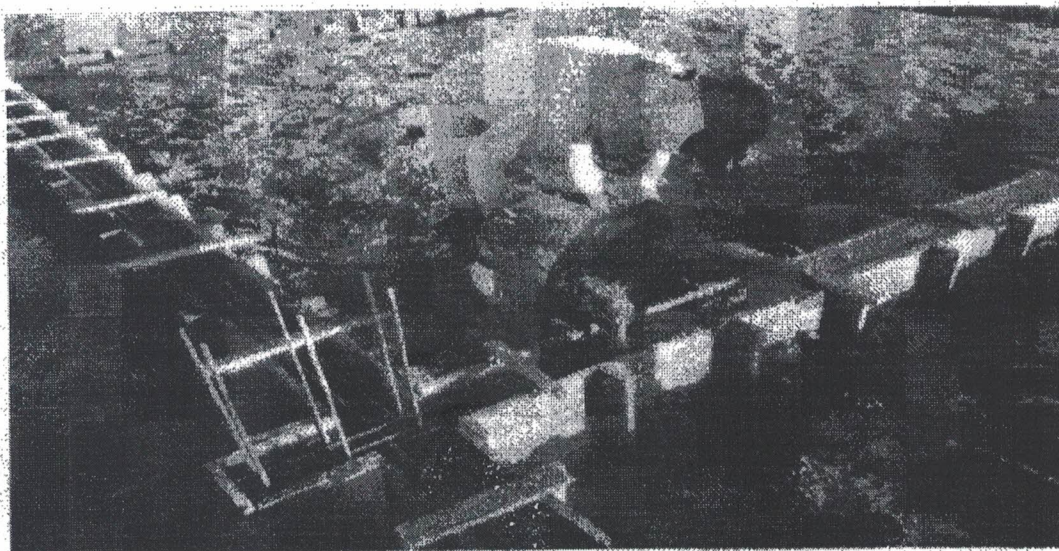

E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 – Itaipava I – CEP 69153-002 – Parintins/AM



Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008




E. Costa
Engenheiro Civil
CREA/AM 30579

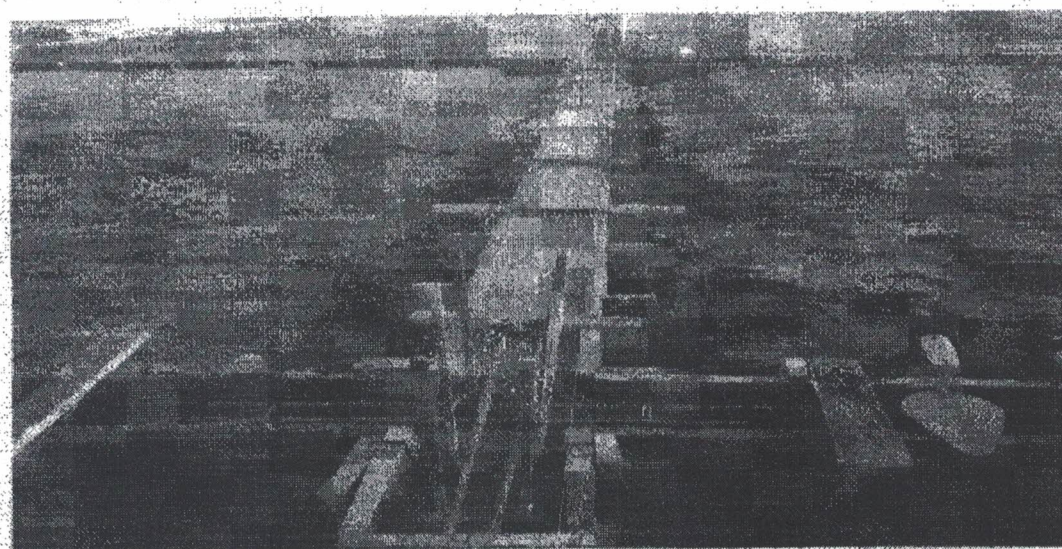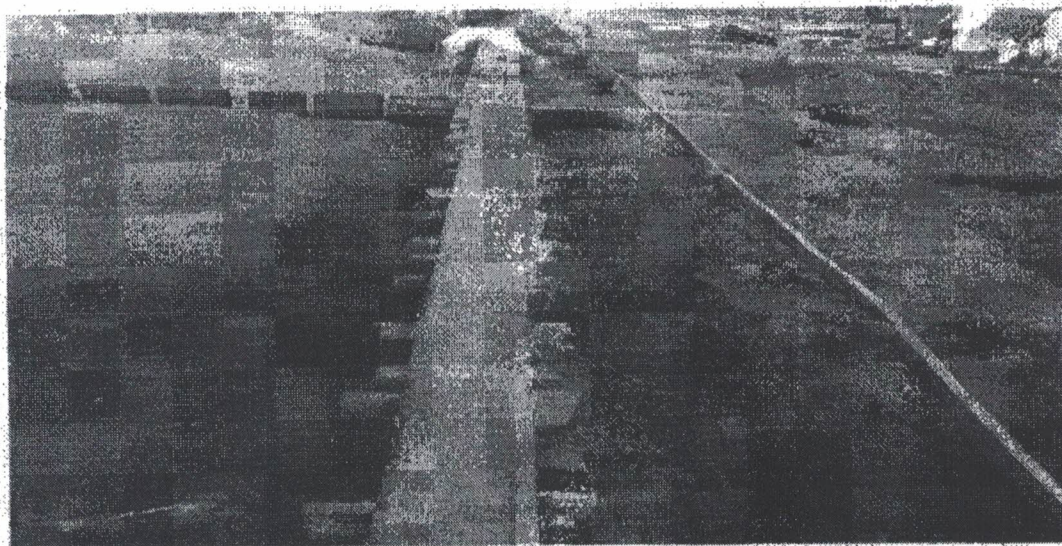


E.F.N. MESQUITA – CNPJ 09.576.357/0001-97
Rua Tomaszinho Meireles, 3897 – Itaúna I – CEP 69153-002 – Parintins/AM




Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008


CREA/AM 30579

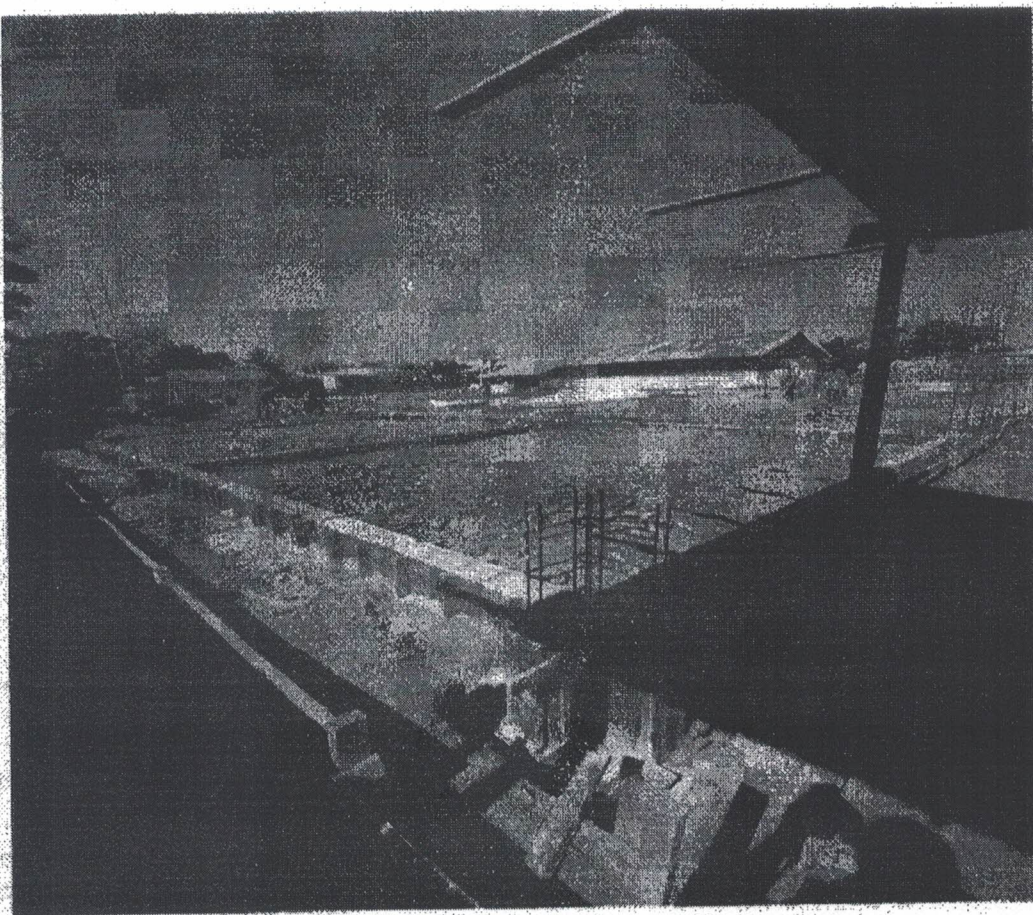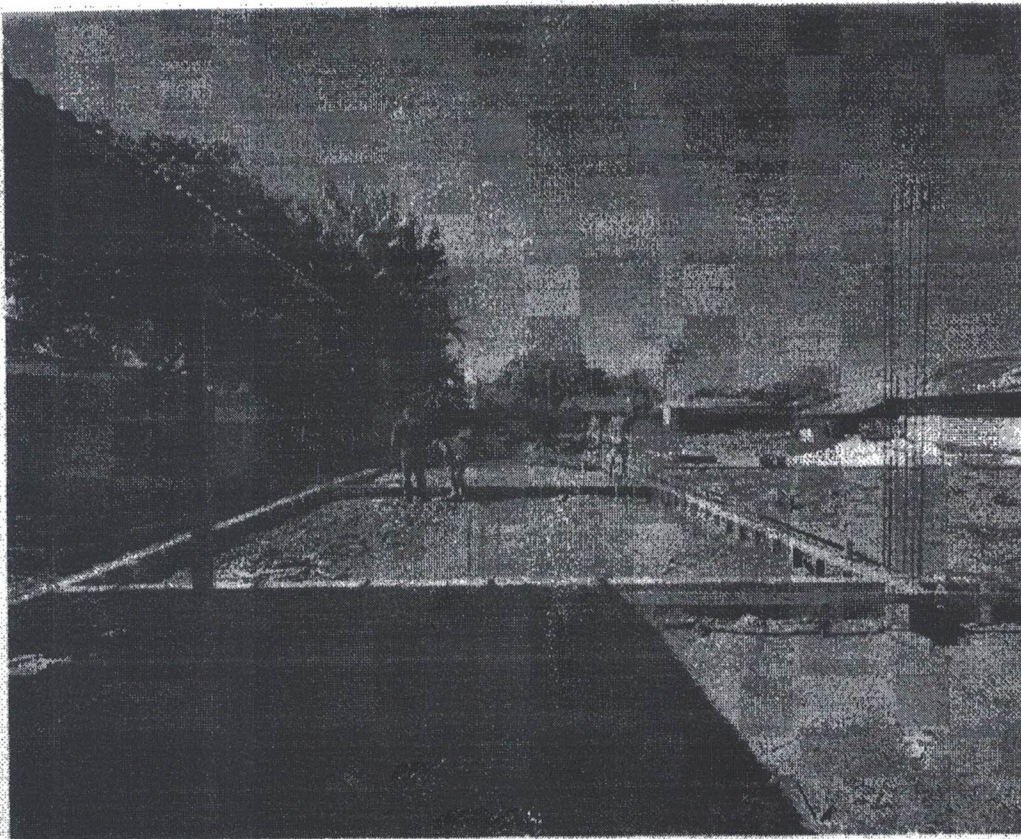


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608915003


Fernando Carlos de M. Garcia
 Engenheiro Civil
 CREA/AM 30579

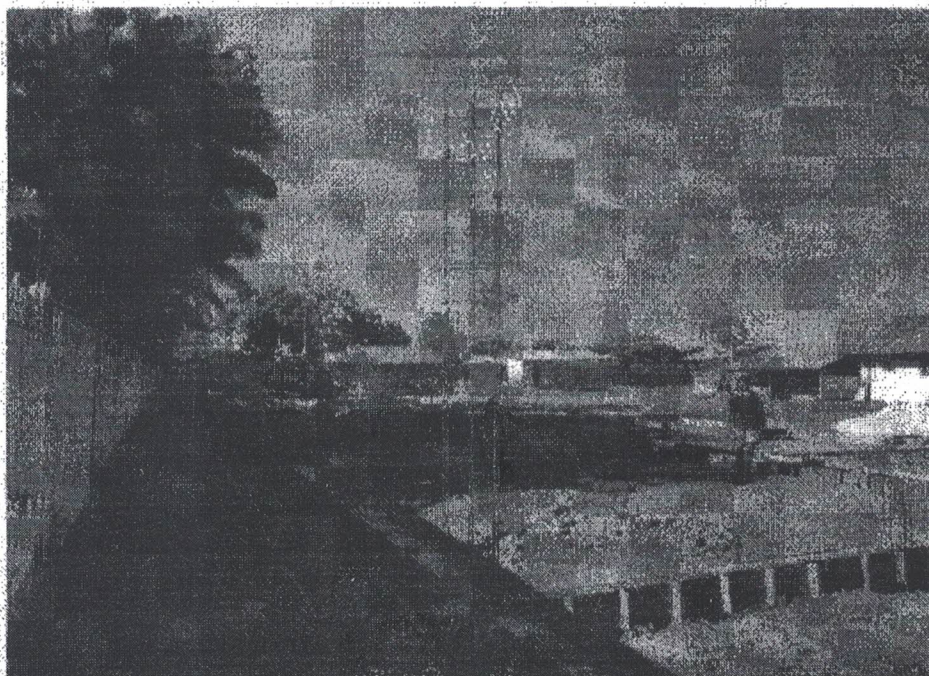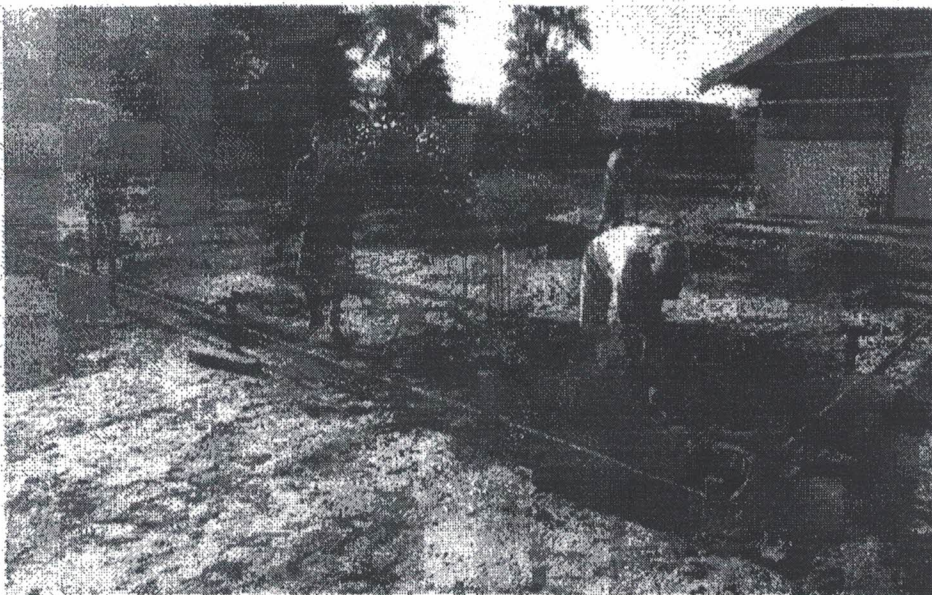


Diego Eduardo César
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - AM 2608913008


 Roberto Carlos de M. Garcia
 Engenheiro Civil
 CREA/AM 38579
