



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-Am, 25 de novembro de 2020.

Memorando Nº 569/2020 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da Carta Contrato Nº 030/2020-SEMOSP, contendo os anexos listados abaixo da Empresa A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 30.155.728/0001-53, referente à 2ª (segunda) Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-Am, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 156/2020-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 181684 no valor de R\$ 79.195,03 (setenta e nove mil cento e noventa e cinco reais e três centavos);
- ✓ Planilha da 2ª (segunda) medição dos serviços.
- ✓ Relatório fotográfico;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos.

Fonte pagadora: 10 – Recursos Ordinários

Atenciosamente,

Lázaro Ferreira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 27/12/2020
Hora: 11:20

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 25 de novembro de 2020

CÓPIA

C. I. Nº 156/2020-SEMOSP/PMP

ANO: 2020		MÊS DE REFERÊNCIA:		NOVEMBRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 030/2020-CML - CARTA CONTRATO Nº 030/2020-SEMOSP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL		Nº 181684	
CREADOR:		A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.			
CNPJ/ CPF		30.155.728/0001-53		PIS/NIT	
ENDEREÇO:		Rua Barreirinha Nº 2383 - Bairro de Palmares - Parintins			FONE:
OBJETO:		Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-AM.			
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VB	Ref. a 2ª (segunda) Medição dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, no Município de Parintins-AM.		79.195,03	79.195,03
FICHA Nº		RECURSO:		SOMA:	R\$ 79.195,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.361.0061.1003.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 030/2020-CML			


Lázaro Ferreira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

Parintins, 23 de novembro de 2020

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
PARINTINS — AMAZONAS — BRASIL
NESTA

Prezados Senhores,

A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ 30.155.728/0001-53, vem pela presente, solicitar de V. Sas., o pagamento no Valor de R\$ 79.195,03 (setenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e três centavos), referente a 2ª Medição dos serviços de Engenharia para a SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM., carta convite 030/2020 - SEMOSP.

Informamos ainda nossos dados Bancários:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0715

CONTA CORRENTE: 1645-6

Sem outro particular para o momento, somos muito gratos pela atenção.


A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Sócio Proprietário
CPF: 275.766.647-72

SOCIO RESPONSÁVEL

Rua Barreirinha 2383 — Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

RECIBO

- Valor Bruto: R\$ 79.195,03

Recebemos da Prefeitura Parintins — Am., a importância de R\$ 79.195,03 (setenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e três centavos), referente a 2ª Medição dos Serviços de Engenharia para SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM, na zona rural do Município de Parintins — Am., conforme CARTA CONTRATO 030/2020 – SEMOSP e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, datada de 23/11/2020, pelo qual damos total e geral quitação.

Parintins, 23 de novembro de 2020


A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietario
CPF: 275.766.647-72
SOCIO RESPONSÁVEL

Rua Barreirinha 2383 – Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Parintins
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Praça Eduardo Ribeiro, 2052 - CEP 69151-271
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

PRESTADOR

042957 - A R Construções de Edifícios LTDA
Endereço...: Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares
Compl.....: Parintins
CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53


Número: 181684

CNPJ: 04.329.736/0001-69
Nat. Serviços: À vista
Emissão.....: 25/11/2020

TOMADOR

000001 - Prefeitura Municipal de Parintins
Endereço...: Pç Eduardo Ribeiro, 2052 - Centro
Compl.....: Parintins - Am / CEP: 69.151-271

Empenho...:
CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69

Quant	Unid	Discriminação dos Serviços	Valor Unit	Valor Total		
1,00	und	Ref. a 2ª medição dos serviços de reforma e ampliação da Escola Nossa Senhora do Remanso, conforme Carta Convite nº 030/2020-CML e Carta Contratonº 030/2020-SEMOSP.	79.195,03	79.195,03		
SEMOSP/PARINTINS-AM Atesto que os <u>materias</u> <u>serviços</u> foram entregues prestados de conformidade com a Nota de Empenho. Em: 25/11/2020  Engº Jamil Issa Coimbra Elias CREA AM/PA - 1516885201 ENGENHEIRO CIVIL SEMOSP/PARINTINS						
Valor dos Serviços		Deduções Permitidas	Base de Cálculo	Aliquota %	Valor do ISS	ISS Retido pelo Tomador
79.195,03			79.195,03	2,00	1.583,90	Sim
Retenções						
INSS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Taxa Exped.	Valor Líquido
					20,00	77.591,13
Natureza do jurídica: 207913 - 1.11 ME - Optante Simples					Vencimento do ISS: 10/12/2020	
Recolhimento de ISS: 38 - NF - ISS Recolhimento mensal					ISS: Media ou Faturamento (12 meses): R\$ 83.694,01	

042957 - A R Construções de Edifícios LTDA
Endereço.: Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares
Compl.....: Parintins
CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53
Empenho:.

Vencimento	10/12/2020
Valor:	20,00
C Moretária:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	


EMISSÃO: 25/11/2020 NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2020

A R Construções de Edifícios LTDA
Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares
Parintins
30.155.728/0001-53

Empenho:

--	--

EMISSÃO: 25/11/2020 NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2020
81620000000 7 20003143202 0 01220081816 4 84042957999 7



Vencimento:	10/12/2020
Valor:	20,00
Correção:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	



042957 - A R Construções de Edifícios LTDA

Endereço.: Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares

Compl.....: Parintins

CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53

Empenho..:

38 - NF - ISS Recolhimento mensal

EMIÇÃO: 25/11/2020

NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2020

Vencimento	10/12/2020
Valor:	1.583,90
C Moretária:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	

A R Construções de Edifícios LTDA

Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares

Parintins

30.155.728/0001-53

Empenho:

38 - NF - ISS Recolhimento mensal

EMIÇÃO: 25/11/2020

NÃO RECEBER APÓS: 20/12/2020

Vencimento:	10/12/2020
Valor:	1.583,90
Correção:	
Multa:	
Juros:	
Desconto:	
Total:	



R\$ 79.195,03

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Parintins a importância supra de R\$ 79.195,03 (SETENTA E NOVE MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS) Conforme demonstrativo abaixo.
Referente a liquidação da Nota Fiscal Número 181684

Quadro Demonstrativo		R\$
MATERIAL:		0,00
Serviço / Mão de Obra		79.195,03
VALOR BRUTO:		79.195,03
DESCONTO ISS (%):	2,00	1.583,90
DESCONTO IR (%):		0,00
DESCONTO INSS (%):		0,00
DESCONTO Taxa Exp:		20,00
VALOR LÍQUIDO:		77.591,13

_____, DE _____ DE _____

A R Construções de Edifícios LTDA

CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53

Rua : Barreirinha, nº 2383 -- Palmares

Prefeitura Municipal de Parintins

PAGUE-SE

Em _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Parintins

Pago este Cheque

Em _____ de _____ de _____

Número: _____

Banco: _____

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM
 ORÇAMENTO: SINAPI - MARÇO/2020 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,88% (10FA) 49,61% (MÉS)
 LOCAL: COMUNIDADE DO REMANSO - PARINTINS/AM

BDI: 13,63%



A.R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ: 30.155.728/0001-53
 Rua Maranhão 2383 - Palmares, CEP: 69255-000
 Parintins - Amazonas

2º - BOLETIM DE MEDIÇÃO														
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								2ª MEDIÇÃO					VALOR	R\$
ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	VAL UNIT	TOTAL		MEDIÇÃO DO PERÍODO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÕES ACUMULADAS
								QUANT	P. TOTAL	%	QUANT	P. TOTAL	%	%
1. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA														
1.1	74209/001	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	R\$ 362,83	R\$ 1.088,49					3,00	R\$1.088,49	100%	100,00%
1.2	99039	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82,80	R\$ 31,86	R\$ 2.639,66					82,80	R\$2.639,66	100%	100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$3.728,15								
3. REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO														
2.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,35	R\$ 37,75	R\$ 50,87					1,35	R\$50,87	100%	100%
2.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,61	R\$ 2,55	R\$ 542,14					212,61	R\$542,14	100%	100%
2.3	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	212,61	R\$ 5,47	R\$ 1.162,95					212,61	R\$1.162,95	100%	100%
2.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	17,00	R\$ 0,93	R\$ 15,81					17,00	R\$15,81	100%	100%
	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	3,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00					3,00	R\$18,00	100%	100%
2.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,35	R\$ 19,68	R\$ 26,57					1,35	R\$20,43	100%	100%
2.7	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM 0,5 A 1,0 KM	M3	3,09	R\$ 4,31	R\$ 13,33					3,09	R\$13,33	100%	100%
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 1.841,05								
3. COB. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
3.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENCADA. AF_05/2018	M2	407,79	R\$ 2,32	R\$ 946,07					407,79	R\$946,07	100%	100%

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
 CREA AM/PA - 1516885201
 ENGENHEIRO CIVIL
 SEMOSP / PARINTINS

A.R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
 CNPJ: 30.155.728/0001-53
 Rildo da Silva Maia
 Sócio Proprietário

3.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA	M3	31,00	R\$ 104,62	R\$ 3.243,22			31,00	R\$3.243,22	100%	31,00	R\$3.243,22	100%	
3.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	4,93	R\$ 88,03	R\$ 433,64			4,93	R\$433,64	100%	4,93	R\$433,64	100%	
3.4	96995	REATERRO MANUAL APROADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	23,64	R\$ 35,61	R\$ 841,98			23,64	R\$841,98	100%	23,64	R\$841,98	100%	
3.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	244,67	R\$ 6,85	R\$ 1.671,11			244,67	R\$1.671,11	100%	244,67	R\$1.671,11	100%	
3.6	741512001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEREO 110 A 140HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	244,67	R\$ 2,61	R\$ 638,60			244,67	R\$638,60	100%	244,67	R\$638,60	100%	
3.7	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TOLMA. AF_01/2018	TREM	254,46	R\$ 1,10	R\$ 279,91			254,46	R\$279,91	100%	254,46	R\$279,91	100%	
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 7.106,48									
4	COD. SINAP	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT	VALUNIT	TOTAL			QUANT	P. TOTAL	%				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2013	M2	18,60	R\$ 62,57	R\$ 1.163,80			18,60	R\$1.163,80	100%	18,60	R\$1.163,80	100%	
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2013	M2	49,26	R\$ 50,93	R\$ 2.508,81			49,26	R\$2.508,81	100%	49,26	R\$2.508,81	100%	
	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM- MONTAGEM. AF_12/2013	KG	982,52	R\$ 8,85	R\$ 8.695,30			982,52	R\$8.695,30	100%	982,52	R\$8.695,30	100%	
4.4	92673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2013	M3	12,28	R\$ 150,77	R\$ 1.851,68			12,28	R\$1.851,68	100%	12,28	R\$1.851,68	100%	
4.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA I) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,28	R\$ 386,80	R\$ 4.750,48			12,28	R\$4.750,48	100%	12,28	R\$4.750,48	100%	
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 18.970,08									
5	COD. SINAP	SUPERESTRUTURA	UNID	QUANT	VALUNIT	TOTAL			QUANT	P. TOTAL	%				
5.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2013	M2	83,70	R\$ 62,57	R\$ 5.237,11	41,85	R\$2.618,55	50%	41,85	R\$2.618,55	50%	83,70	R\$5.237,11	100%

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.788/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietário

5.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	65,68	R\$	30,93	R\$	3.345,08	32,84	R\$1.672,54	50%	32,84	R\$1.672,54	50%	65,68	R\$3.345,08	100%
5.3	92278	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UBIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	596,86	R\$	8,85	R\$	5.382,39	298,44	R\$2.641,19	50%	298,44	R\$2.641,19	50%	596,86	R\$5.262,39	100%
5.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,46	R\$	150,77	R\$	1.124,89	3,7305	R\$562,45	50%	3,73	R\$562,45	50%	7,46	R\$1.124,89	100%
5.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,46	R\$	366,60	R\$	2.885,91	3,7305	R\$1.442,96	50%	3,73	R\$1.442,96	50%	7,46	R\$2.885,91	100%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$	17.829,37				R\$8.737,12							
6	COD. SINAP	COMBUSTORA	UNID	QUANT	VAL. UNID.			TOTAL				QUANT	P. TOTAL	%			
6.1	94213	TEIAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENITO. AF_06/2016	M2	432,28	R\$	49,23	R\$	21.281,14	432,28	R\$21.281,14	100%				432,28	R\$21.281,14	100,00%
6.2	92343	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2012	M2	432,28	R\$	11,44	R\$	4.945,28	432,28	R\$4.945,28	100%				432,28	R\$4.945,28	100,00%
6.3	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENITO. AF_12/2015	UNID	5,00	R\$	976,34	R\$	4.881,70	5,00	R\$4.881,70	100%				5,00	R\$4.881,70	100,00%
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$	31.108,13				R\$11.108,13							
7	COD. SINAP	PAVIMENTAÇÃO	UNID	QUANT	VAL. UNID.			TOTAL				QUANT	P. TOTAL	%			
7.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FOTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,03	R\$	625,08	R\$	2.518,13									
	68303	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	248,55	R\$	48,33	R\$	12.012,42									
7.3	82420	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	248,55	R\$	26,34	R\$	6.546,81									
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$	18.599,23											
8	COD. SINAP	REVESTIMENTO	UNID	QUANT	VAL. UNID.			TOTAL				QUANT	P. TOTAL	%			
8.1	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_04/2014	M2	248,55	R\$	29,71	R\$	7.384,42									
8.2	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	128,70	R\$	34,61	R\$	4.454,31									

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE BENEFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-83
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietário

TOTAL DOS SERVIÇOS												
R\$ 11.636,73												
9	COD. SNAF	ALVENARIA	UNID	QUANT	VAL UNIT	TOTAL			QUANT	P. TOTAL		
9.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE RELOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 191X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 4M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	198,03	R\$ 65,97	R\$ 13.054,04	29,61	R\$2.612,81	20%	158,424	R\$10.451,23	80%
9.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	396,06	R\$ 3,41	R\$ 1.350,56	79,21	R\$270,11	20%	316,848	R\$1.080,45	80%
9.3	87329	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	267,36	R\$ 33,80	R\$ 9.036,77	33,47	R\$1.807,38	20%	213,888	R\$7.229,41	80%
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 23.451,37		R\$4.670,27				
10		PINTURA	UNID	QUANT	VAL UNIT	TOTAL						
10.1	88497	APLICAÇÃO E BORDAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M²	267,36	R\$ 9,70	R\$ 2.590,39						
10.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	267,36	R\$ 1,82	R\$ 486,12						
10.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M²	267,36	R\$ 8,34	R\$ 2.229,78						
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 5.296,29						
11		FORRO	UNID	QUANT	VAL UNIT	TOTAL						
11.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FIBRADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	382,19	R\$ 41,14	R\$ 15.723,30	382,19	R\$15.723,30	100%			
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 15.723,30		R\$15.723,30				
12		SIGNAÇÓIS	UNID	QUANT	VAL UNIT	TOTAL						
12.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VÍDEOS, COM BALANÇO, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VÍDEOS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	M²	19,80	R\$ 579,97	R\$ 11.483,41						
12.2	90843	CAIXA DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (BEVE OU MÓDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	UNID	21,84	R\$ 588,25	R\$ 12.847,38						
12.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRE TIPO VENEZIANA COM QUADRILHAÇÃO, FIBRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	5,04	R\$ 382,19	R\$ 1.926,24						
12.4	75774/001	DIVISÓRIA EM MARMÓRITO ESPESSURA 35MM, CIMENTAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	14,91	R\$ 292,89	R\$ 4.366,99						
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 30.484,01						

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
 CREA AM/PA - A516885201
 ENGENHEIRO CIVIL
 SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS S.A.
 CNPJ: 30.155.788/0001-53
 Rildo da Silva Maia
 Sócio Proprietário

13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	QUANT	VALUNIT	TOTAL														
13.1	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/230V, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	22,00	R\$ 140,90	R\$ 3.099,80													
13.2	93126	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	70,00	R\$ 105,42	R\$ 7.379,40													
13.3	97392	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	70,00	R\$ 33,99	R\$ 2.379,30													
13.4	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUIR. EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 356,01	R\$ 356,01													
13.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	R\$ 12,55	R\$ 37,65													
13.6	93645	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	7,00	R\$ 48,76	R\$ 341,32													
13.7	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 106,45	R\$ 106,45													
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$	13.699,38													
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UNID	QUANT	VALUNIT	TOTAL														
14.1	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 17,73	R\$ 532,30	15	R\$266,25	50%	15	R\$266,25	50%	30	R\$532,30	100%				
	89790	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	30,00	R\$ 6,63	R\$ 198,90	15	R\$99,45	50%	15	R\$99,45	50%	30	R\$198,90	100%				
14.3	74154/001	CAXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	R\$ 240,76	R\$ 722,28	1	R\$240,76	33%	2	R\$481,52	67%	3	R\$722,28	100%				
14.4	96061	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 30 M² (PARA 30 CONTRIBUINTES). AF_05/2016	UNID	1,00	R\$ 10.467,77	R\$ 10.467,77													
14.5	96055	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 40 CONTRIBUINTES). AF_05/2016	UNID	1,00	R\$ 7.474,79	R\$ 7.474,79	1	R\$7.474,79	100%										
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$	17.376,54		R\$8.081,20											
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	QUANT	VALUNIT	TOTAL														

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
 CREA AM/PA - 1516885201
 ENGENHEIRO CIVIL
 SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS S.A.
 CNPJ: 30.155.728/0001-43
 Rildo da Silva Maia
 Sócio Proprietário

15.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 80 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	12,00	R\$	93,88	R\$	1.126,56	6	R\$563,28	6	R\$563,28	30%	6	R\$1.126,56	100%	
15.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	3,00	R\$	56,78	R\$	170,34	2	R\$113,56	1	R\$56,78	33%	3	R\$170,34	100%	
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$	1.296,90	R\$476,84								
16	LOUÇAS		UND	QUANT	VALOR		TOTAL										
16.1	100826	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$	448,08	R\$	896,16									
16.2	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 40CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00	R\$	154,91	R\$	464,73									
16.3	86911	TORNDEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00	R\$	31,55	R\$	94,65									
16.4	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00	R\$	353,08	R\$	1.412,32									
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$	7.847,84									
17	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		UND	QUANT	VALOR		TOTAL										
17.1	CPU - 03	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TRIPULAÇÃO	CHF	6,00	R\$	474,49	R\$	2.846,94	1	R\$474,49	17%	3	R\$1.423,47	30%	4	R\$1.897,96	67%
TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$	7.846,94	R\$		474,49						
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$	49.691,97									
TOTAL DA MEDIÇÃO COM BDI							R\$	79.195,63									
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS							R\$	257.034,30									

SEMOSP/PARINTINS-AM

Atesto que os materias
serviços foram
entregues de conformidade com
prestados a Nota de Empenho.

Em: 25/11/2020

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. Z. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.158.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietário



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE TERRAS, CADASTRO E ARRECAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA – 2020

Nome: A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Endereço: RUA BARREIRINHA, 2383 - PALMARES
CPF/CNPJ: 30.155.728/0001-53
Matricula: 207913

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, relativas a tributos administrados pela Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação e Parintins (CTCA/SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parintins.

Esta certidão foi emitida com base na Lei Complementar nº 006/2009 – PGMP (Código Tributário do Município de Parintins) e tem validade por 60 (sessenta) dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parintins, 23 de novembro de 2020.


Claudio Sergio N. Cardoso
Secretário P/ Assuntos Extraordinários
Decreto Nº 006 / 2019 - CMRH / PMP

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 30.155.728/0001-53**Razão Social:** A R CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA**Endereço:** R BARREIRINHA 2383 / PALMARES / PARINTINS / AM / 69153-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2020 a 22/12/2020**Certificação Número:** 2020112303050002561205

Informação obtida em 23/11/2020 11:50:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A R CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:16 do dia 14/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2021.

Código de controle da certidão: **6C5D.BA8B.1E4A.2172**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 30717657
Data: 14/09/2020
Hora: 08:47:40
Válida até: 09/12/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 30.155.728/0001-53 - A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIO LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.155.728/0001-53

Certidão nº: 23285985/2020

Expedição: 14/09/2020, às 09:37:47

Validade: 12/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.155.728/0001-53**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet. (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO



Cobertura em galvalume devidamente finalizada.



Vista lateral com cobertura devidamente finalizada.



Cobertura e tesouras devidamente finalizadas.



Cobertura ainda em execução.




Cobertura ainda em execução.



Cobertura em andamento.



Vista lateral da cobertura devidamente executada.

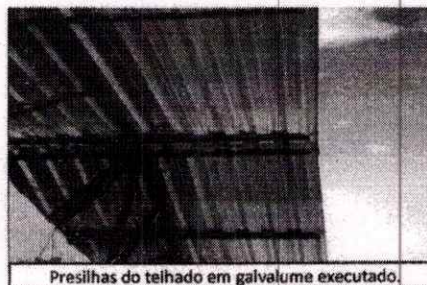

Presilhas do telhado em galvalume executado.

J. J. C. Elias
Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA/AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

Rildo da Silva
A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva
Socio Proprietario



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO



Tesouras da cobertura devidamente executada.



Cobertura com parte da ampliação finalizada.



Vista afastada da escola no comunidade Remanso.



Estrutura telhado com terças e tesouras feitas.



Tesouras da cobertura sendo instaladas.



Tesouras da cobertura in loco.



Solda das tesouras executadas perfeitamente.



Estrutura telhado com terças e tesouras feitas.

J. A. C. L.
Engº Jamilissa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. R.
A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietário



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO



Solda das tesouras sendo executadas.



Execução da fossa e sumidouro.



Execução da fossa e sumidouro.



Execução da fossa e sumidouro.



Execução da fossa e sumidouro.



Execução da fossa e sumidouro.



Execução da fossa e sumidouro.



Fossa e sumidouro devidamente executados.


Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS



A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietario




A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO

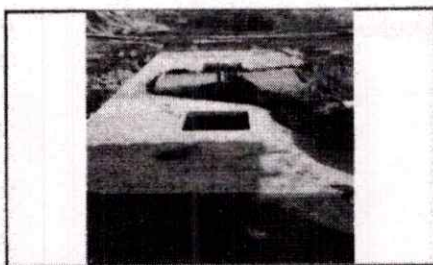


Fossa e sumidouro devidamente executados.

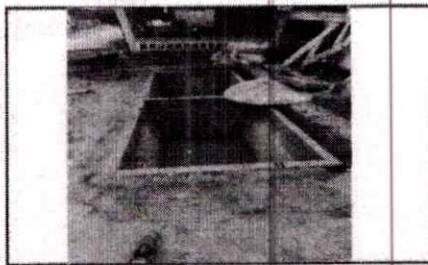


Execução da fossa e sumidouro.

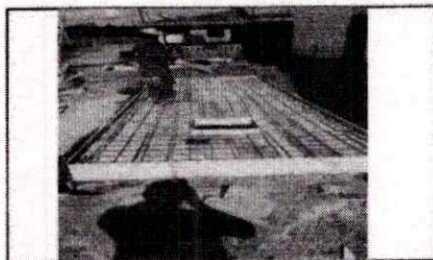


Execução da fossa e sumidouro.

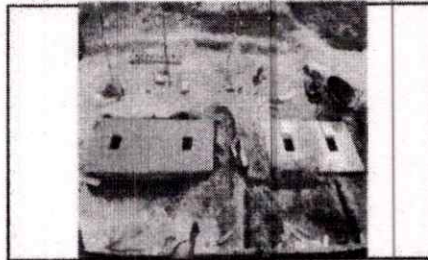

Execução da fossa e sumidouro.



Forro devidamente executado e finalizado.



Forro devidamente executado e finalizado.



Forro sendo finalizado.



Forro em execução.

J. C. L.
Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

R. S. M.
A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Meia
Socio Proprietario




A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO




Forro sendo finalizado.

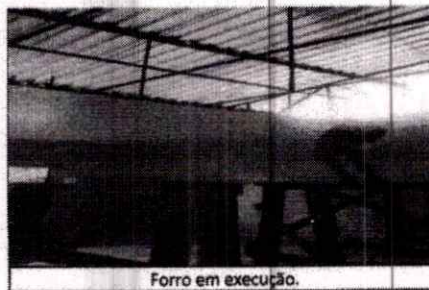

Forro em execução.




Forro em execução.

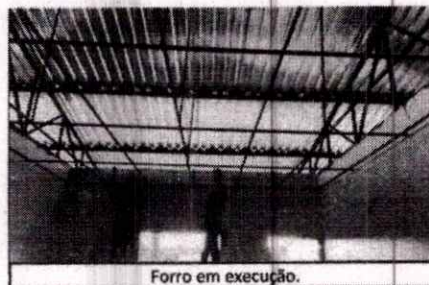

Forro em execução.



Forro em execução.

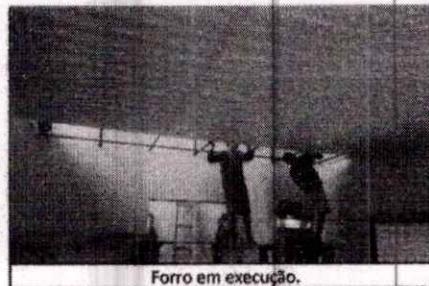

Forro em execução.



Instalações hidráulicas devidamente instaladas.



Tubos de PVC e registro de gaveta instalados

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS


A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Sócio Proprietário



A R CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rua Barreirinha 2383 - Palmares CEP: 69153-030
Parintins - Amazonas

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO REMANSO NO
MUNICÍPIO DE PARINTINS AM


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO




Tubos de PVC e registro de gaveta instalados



Tubos de PVC e registro de gaveta instalados




Tubos de PVC e registro de gaveta instalados



Tubos de PVC devidamente instalados.



Tubos de PVC e registro de gaveta instalados



Tubos de PVC devidamente instalados.



Tubos de PVC devidamente instalados.



Tubos de PVC e registro de gaveta instalados

Engº Jamil Issa Coimbra Elias
CREA AM/PA - 1516885201
ENGENHEIRO CIVIL
SEMOSP / PARINTINS

A. R. CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 30.155.728/0001-53
Rildo da Silva Maia
Socio Proprietario
