



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Parintins-AM, 17 de fevereiro de 2023.

Memorando Nº 108/2023 – SEMOSP/PMP

Da: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ao: Exmo. Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia

M. D. Prefeito Municipal de Parintins

Nesta

CÓPIA

Senhor Prefeito,


AUTORIZO NA FORMA DA LEI
Frank Luiz da Cunha Garcia
Prefeito Municipal de Parintins

Encaminho a Vossa Excelência, Processo oriundo da CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML e TERMO CONTRATO Nº 008-2022-SEMOSP, contendo os anexos listados abaixo da Empresa T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 37.351.686/0001-75, referente à 3ª (terceira) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM, para pagamento.

Anexos:

- ✓ CI Nº 036/2023-SEMOSP/PMP;
- ✓ Nota Fiscal de Serviços Nº 15 no valor de R\$ 29.967,28 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e sete e vinte e oito centavos);
- ✓ Planilha da 3ª (terceira) Medição dos Serviços Executados
- ✓ Recibo de pagamento;
- ✓ Certidões Negativas de Débitos;
- ✓ Relatório fotográfico.
- ✓ Diário de Obras.

Fonte pagadora: 010 – Recursos Próprios

Atenciosamente,


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

SEFIN
RECEBIDO
Data: 23/02/23
Hora: 10h00

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Parintins-Am, 17 de fevereiro de 2023

CÓPIA

C. I. Nº 036/2023-SEMOSP/PMP

ANO: 2022		MÊS DE REFERÊNCIA:		FEVEREIRO	
EMISSOR:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP			
NÚMERO DO PROCESSO: CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML - CARTA CONTRATO Nº 008/2022-SEMOSP					
TIPO DE INSTRUMENTO:		NOTA FISCAL/BOLETO DE RRT/ART		Nº	15
CREDOR:	T F COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
CNPJ/ CPF	37.351.686/0001-75		PIS/NIT		
ENDEREÇO:	Rua Cel. Conrado Niemeyer, 120 - Manaus-AM			FONE:	
OBJETO:	Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.				
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Unid.	Ref. a 3º (terceira) Medição da Ampliação de Prédio Público para Instalação de Centro de Saúde da Comunidade Santa Rita da Valéria, no Município de Parintins-AM.		R\$29.967,28	29.967,28
FICHA Nº		RECURSO:	DADOS BANCÁRIOS:		
			SOMA:		R\$ 29.967,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
010	RECURSOS PRÓPRIOS		
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CARTA CONVITE Nº 008/2022-CML			


Albano Albuquerque
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PARINTINS-AM

At.: Eng^o. Denner Cardoso Brelaz

Engenheiro Fiscal do Contrato.

Ref.: Medição 3 do Contrato 008/2022

A empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob CNPJ **37.351.686/0001-75**, aqui representada por seu Sócio Administrador **SR. FABIANO FONSECA DA SILVA**, inscrito sob CPF **012.275.862-56**, vem através deste solicitar **ANALISE** do processo da **TERCEIRA MEDIÇÃO**, no valor de **R\$29.967,28**, referente a **ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICIPIO DE PARINTINS-AM**.

Aguardando retorno sobre os assuntos tratados,

Parintins – AM, 17 de Fevereiro de 2023

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ 37.351.686/0001-75
FABIANO FONSECA DA SILVA
CPF 012.275.862-56

37.351.686/0001-75
T F COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Coronel Conrado Niemeyer n. 120 Petropolis
CEP 69 063-55

MANAUS

AM

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO CORA - 403

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 1602544-9



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

84F9.2827.6443

Data/Hora da emissão

17/02/2023 - 11:24:41

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

15

Prestador de Serviços

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, 120,
PETRÓPOLIS, Telefone: .

CEP 69063550 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 37.351.686/0001-75

Email JSANTOSNAVEGACAO@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

46672401

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ

11.429.713/0001-91

Endereço

PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

69151-271

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA REFERENTE A MEDIÇÃO 3 CUJO OBJETO É ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM DE ACORDO COM CONTRATO 008.2022 - BASE DE CÁLCULO INSS: R\$29.967,28 X 40% (MÃO DE OBRA)=R\$11.986,91 X 3,5% = R\$419,54 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

29.967,28

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base do Cálculo(R\$)

29.967,28

Alíquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

29.967,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.967,28

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

29.967,28

Outras Informações

- Competência: Fevereiro/2023- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

SEMOESP / PARINTINS - AM


Atesto que os materias foram
entregues serviços
prestados de conformidade com

a Nota de Empenho.

Em: 17,02,2023



Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
3.5	97645	SINAPI	FEIÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	28	30,88	38,46	1.076,60	28,00	1076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.1	96923	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 08/2017	m³	8,54	97,46	108,93	941,15	8,54	941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 08/2017	m³	2,25	114,95	142,13	322,04	2,25	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	m²	5,76	172,48	214,77	1.237,07	5,76	1237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	m²	22,46	87,30	108,70	2.441,40	22,46	2441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.5	92731	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES. AF. 12/2015	KG	84,08	13,08	16,29	1.368,82	84,08	1368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%


Denner Cardoso Breilaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAS DE CONSTRUCÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
4.6	92795	SINAPI	CORTE E DOBRAS DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AE 12/2015	KG	602,31	10,55	10,13	7.208,33	602,31	7908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.7	94902	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TIPO 1:4,5:4,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L - AE 08/2021	m³	0,17	437,66	545,21	92,68	0,17	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TIPO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L - AE 08/2021	m³	9,32	579,86	722,15	6.730,43	9,32	6730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AE 12/2015	m²	9,32	195,94	243,96	2.273,88	9,32	2273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AE 07/2019	m²	157,72	54,87	86,44	10.794,35	157,72	10794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Tonseca da Silva
Fabiano Tonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado; Horta: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com DEI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
5.2	32820	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOIRA INTERIOR EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF - 12/2015	UN	7	2.343,84	2.918,54	20.429,78	7,00	20429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E - 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF - 07/2019	m²	157,72	95,78	119,26	18.899,68	157,72	18899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF - 07/2019	M	9,96	57,29	71,22	709,35	9,96	709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.5	100434	SINAPI	CHAPA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF - 07/2019	M	39,8	79,49	87,77	3.493,24	39,80	3493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5.6	CPU REF SINAPI COD 75220	Proprio	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m²	12,05	53,91	67,12	808,79	12,05	808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5			VERBA C&B					55.572,15	0	29.967,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Fonseca da Silva
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM




ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERIODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
6.1	100329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 2X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	142,32	84,25	104,90	14.829,36	142,32	14829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.2	87678	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	284,64	4,68	5,82	1.656,60	284,64	1656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	284,64	44,68	55,83	15.834,52	284,64	15834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 P	m²	27,39	678,82	845,26	23.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	23151,67	0,00%	100,00%
TOTAL									3.022,53	16487,75	100,00%	16487,75	0,00	0,00		


Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
7.1	CPQZ REF. SINAPI 11/19 COD 72137	Próprio	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	105,63	112,57	140,17	14.808,15	105,63	14.808,15		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
7.2	87267 SINAPI	SINAPI	REVESTIMENTO DE RAMCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	113,79	72,32	90,05	10.246,78	0,00	0,00	113,79	10.246,78	0,00	0,00	100,00%	0,00%
8			FORRO DE PVC, USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	m²	122,08	84,36	104,92	12.808,63	0,00	0,00	122,08	12.808,63	0,00	0,00	100,00%	0,00%
9.1	91338 SINAPI	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMINAR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	32,76	826,21	1.028,79	33.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	33.703,16	0,00%	100,00%
9.2	100702 SINAPI	SINAPI	PORTA DE COBRE DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO, USO INCLÓR, FECHADURA E FOXADOR, SEM ALZAR, AF 12/2019	m²	4,21	451,28	561,93	2.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	2.380,10	0,00%	100,00%

Denner Cardoso Breia
Denner Cardoso Breia
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Fonseca da Silva
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO


OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
9.3	94589 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIV. ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019.	m²	12,4	735,35	915,67	11.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	11354,30	0,00%	100,00%
10								2.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	93145 SINAPI		PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, HESIBENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, BASCO, QUEBRA E CHIMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2018.	UN	24	213,28	265,56	6.373,20	0,00	0,00	24,00	6373,20	0,00	0,00	100,00%	0,00%
10.2	97588 SINAPI		LUMINÁRIA TIPO PLAFONETIM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	11	39,33	48,07	538,67	0,00	0,00	11,00	538,67	0,00	0,00	100,00%	0,00%
10.3	97612 SINAPI		LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	22	25,55	31,81	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	699,82	0,00%	100,00%


Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
10.4	101676	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/220V	UN	1	67,05	83,49	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,49	0,00%	100,00%
11.1	80657	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS PASSOS E CHUBBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014	UN	16	128,24	159,88	2.554,88	16,00	2554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.2	91765	SINAPI	REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. 639070 PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB. COLETOR AÉREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, DE 3000x1500	M	25	63,48	79,04	1.976,00	25,00	1976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM/20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	25	52,53	65,41	1.635,25	25,00	1635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUPLO DE RAMILHO MACIO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPRESSURA DE AÇÚCAR	UN	1	2.308,30	2.875,04	2.875,04	1,00	2875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.5	89552	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 6 CONTRIBUINTES), AF. 12/2021	UN	1	2.778,53	3.459,82	3.459,82	1,00	3459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Fonseca da Silva
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO


OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALEIRIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍXLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERIAS = 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,20 M, AE 12/2020 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	1	418,15	520,68	520,68	1,00	520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.7	66801	SINAPI	INSTALACAO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA GOMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	4	336,24	418,68	1.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1674,72	0,00%	100,00%
11.8	66809	SINAPI	INSTALACAO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E	UN	1	504,58	628,30	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	628,30	0,00%	100,00%

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREAM/AM - 32148

Fabiano Fonseca da Silva
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO 03		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.10	100688	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	376,44	381,57	763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	763,14	0,00%	100,00%
11.11	83442	SINAPI	BANCADA MARMOLEIRO BRANCO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBOITUR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4	1.150,79	1.482,85	5.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5.731,40	0,00%	100,00%
11.12	89708	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	7	13,54	16,86	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	118,02	0,00%	100,00%
11.13	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	2	750,87	972,33	1.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.944,66	0,00%	100,00%
TOTAL									18,02	7,00	0,00	0,00	18,02	7,00		

Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Ronseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALEIRA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 20.10.2022 - 20.11.2022
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 03 (TERCEIRA)
VALOR DA MEDIÇÃO 3: R\$29.967,28
SALDO REMANESCENTE: R\$116.582,73

PLANILHA DE MEDIÇÃO 03																
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 02		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
12.1	89289	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	422,72	2,05	2,55	1.077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	1077,93	0,00%	100,00%
12.2	96153	SINAPI	AF 06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF 05/2017	m²	422,72	22,40	27,89	11.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	11.789,66	0,00%	100,00%
12.3	89483	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 06/2014	m²	422,72	10,92	13,59	5.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	422,72	5744,76	0,00%	100,00%
13.1	CPU 3.0.2	Profoto	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TUBULAÇÃO	CHP	12	473,35	569,41	7.072,92	12,00	7072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
13.2	CPU 115	Profoto	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, 40 CM X 60 CM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1	699,24	870,69	870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	870,69	0,00%	100,00%
Total Geral =>									328.491,28 EXECUTADO =		181.941,23 MEDIÇÃO 03 =		146.550,05 SALDO =>		64,51%	
VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS																

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os _____ materiais _____ foram
entregues _____ de conformidade com
prestados _____
a Nota de Empenho.
Em: 17/02/2023

Fabiano Tonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Denner Cardoso Breiaz
ENGENHEIRO CIVIL



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA

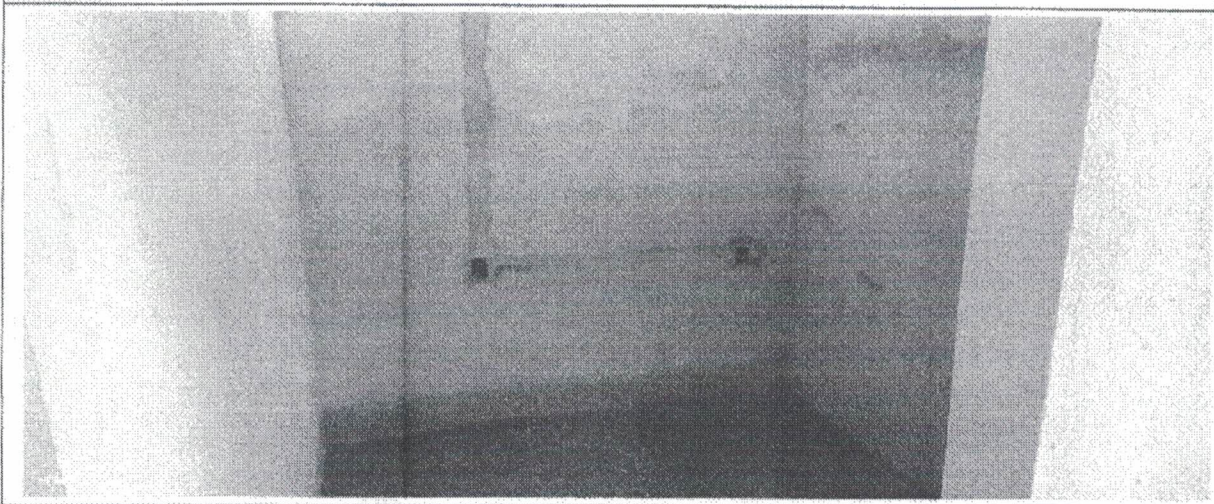

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA

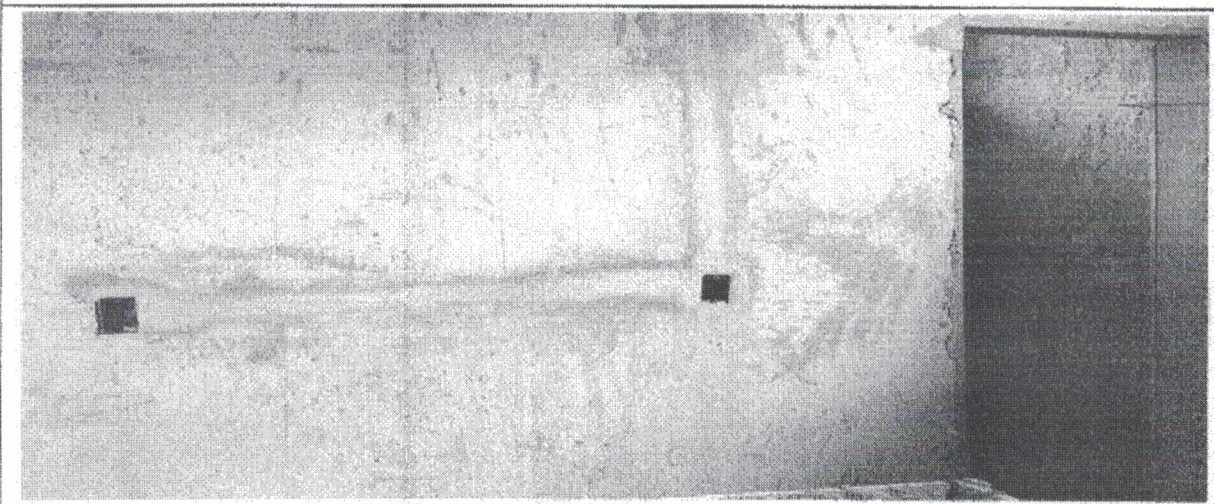

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe Pontes de Sá
Felipe Pontes de Sá
Engenheiro Civil
CREA 21542 DAM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA

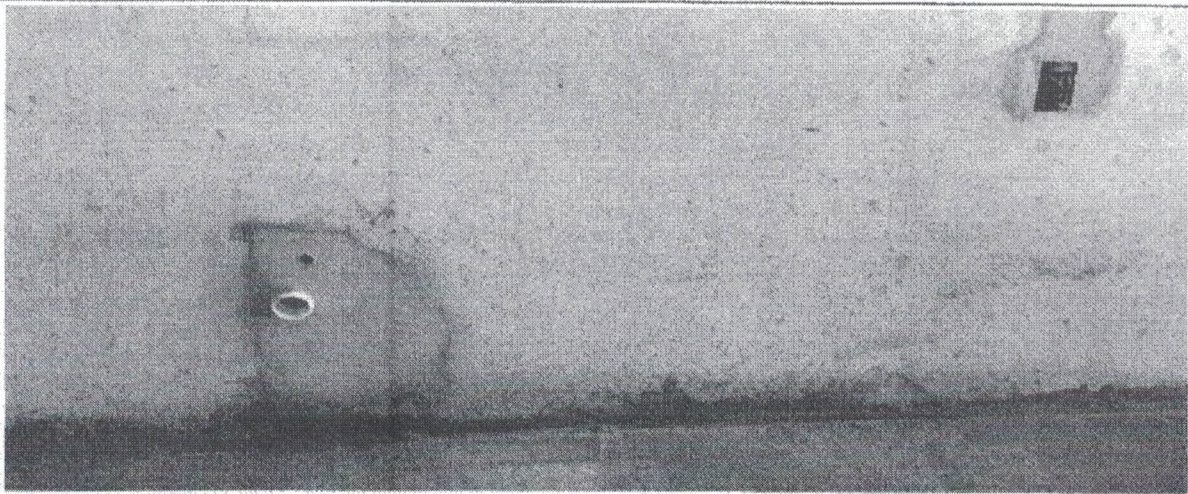

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA

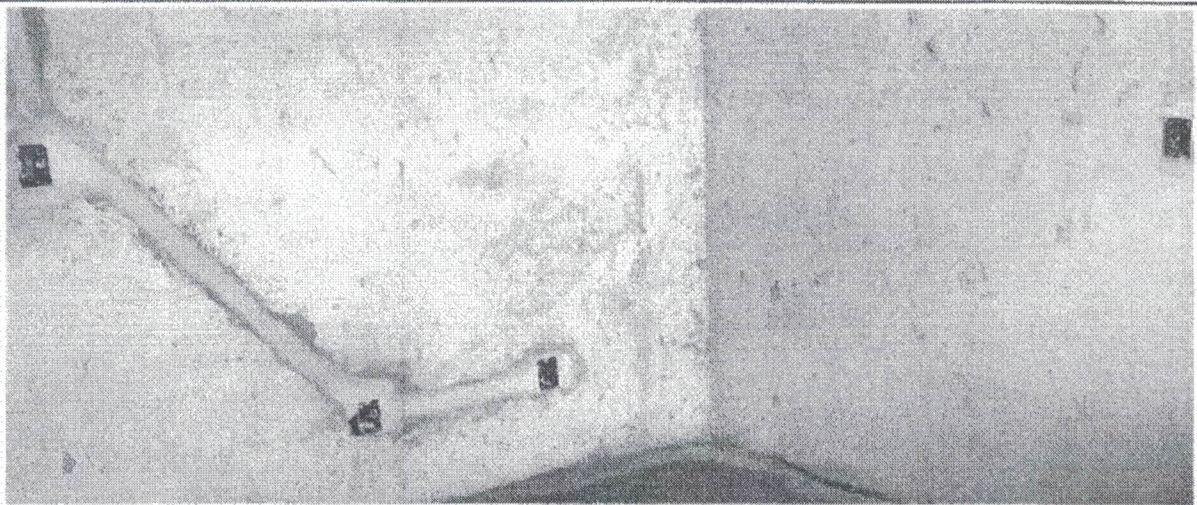

Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano F. Dias
Fabiano F. Dias
Engenheiro Civil
CREA 21642 DIAL



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA

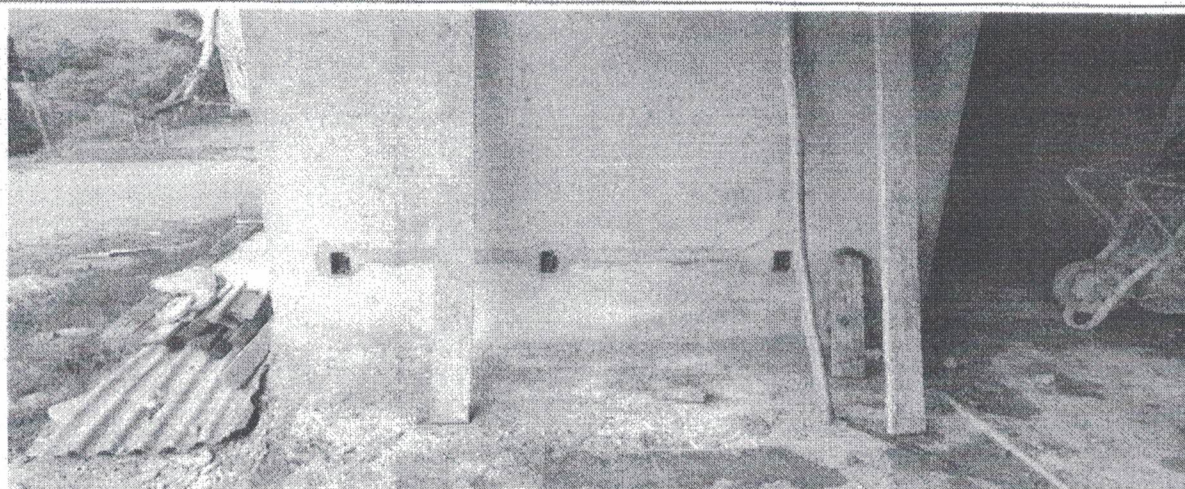

CHUMBAMENTO DAS CAIXINHAS 4X2 DA ELETRICA



Denner Cardoso Brelaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe Roberto de Souza
FELIPE ROBERTO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21642 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

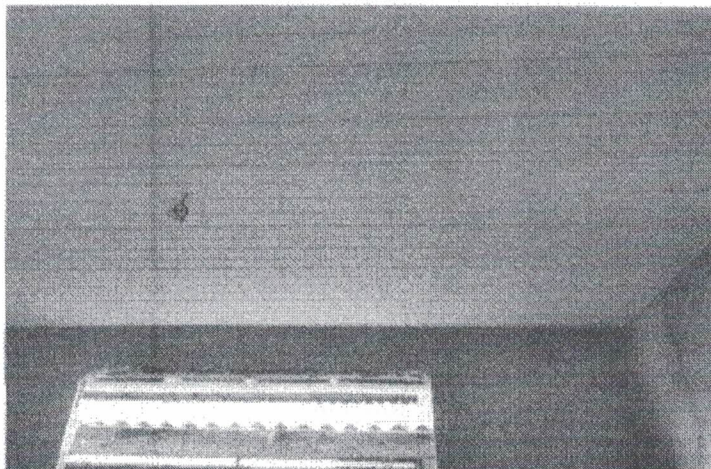

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

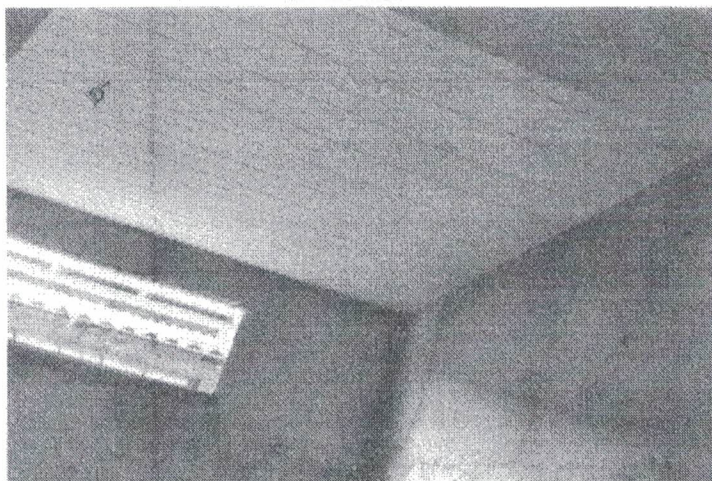

Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe
Felipe Pinheiro da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

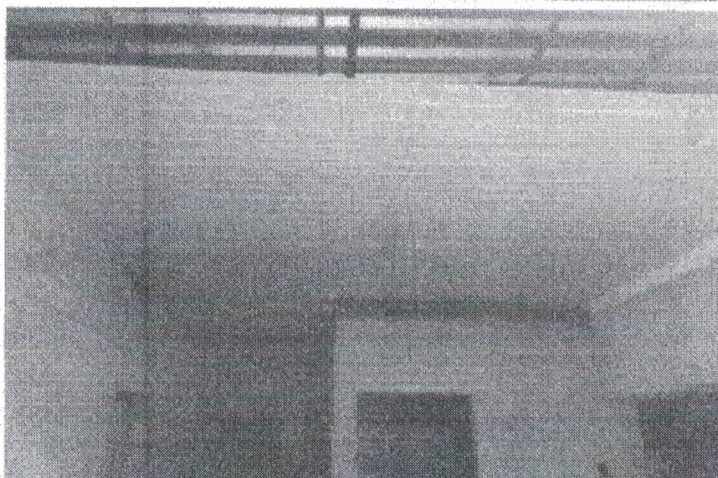

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

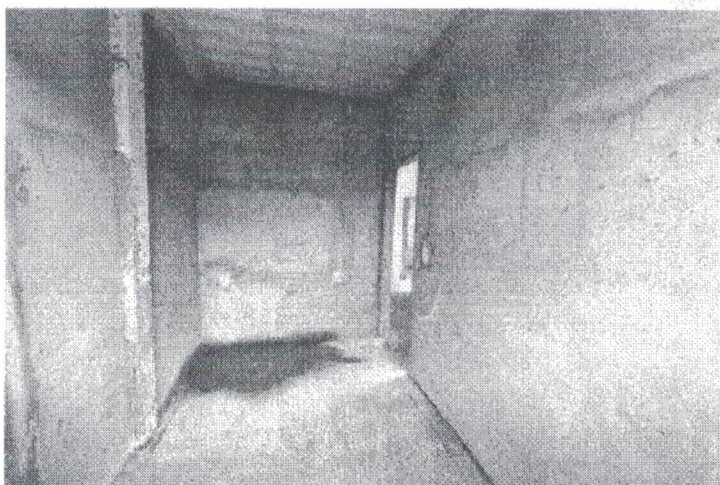

Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano
Fabiano Farias da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21542 DMS



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

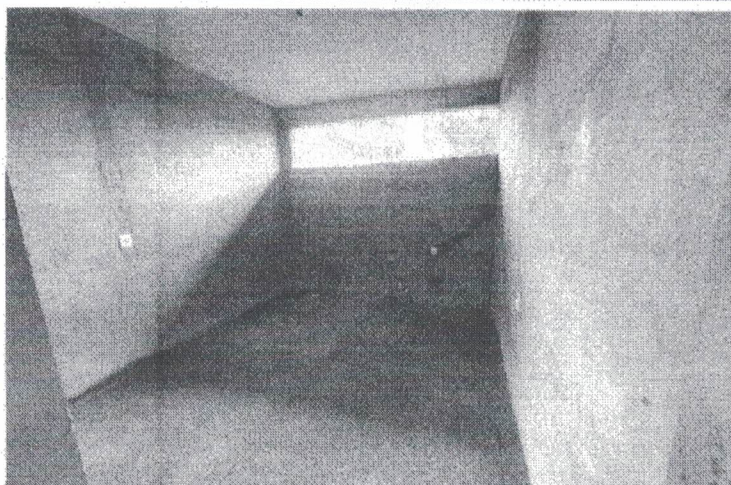

FORRO PVC INSTALADO E COM A ESPERA DE ELETRICA

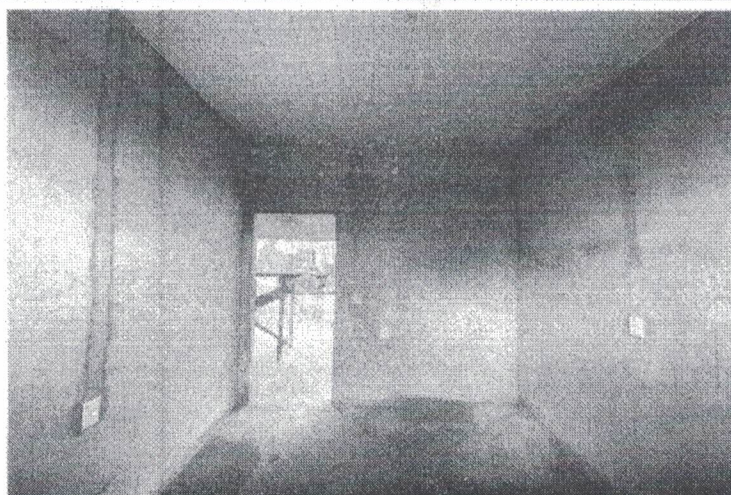

Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiana
Fabiana Pontes da Silva
Engenheira Civil
CREA 21542 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 20/10/2022 - 20/11/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

CERAMICA NOS BANHEIROS INSTALADAS

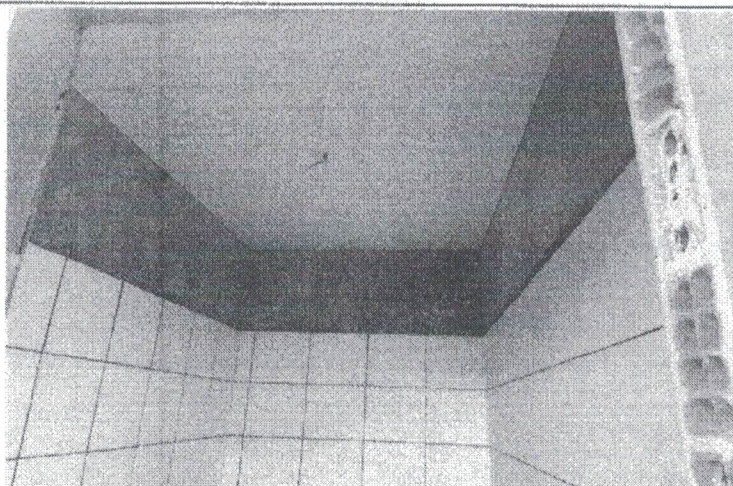

CERAMICA NOS BANHEIROS INSTALADAS

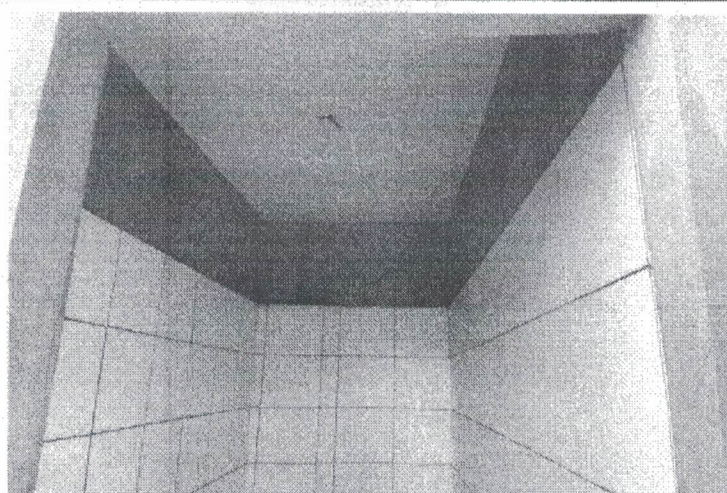

Denner Cardoso Brelaz
DENNER CARDOSO BRELAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano F. de S. Silva
FABIANO F. DE S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 21642 DIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.351.686/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:20 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **1F55.2137.2C6D.A8F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52136416
Data: 03/02/2023
Hora: 10:43:17
Válida até: 05/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - Situação: Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

39718/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: T.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 126, CEP: 69063550
BAIRRO: PETROPOLIS, COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 48672481
CNPJ/CPF: 37951686000175

Declara-se para os devidos fins que, em nome do
sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em
Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

14/02/2023

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HA DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec: 863/2011

VÁLIDA ATÉ 15/05/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO
REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº 39718/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o
QR CODE ou visite o Portal de Informações e
Serviços SEMEF ATENDE
(<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a
chave de validação **C38.758.12D.BAF**. A Certidão
emitida abrange todos os cadastros inscritos no
Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte
acima qualificado.

Cadastrado em: 14/02/2023



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52136416
Data: 03/02/2023
Hora: 10:43:17
Válida até: 05/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - Situação: Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

39718/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 120, CEP: 69063550**
BAIRRO : **PETRÓPOLIS** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **46672401**
CNPJ/CPF : **37351686000175**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

14/02/2023

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/05/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº39718/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **C38.758.12D.BAF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 14/02/2023

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.351.686/0001-75
Razão Social: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER 0120 / PETROPOLIS / MANAUS / AM / 69063-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021201560258206800

Informação obtida em 23/02/2023 12:51:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CARTA CONTRATO 008/2022-SEMOSP

CARTA CONTRATO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, PARA A "AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM", NA FORMA ABAIXO.

Saibam todos quanto o presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (19/05/2022)**, nesta cidade na sede da Prefeitura - situada na Praça Eduardo Ribeiro, 2042, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 - Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins - Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 - SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53, e de outro a empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, os quais tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo nº 008/2022-CML**, **Carta Convite Nº 008/2022-CML**, firmam, a presente **CARTA CONTRATO**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendida as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta **CARTA CONTRATO** tem por Objetivo a "**AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM**", com o prazo de execução de **60 (sessenta) dias** contados a partir da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O prazo de vigência contratual será de **90 (noventa) dias**, contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Rua Jonathas Pedrosa - Centro - CEP: 69151-530
e-mail: licitopin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. - 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

3.1 - O valor global da presente CARTA CONTRATO é R\$ 328.491,26 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavo), a ser empenhado no exercício vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - O regime de execução será efetuado obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis após apresentação da respectiva Nota Fiscal, em duas vias, devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a adotar todas as medidas acautelatórias necessárias para evitar danos a terceiros, em razão da execução dos serviços ajustados, sendo sua exclusiva responsabilidade eventuais danos por atos comissivos ou omissos.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - A despesa decorrente desta CARTA CONTRATO correrá à conta da seguinte dotação do orçamento do CONTRATANTE:

- Unidade Orçamentária: 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- Programa de Trabalho: 10.302.0052.1025.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município;
- Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações;
- Fonte de Recurso: 010 - Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 com as consequências, conforme o caso, elencadas nos arts. 86 e 87, tudo da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA e seu representante legal apresentarem neste ato os documentos comprobatórios das condições jurídicas – pessoais relativos à empresa.

Rua Jonas Pedrosa - Centro - CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. - 04.329.736/0005 - 69



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

contratada e a seu representante, indispensáveis à lavratura deste Termo, inclusive quitações de impostos municipais e Certificados de Regularidade da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO DO TERMO


10.1 - A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas a publicação, da presente CARTA CONTRATO, no prazo de lei, no quadro de Aviso Legal da Prefeitura Municipal.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FÔRO

11.1 - Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas de execução do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Parintins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por estarem acordados, firmam a presente CARTA CONTRATO em 2 (duas) vias de igual teor e valor probante, as quais vão assinadas pelas partes contratadas.

Parintins (AM), 19 de maio de 2022.


FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins
CONTRATANTE


T.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 37.351.686/0001-75
CONTRATADA

Rua Jonathas Pedrosa - Centro - CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins - AM
C.N.P.J. - 04.329.736/0005 - 89





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220321798

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABIANO FONSECA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0412960936

Registro: 0412960936AM

Empresa contratada: **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Registro: 0040489712-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

Nº: **2052**

CEP: **69151271**

Contrato: **008/2022**

Celebrado em: **19/05/2022**

Valor: **R\$ 328.491,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA DA VALÉRIA

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Data de início: **19/05/2022**

Previsão de término: **18/07/2022**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **AM**

Nº: **SN**

CEP: **69151271**

Coordenadas Geográficas: **-2.629841, 66.722253**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

Quantidade

136,88

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 012.275.862-56

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - CNPJ: 04.329.736/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **17/06/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8304790889**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 6Z162
Impresso em: 18/09/2022 às 10:06:36 por: ip: 131.255.10.227

www.crea-am.org.br

faleconosco@crea-am.org.br

Tel: (92) 2125-7120

Fax: (92) 2125-7122

