



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.maneus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

99C5.9297.FBA8

Data/Hora da emissão

20/03/2023 - 11:46:03

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

17

Prestador de Serviços



T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, 120,
PETRÓPOLIS, Telefone: .

CEP 69063550 - MANAUS - - BRASIL

CPF/CNPJ 37.351.686/0001-75

Email JSANTOSNAVEGACAO@GMAIL.COM

Inscrição Municipal

46672401

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ

11.429.713/0001-91

Endereço

PC EDUARDO RIBEIRO, 2052,

Bairro

CENTRO, Telefone: .

Cep

69151-271

Cidade

PARINTINS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

NOTA REFERENTE A MEDIÇÃO 4 CUJO OBJETO É ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM DE ACORDO COM CONTRATO 008.2022 - BASE DE CÁLCULO INSS: R\$61.210,32 X 40% (MÃO DE OBRA)=R\$24.484,13 X 3,5% = R\$856,94 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)

61.210,32

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

61.210,32

Aliquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

61.210,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 61.210,32

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções(R\$)

0,00

Valor Liquido da Nota(R\$)

61.210,32

Outras Informações

- Competência: Março/2023- Serviço Tributado no Município: PARINTINS - AM- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço

SEMOSP / PARINTINS - AM

Atesto que os materias foram
entregues serviços

prestados de conformidade com

a Nota de Empenho.

Em: 20/03/2023



Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PARINTINS-AM

At.: Engº. Denner Cardoso Brelaz

Engenheiro Fiscal do Contrato.

Ref.: Medição 4 do Contrato 008/2022

A empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita sob **CNPJ 37.351.686/0001-75**, aqui representada por seu Sócio Administrador **SR. FABIANO FONSECA DA SILVA**, inscrito sob **CPF 012.275.862-56**, vem através deste solicitar **ANALISE** do processo da **QUARTA MEDIÇÃO**, no valor de **R\$61.210.32**, referente a **ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, MUNICIPIO DE PARINTINS-AM**.

Aguardando retorno sobre os assuntos tratados,

Parintins – AM, 20 de Março de 2023

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
CNPJ 37.351.686/0001-75
FABIANO FONSECA DA SILVA
CPF 012.275.862-56

37.351.686/0001-75
T F COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Coronel Conrado Niemeyer n 120 Petropolis
CEP 69 063-550

MANAUS

AM

DADOS BANCARIOS:

BANCO: BANCO CORA - 403

AGENCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 1602544-9



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
1															
1.1	100319	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	16.590,89	20.658,97	0,75	31550,82	0,10	2065,89	0,15	3098,84	85,00%	15,00%
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.650,08	10.771,07	1,50	16156,60	0,25	2692,76	0,25	2692,76	87,50%	12,50%
2															
2.1	CPU - 01	Próprio	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	316,21	383,74	0,00	0,00	6,00	2382,44	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3															
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÕES DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m³	28,87	50,47	62,84	28,87	1814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.2	97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	6	141,96	176,76	6,00	1060,56		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	145	3,31	4,12	145,00	597,40		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	5,88	8,12	10,11	5,88	59,44		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
3.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	28	30,88	38,45	1.076,60	28,00	1076,60		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4			ESTRUTURA DA LAJE CAIXA D'ÁGUA AF 12/2017					23.315,81		23315,81		0,00		0,00		
4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	m³	8,64	87,48	108,93	941,15	8,64	941,15		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	m³	2,25	114,95	143,13	322,04	2,25	322,04		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	5,76	172,48	214,77	1.237,07	5,76	1237,07		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.4	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	m²	22,46	87,30	108,70	2.441,40	22,46	2441,40		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.5	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	84,08	13,08	16,28	1.368,82	84,08	1368,82		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
4.6	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	602,31	10,55	13,13	7.908,33	602,31	7908,33		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.7	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,17	437,85	545,21	92,68	0,17	92,68		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,32	579,95	722,15	6.730,43	9,32	6730,43		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,32	195,94	243,98	2.273,89	9,32	2273,89		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
5			SUBTOTAL					85.043,19	01	85043,19		0,00	0,00	0,00		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,72	54,97	68,44	10.794,35	157,72	10794,35		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04	
								QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL
5.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	7	2.343,84	2.918,54	7,00	20429,78	0,00	0,00
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	157,72	95,78	119,26	157,72	18809,68	0,00	0,00
5.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	9,96	57,20	71,22	9,96	709,35	0,00	0,00
5.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,8	70,49	87,77	39,80	3493,24	0,00	0,00
5.6	CPU REF SINAPI COD 75220	Próprio	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m²	12,05	53,91	67,12	12,05	808,79	0,00	0,00
6			VEDAÇÃO					0,00	32420,46	0,00	23161,67

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	142,32	84,25	104,90	14.929,36	142,32	14929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	284,64	4,68	5,82	1.656,60	284,64	1656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	284,64	44,68	55,63	15.834,52	284,64	15834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
6.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	27,39	678,82	845,26	23.151,67	0,00	0,00	27,39	23151,67	0,00	0,00	0,00%	100,00%
7	PISOS E REVESTIMENTOS								25.052,93	0	25052,93	0,00	0,00	0,00		

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
7.1	CPU2 REF SINAPI-11/19 COD 72137	Próprio	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	105,63	112,57	140,17	14.806,15	105,63	14806,15		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
7.2	87267 SINAPI	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	113,79	72,32	90,05	10.246,78	113,79	10246,78		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
8								12.808,63	0	0,00		0,00		0,00		
8.1	96486 SINAPI	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 - P	m²	122,08	84,26	104,92	12.808,63	122,08	12808,63		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
9			ESQUADRIAS					47.417,64	0	0,00		38363,28		11354,30		
9.1	91338 SINAPI	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	32,76	826,21	1.028,79	33.703,16	0,00	0,00	32,76	33703,16	0,00	0,00	100,00%	0,00%
9.2	100702 SINAPI	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,2	451,28	561,93	2.360,10	0,00	0,00	4,20	2360,10	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
9.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	12,4	735,36	915,67	11.354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	11354,30	0,00%	100,00%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.885,18	0,00	6311,87		0,00		783,31		
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	24	213,26	265,55	6.373,20	24,00	6373,20		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
10.2	97569	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	11	39,33	48,97	538,67	11,00	538,67		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
10.3	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	22	25,55	31,81	699,82	0,00	0,00		0,00	22,00	699,82	0,00%	100,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
10.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	67,05	83,49	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	83,49	0,00%	100,00%
11			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					25.882,11	0	13021,67		5138,38		7876,05		
11.1	89857	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16	128,24	159,68	2.554,88	16,00	2554,88		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	63,48	79,04	1.976,00	25,00	1976,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	52,53	65,41	1.635,25	25,00	1635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	2.308,90	2.875,04	2.875,04	1,00	2875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	2.778,53	3.459,82	3.459,82	1,00	3459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



**ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04																
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AE 12/2020	UN	1	418,15	520,68	520,68	1,00	520,68		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.7	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 01/2020	UN	4	336,24	418,68	1.674,72	0,00	0,00	4,00	1674,72	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.8	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 01/2020	UN	5	317,09	394,84	1.974,20	0,00	0,00	5,00	1974,20	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.9	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE 01/2020	UN	1	504,58	628,30	628,30	0,00	0,00	1,00	628,30	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22% Mensalista: 46,59%
NÚMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		EXECUTADO (%)	A EXECUTAR (%)
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL		
11.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	308,44	381,57	763,14	0,00	0,00	2,00	763,14	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.11	93442	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.150,70	1.432,85	5.731,40	0,00	0,00		0,00	4,00	5731,40	0,00%	100,00%
11.12	88709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	13,54	16,86	118,02	0,00	0,00	7,00	118,02	0,00	0,00	100,00%	0,00%
11.13	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	780,87	972,33	1.944,66	0,00	0,00		0,00	2,00	1944,66	0,00%	100,00%
12			POSTURA					18.812,35	0	0,00		12867,89		5744,78		

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO DA OBRA: COMUNIDADE RURAL SANTA RITA DO VALERIA, PARINTINS-AM
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023
ART EXECUÇÃO: AM20220321798

BANCOS: SINAPI - 12/2021 - Amazonas
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado: Horista: 83,22%Mensalista: 46,59%
NUMERO MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)
VALOR DA MEDIÇÃO 4: R\$61.210,32
SALDO REMANESCENTE: R\$55.372,39

PLANILHA DE MEDIÇÃO 04															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	EXECUTADO		MEDIÇÃO 04		SALDO A EXECUTAR		
									QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	QUANTIDADE	TOTAL	
12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	422,72	2,05	2,55	1.077,93	0,00	0,00	422,72	1077,93	0,00	0,00	
12.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	422,72	22,40	27,89	11.789,66	0,00	0,00	422,72	11789,66	0,00	0,00	
12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	422,72	10,92	13,59	5.744,76	0,00	0,00	422,72	0,00	422,72	5744,76	
13			DIVERSOS					7.343,81	0	7072,92		0,00		870,89	
13.1	CPU 3.9.2	Próprio	TRANSPORTE FLUVIAL EM EMBARCAÇÃO CAP 12 TON, 114 HP - COM TRIPULAÇÃO	CHP	12	473,35	589,41	7.072,92	12,00	7072,92		0,00	0,00	0,00	
13.2	CPU 115	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 60" CM, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1	699,24	870,69	870,69	0,00	0,00		0,00	1,00	870,69	
Total Geral =>								328.491,26	EXECUTADO =>		211.908,51	MEDIÇÃO 04 =>		61.210,32	SALDO =>
								EXECUTADO (%)				EXECUTADO (%)			
								A EXECUTAR (%)				A EXECUTAR (%)			
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%				100,00%		0,00%	
								100,00%							

SEMOSP / PARINTINS - AM
Atesto que os materiais foram serviços prestados de conformidade com a Nota de Empenho.
Em: 20.03.2023

Fabiano
Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Denner
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

MATERIAIS CHEGARAM PARA FINALIZAR A OBRA



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO

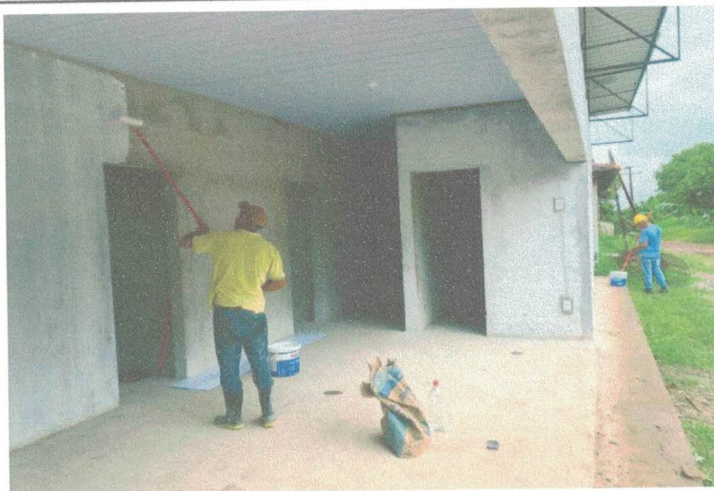

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Pereira da Silva
Fabiano Pereira da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriana
Fátima Fátima de Jesus
Engenheira Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Pontes de Sá
Fabiano Pontes de Sá
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Pontes de Sá
Fabiano Pontes de Sá
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO

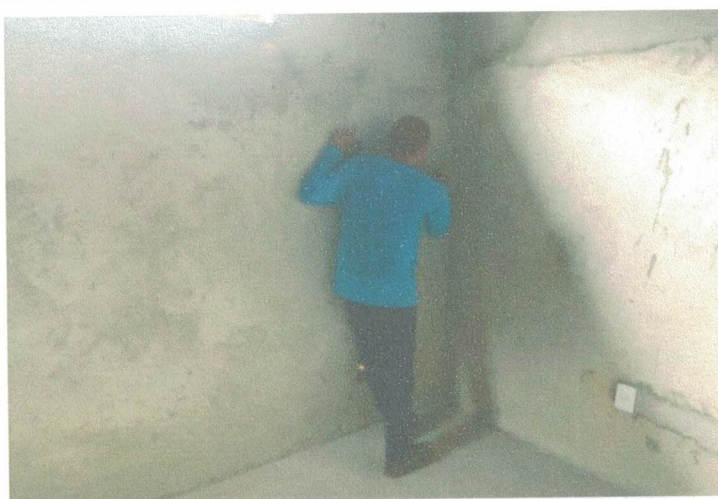

Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriana
Fátima Fátima de Souza
Engenheira Civil
CREA 21642 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriano
Fátima Fátima de Souza
Engenheira Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe F. Soares da Silva
Felipe F. Soares da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO

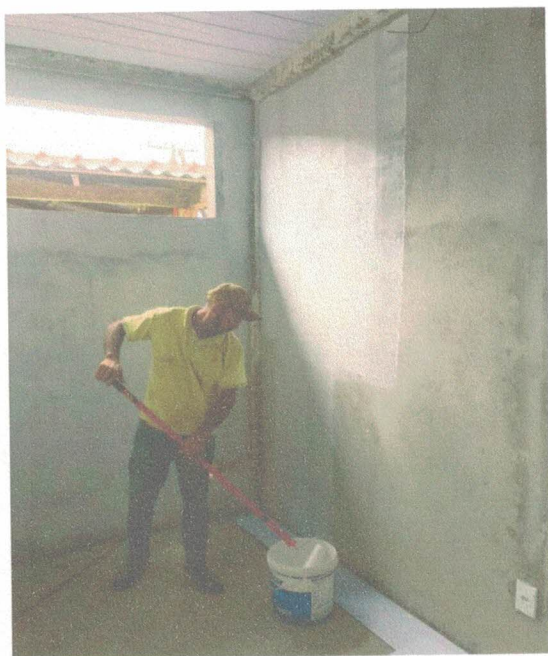

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe F. dos Santos
Felipe F. dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriano
Fábio Pontes de Sá
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiana Pontes de Sá
Fabiana Pontes de Sá
Engenheira Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO PARA POSTERIOR EMASSAMENTO



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Felipe Farias de Souza
Felipe Farias de Souza
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA



APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA



Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Fabiano Farias da Silva
Fabiano Farias da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas


PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTAS



INSTALAÇÃO DE PORTAS

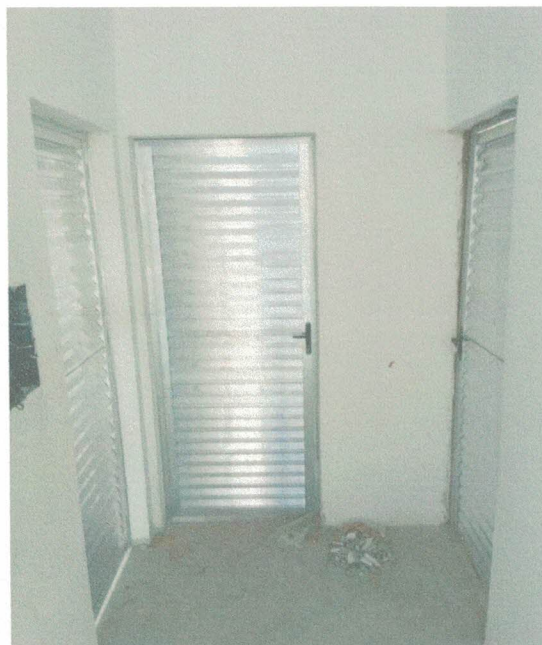

Denner Cardoso Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriano
Fábio de Fátima de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTAS



INSTALAÇÃO DE PORTAS



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriana
Fátima Fátima de Sá
Engenheira Civil
CREA 21642 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTAS



INSTALAÇÃO DE PORTAS




Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Fabiano Pereira de Souza
Engenheiro Civil
CREA 21542 D/AM



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

INSTALAÇÃO DE PORTAS

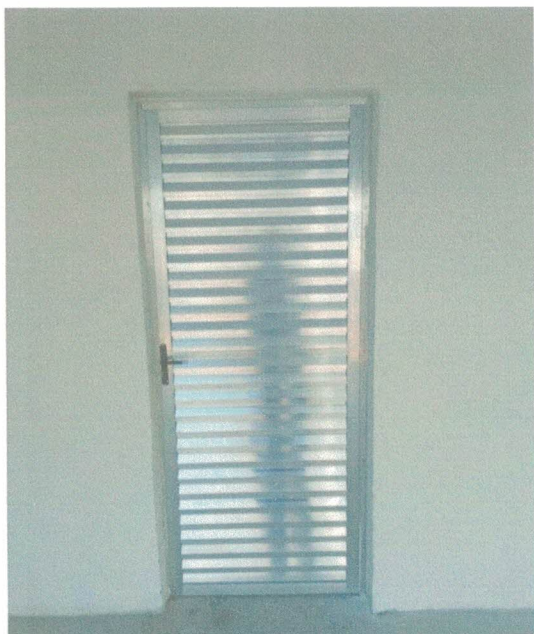

INSTALAÇÃO DE PORTAS



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148

Adriana
Fátima Fátima de Souza
Engenheira Civil
CREA 21542 DIAU



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 12/2021 - Amazonas

PERÍODO MEDIÇÃO: 21.11.2022 - 20.03.2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO

VISTA INTERNA DA OBRA COM OAS PORTAS INSTALADAS



Denner Brelaz
Denner Cardoso Brelaz
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/AM - 32148


Adriano
Fábio de Fátima de Sá
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	21/11/2022	187
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		187	Prazo Restante:	83	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/11/2022	188
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	188	Prazo Restante:	82		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/11/2022	189
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		189	Prazo Restante:	81	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6
				Data:	Pág.
				24/11/2022	190
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		190	Prazo Restante:	80	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MANEJO DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	25/11/2022	191
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	191	Prazo Restante:	79		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/11/2022	192
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		192	Prazo Restante:	78	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	27/11/2022	193
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		193	Prazo Restante:	77	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	28/11/2022	194
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	194	Prazo Restante:	76		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E NORMATIZAÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	29/11/2022	195
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	195	Prazo Restante:	75		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E ARQUITETURA		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	30/11/2022	196
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	196	Prazo Restante:	74		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	01/12/2022	197
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		197	Prazo Restante:	73	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	02/12/2022	198
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	198	Prazo Restante:	72		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:		Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	03/12/2022	199
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	199	Prazo Restante:	71		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	04/12/2022	200
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		200	Prazo Restante:	70	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	05/12/2022	201	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		201	Prazo Restante:	69		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	06/12/2022	202
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		202	Prazo Restante:	68	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	07/12/2022	203
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		203	Prazo Restante:	67	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	08/12/2022	204
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		204	Prazo Restante:	66	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	09/12/2022	205
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		205	Prazo Restante:	65	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	10/12/2022	206
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		206	Prazo Restante:	64	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	11/12/2022	207
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		207	Prazo Restante:	63	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	12/12/2022	208
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		208	Prazo Restante:		62	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM						

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	13/12/2022 209	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		209	Prazo Restante:	61		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
Resp. Técnico		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6	14/12/2022	210	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		210	Prazo Restante:	60		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	15/12/2022	211
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		211	Prazo Restante:	59	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

TF ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	16/12/2022	212
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		212	Prazo Restante:	58	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	17/12/2022	213
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		213	Prazo Restante:	57	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	18/12/2022	214
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		214	Prazo Restante:	56	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.										
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA		041295093-6		19/12/2022		215				
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE														
Prazo Decorrido:		215		Prazo Restante:		55								
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00												
Prazo da Obra		270												
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02					MAQUINA SOLDA - 02								
	BANCADA SERRA - 01					GERADOR 6.5 KVA - 01								
	SERRA MARMORE -01					BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02								
	FURADEIRA - 01					NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01								
Pessoal	Descrição					Quant.		Descrição					Quant.	
	Engenheiro							Assistente Engenharia						
	Mestre de Obras/ Encarregado							Bombeiro						
	Carpinteiro							Eletricista						
	Pedreiro					1		Pintor						
	Armador							Serralheiro						
	Servente					1		Vigia						
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO													
Anotação da Fiscalização														
Visto Engº Contratada:						Visto Fiscalização:								
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM														

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/12/2022 216
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		216	Prazo Restante:	54	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	21/12/2022	217
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		217	Prazo Restante:	53	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/12/2022	218
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		218	Prazo Restante:	52	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	ACABAMENTO INTERNO DA HIDRAULICA, ESGOTO, FORRO E REBOCO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/12/2022	219
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		219	Prazo Restante:	51	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente			Vigia	
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	24/12/2022	220
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		220	Prazo Restante:	50	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	25/12/2022	221
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		221	Prazo Restante:	49	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/12/2022	
		222				
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		222	Prazo Restante:		48	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente			Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	27/12/2022	223
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		223	Prazo Restante:	47	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	28/12/2022	224
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		224	Prazo Restante:	46	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E PATRIMÔNIO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	29/12/2022	225
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		225	Prazo Restante:	45	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6	
				Data:	Pág.	
				30/12/2022	226	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		226	Prazo Restante:		44	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente			Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	31/12/2022 227
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		227	Prazo Restante:		43
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	01/01/2023 228	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		228	Prazo Restante:		42	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente			Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	02/01/2023	229
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		229	Prazo Restante:	41	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	03/01/2023 230
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		230	Prazo Restante:		40
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	04/01/2023	231
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		231	Prazo Restante:	39	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	05/01/2023	232
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		232	Prazo Restante:		38	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Serralheiro		
	Servente			Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	06/01/2023	233
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		233	Prazo Restante:	37	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	07/01/2023 234
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		234	Prazo Restante:		36
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente			Vigia	
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	08/01/2023	235
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		235	Prazo Restante:	35	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente			Vigia	
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
				09/01/2023	236
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		236		Prazo Restante:	34
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro			Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente			Vigia	
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
Resp. Técnico		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
		Fabiano Fonseca da Silva		10/01/2023	237
		CREA	041295093-6		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		237	Prazo Restante:	33	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Serralheiro		
	Servente		Vigia		
Serviços Executados	RECESSO FINAL DE ANO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

ENGENHARIA E
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

11/01/2023

238

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

238

Prazo Restante:

32

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

270

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Assistente Engenharia

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Serralheiro

Vigia

Serviços Executados

RECESSO FINAL DE ANO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Visto Fiscalização:

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	12/01/2023	239
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		239	Prazo Restante:		31	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		1
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	13/01/2023	240
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		240	Prazo Restante:	30	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	14/01/2023	241
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		241	Prazo Restante:	29	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	15/01/2023	242
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		242	Prazo Restante:	28	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

16/01/2023

243

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

243

Prazo Restante:

27

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

270

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Assistente Engenharia

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Serralheiro

Vigia

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO

LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 DAM

Visto Fiscalização:

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	17/01/2023	244
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		244	Prazo Restante:	26	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

18/01/2023

245

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

245

Prazo Restante:

25

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

270

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

MAQUINA SOLDA - 02

BANCADA SERRA - 01

GERADOR 6.5 KVA - 01

SERRA MARMORE - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

FURADEIRA - 01

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Assistente Engenharia

Mestre de Obras/ Encarregado

Bombeiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

1

Armador

Serralheiro

Servente

1

Vigia

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO

LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Visto Fiscalização:

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	19/01/2023	246
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		246	Prazo Restante:	24	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/01/2023	247
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:	247	Prazo Restante:	23		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	21/01/2023	248
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		248	Prazo Restante:	22	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/01/2023	249
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		249	Prazo Restante:	21	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/01/2023	250
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		250	Prazo Restante:	20	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	24/01/2023	251
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		251	Prazo Restante:	19	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

ENGENHARIA E
HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

25/01/2023

252

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

252

Prazo Restante:

18

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

270

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

MAQUINA SOLDA - 02

BANCADA SERRA - 01

GERADOR 6.5 KVA - 01

SERRA MARMORE -01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

FURADEIRA - 01

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Assistente Engenharia

Mestre de Obras/ Encarregado

Bombeiro

Carpinteiro

Eletricista

Pedreiro

1

Pintor

1

Armador

Serralheiro

Servente

1

Vigia

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO

LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Visto Fiscalização:

 ENGENHARIA E TRABALHO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/01/2023	253
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		253	Prazo Restante:	17	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	27/01/2023	254	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		254	Prazo Restante:	16		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		1
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	28/01/2023	255
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		255	Prazo Restante:	15	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	29/01/2023
					256
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		256	Prazo Restante:	14	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	30/01/2023	257
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		257	Prazo Restante:	13	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	31/01/2023
258					
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		258	Prazo Restante:		12
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	01/02/2023	259
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		259	Prazo Restante:	11	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	02/02/2023 260
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		260	Prazo Restante:	10	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

ENGENHARIA E PATRIMÔNIO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	03/02/2023	261
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		261	Prazo Restante:		9	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		1
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	04/02/2023	262
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		262	Prazo Restante:	8	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.		
05/02/2023		263				
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA 041295093-6		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		263		Prazo Restante:		
		7				
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		270				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro				Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro	
	Carpinteiro				Eletricista	
	Pedreiro		1		Pintor	
	Armador				Serralheiro	
Servente		1		Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	06/02/2023	264
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		264	Prazo Restante:	6	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

TF ENGENHARIA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	07/02/2023	265
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		265	Prazo Restante:	5	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	08/02/2023	266
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		266	Prazo Restante:	4	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	09/02/2023 267
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		267	Prazo Restante:	3	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	10/02/2023	268
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		268	Prazo Restante:	2	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	11/02/2023	269
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		269	Prazo Restante:	1	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		270			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
Resp. Técnico		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6	12/02/2023	270
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		270	Prazo Restante:	90	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

13/02/2023

271

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

271

Prazo Restante:

89

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

360

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Assistente Engenharia

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Serralheiro

Vigia

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO

LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:


Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Visto Fiscalização:

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	14/02/2023	272	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		272	Prazo Restante:	88		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		1
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
	Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

ENCENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DIÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM

Data:

Pág.

Resp. Técnico

Fabiano Fonseca da Silva

CREA

041295093-6

15/02/2023

273

Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

Prazo Decorrido:

273

Prazo Restante:

87

Horário de Trabalho:

07:00 - 17:00

Prazo da Obra

360

Equipam.

BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02

BANCADA SERRA - 01

SERRA MARMORE -01

FURADEIRA - 01

MAQUINA SOLDA - 02

GERADOR 6.5 KVA - 01

BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02

NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01

Pessoal

Descrição

Quant.

Descrição

Quant.

Engenheiro

Mestre de Obras/ Encarregado

Carpinteiro

Pedreiro

Armador

Servente

Assistente Engenharia

Bombeiro

Eletricista

Pintor

Serralheiro

Vigia

Serviços Executados

SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO


LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO

Anotação da Fiscalização

Visto Engº Contratada:

Fabiano Fonseca da Silva
Engenheiro Civil
CREA 21642 D/AM

Visto Fiscalização:

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	16/02/2023	274
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		274	Prazo Restante:	86	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENCENHARIA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	17/02/2023	275
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		275	Prazo Restante:	85	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	18/02/2023	276
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		276	Prazo Restante:		84	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		1
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	19/02/2023	277
Obra :	ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE				
Prazo Decorrido:	277	Prazo Restante:	83		
Horário de Trabalho:	07:00 - 17:00				
Prazo da Obra	360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	1	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	LIXAMENTO DA ALVENARIA PARA POSTERIOR APLICACAO DE SELADOR ACRILICO				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

TF ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/02/2023	278
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		278	Prazo Restante:	82	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDADA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					


 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA	041295093-6	
				Data:	21/02/2023	
				Pág.	279	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		279		Prazo Restante:	81	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDADA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	22/02/2023	280
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		280	Prazo Restante:		80	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	23/02/2023	281
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		281	Prazo Restante:		79	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

TF ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	24/02/2023 282
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		282	Prazo Restante:	78	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	25/02/2023	283
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		283	Prazo Restante:	77	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	26/02/2023	284
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		284	Prazo Restante:	76	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.		
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva		CREA 041295093-6		
		27/02/2023		285		
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		285		Prazo Restante:		
		75				
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.		Descrição	
	Engenheiro				Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro	
	Carpinteiro				Eletricista	
	Pedreiro		1		Pintor	
	Armador				Serralheiro	
	Servente		1		Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	28/02/2023	286
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		286	Prazo Restante:	74	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

TF ENGENHARIA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	01/03/2023287
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		287	Prazo Restante:	73	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

TF ENGENHARIA E MANEJO DE OBRAS		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	02/03/2023	288
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		288	Prazo Restante:	72	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	03/03/2023	289
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		289	Prazo Restante:		71	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02			MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01			GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01			BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01			NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	04/03/2023	290	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		290	Prazo Restante:	70		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	05/03/2023	291
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		291	Prazo Restante:	69	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	06/03/2023	292
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		292	Prazo Restante:	68	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	07/03/2023	293
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		293	Prazo Restante:	67	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

TF ENGENHARIA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	08/03/2023294	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		294	Prazo Restante:	66		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	09/03/2023	295	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		295	Prazo Restante:	65		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

 ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	10/03/2023	296
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		296	Prazo Restante:	64	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE REBOCO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

 ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	11/03/2023	297	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		297	Prazo Restante:	63		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM						

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	12/03/2023 298
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		298	Prazo Restante:	62	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor		3
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

TF ENCENHARIA E PEREIRO DE COBRANÇA		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	13/03/2023	299
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		299	Prazo Restante:	61	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	14/03/2023	300
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		300	Prazo Restante:	60	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	15/03/2023	301
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		301	Prazo Restante:	59	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	16/03/2023	302
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		302	Prazo Restante:	58	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição	
	Engenheiro			Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro	
	Carpinteiro			Eletricista	
	Pedreiro		1	Pintor	
	Armador			Serralheiro	
	Servente		1	Vigia	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM					

TF ENGENHARIA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	17/03/2023	303
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		303	Prazo Restante:	57	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

TF ENGENHARIA E MINERAS DE CONSTRUÇÃO		T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:	Pág.	
Resp. Técnico		Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	18/03/2023304	
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE						
Prazo Decorrido:		304	Prazo Restante:	56		
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00				
Prazo da Obra		360				
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02			
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01			
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02			
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01			
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		1	Pintor		3
	Armador			Serralheiro		
	Servente		1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO					
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA					
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA					
Anotação da Fiscalização						
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:			
Fabiano Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM						

 ENGENHARIA E HABITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			DIÁRIO DE OBRAS	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM			Data:	Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	19/03/2023	305
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE					
Prazo Decorrido:		305	Prazo Restante:	55	
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00			
Prazo da Obra		360			
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDADA - 02		
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01		
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02		
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01		
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Assistente Engenharia		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	1	Pintor	3	
	Armador		Serralheiro		
	Servente	1	Vigia		
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA				
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA				
Anotação da Fiscalização					
Visto Engº Contratada:			Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 D/AM					

 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO T & F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		DIÁRIO DE OBRAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - AM		Data:		Pág.
Resp. Técnico	Fabiano Fonseca da Silva	CREA	041295093-6	20/03/2023306
Obra : ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE				
Prazo Decorrido:		306	Prazo Restante:	54
Horário de Trabalho:		07:00 - 17:00		
Prazo da Obra		360		
Equipam.	BETONEIRA 400 LT A GASOLINA - 02		MAQUINA SOLDA - 02	
	BANCADA SERRA - 01		GERADOR 6.5 KVA - 01	
	SERRA MARMORE -01		BAÚS FERRAMENTAS DIVERSAS - 02	
	FURADEIRA - 01		NOTEBOOK COM IMPRESSORA - 01	
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	Engenheiro		Assistente Engenharia	
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	
	Carpinteiro		Eletricista	
	Pedreiro	1	Pintor	3
	Armador		Serralheiro	
	Servente	1	Vigia	
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO			
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM ALVENARIA LIXADA			
	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA EM ALVENARIA SELADA			
Anotação da Fiscalização				
Visto Engº Contratada:		Visto Fiscalização:		
 Fabiano Fonseca da Silva Engenheiro Civil CREA 21642 DAM				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 37.351.686/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:20 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **1F55.2137.2C6D.A8F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 52192681

Data: 01/03/2023

Hora: 16:13:24

Válida até: 31/03/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 37.351.686/0001-75 - T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 05.420.184-5 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

39718/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO : RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, Nº: 120, CEP: 69063550
BAIRRO : PETRÓPOLIS COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 46672401
CNPJ/CPF : 37351686000175

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

14/02/2023

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/05/2023

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº39718/2023

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **C38.758.12D.BAF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 14/02/2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.351.686/0001-75
Razão Social: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER 0120 / PETROPOLIS / MANAUS / AM / 69063-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2023 a 01/04/2023

Certificação Número: 2023030302154055215803

Informação obtida em 12/03/2023 17:13:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.351.686/0001-75

Certidão nº: 10372414/2023

Expedição: 12/03/2023, às 17:14:49

Validade: 08/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.351.686/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PODER JUDICIÁRIO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**CERTIDÃO Nº: 006683865****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/03/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, residente na RUA CORONEL CONRADO NIEMEYER, NUMERO 120, petropolis, CEP: 69063-550, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 37.351.686/0001-75. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, domingo, 12 de março de 2023.

PEDIDO Nº:

0006683865





ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

CARTA CONTRATO 008/2022-SEMOSP

CARTA CONTRATO CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS E A EMPRESA T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, PARA A "AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM", NA FORMA ABAIXO.

Saibam todos quanto o presente instrumento virem ou dele tomarem conhecimento que aos **dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (19/05/2022)**, nesta cidade na sede da Prefeitura - situada na Praça Eduardo Ribeiro, 2042, presentes, de um lado o **Município de Parintins**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, brasileiro, residente e domiciliado a Avenida Paulo Teixeira, N.º 626 – Bairro Santa Rita de Cássia, CEP: 69152-000 Parintins – Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 0720019-6 – SESEG/AM e CPF nº 235.150.072-53, e de outro a empresa **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** inscrita no CNPJ Nº 37.351.686/0001-75, sediada na Rua Coronel Conrado Niemeyer, nº 120, bairro Petrópolis, CEP nº 69.063-550, cidade de Manaus/AM, a seguir designada **CONTRATADA**, os quais tendo em vista o que consta do **Processo Administrativo nº 008/2022-CML, Carta Convite Nº 008/2022-CML**, firmam, a presente **CARTA CONTRATO**, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendida as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto desta **CARTA CONTRATO** tem por Objetivo a **"AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VÁLERIA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM"**, com o prazo de execução de **60 (sessenta)** dias contados a partir da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de vigência contratual será de **90 (noventa)** dias, contados da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo se presentes os requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP: 69151-530
 e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins – AM
 C.N.P.J. – 04.329.736/0005 - 69



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

3.1 - O valor global da presente **CARTA CONTRATO** é R\$ 328.491,26 (trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavo), a ser empenhado no exercício vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - O regime de execução será efetuado obedecendo às especificações contidas em cada Ordem de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela **CONTRATANTE**, em moeda corrente, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis após apresentação da respectiva Nota Fiscal, em duas vias, devidamente atestada pelo setor competente.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a adotar todas as medidas acautelatórias necessárias para evitar danos a terceiros, em razão da execução dos serviços ajustados, sendo sua exclusiva responsabilidade eventuais danos por atos comissivos ou omissos.

CLÁUSULA SETIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - A despesa decorrente desta **CARTA CONTRATO** correrá à conta da seguinte dotação do orçamento do **CONTRATANTE**:

- **Unidade Orçamentária:** 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- **Programa de Trabalho:** 10.302.0052.1025.0000 - Construção, Ampliação, Reforma e/ou Equipamentos de Unidades de Saúde no Município;
- **Natureza da Despesa:** 4.4.90.51 – Obras e Instalações;
- **Fonte de Recurso:** 010 – Recursos Próprios.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 - Este contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 com as consequências, conforme o caso, elencadas nos arts. 86 e 87, tudo da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO

9.1 - A **CONTRATADA** e seu representante legal apresentarem neste ato os documentos comprobatórios das condições jurídicos – pessoais relativos à empresa

Rua Jonathas Pedrosa – Centro – CEP: 69151-530
e-mail: licitapin@hotmail.com - Parintins – AM
C.N.P.J. – 04.329.736/0005 - 69



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP**

contratada e a seu representante, indispensáveis à lavratura deste Termo, inclusive quitações de impostos municipais e Certificados de Regularidade da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO DO TERMO

10.1 - A **CONTRATANTE** obriga-se a promover, às suas expensas a publicação, da presente **CARTA CONTRATO**, no prazo de lei, no quadro de Aviso Legal da Prefeitura Municipal.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FÔRO

11.1 - Para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas de execução do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Parintins, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim por estarem acordados, firmam a presente **CARTA CONTRATO** em 2 (duas) vias de igual teor e valor probante, as quais vão assinadas pelas partes contratadas.

Parintins (AM), 19 de maio de 2022.


FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins
CONTRATANTE


**T.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ Nº 37.351.686/0001-75
CONTRATADA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20220321798

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

FABIANO FONSECA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0412950936**

Registro: **0412950936AM**

Empresa contratada: **T F COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Registro: **0049489712-AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AM**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

Nº: **2052**

CEP: **69151271**

Contrato: **008/2022**

Celebrado em: **19/05/2022**

Valor: **R\$ 328.491,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA DA VALÉRIA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PARINTINS**

UF: **AM**

CEP: **69151271**

Data de Início: **19/05/2022**

Previsão de término: **18/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-2.629841, 56.722253**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS**

CPF/CNPJ: **04.329.736/0001-69**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO

136,88

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE SAUDE DA COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FABIANO FONSECA DA SILVA - CPF: 012.275.862-56

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS - CNPJ: 04.329.736/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **17/06/2022**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8304790869**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: BZ152
 Impresso em: 18/06/2022 às 10:06:36 por: , ip: 131.255.10.227

www.crea-am.org.br
 Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br
 Fax: (92) 2125-7122

