



ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ENGENHEIRO SÓCIO PROPRIETÁRIO E MESTRE DE OBRA IN LOCO FULL TIME DA OBRA



LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA, COM GABARITO EM MADEIRA DE LEI





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ATERRO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO PALCO



ATERRO E EXECUÇÃO DA ALVENARIA DO PALCO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO PALCO DO GINASIO (ATERRO / ALVENARIA / CHAPISCO / REBOCO / CONTRAPISO)



EXECUÇÃO DO PALCO DO GINASIO (ATERRO / ALVENARIA / CHAPISCO / REBOCO / CONTRAPISO)





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS, VIGA BALDRAME E BLOCOS DA FUNDAÇÃO



FABRICAÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA FORMA DAS VIGAS BALDRAMES





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

FABRICAÇÃO DE PAINEIS EM MADEIRA DE LEI PARA FORMA DOS PILARES



FORMA, FERRAGEM E CONCRETO DAS SAPATAS DE EXTREMA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

FORMA, FERRAGEM E CONCRETO MAGRO AO FUNDO DE UM BLOCO DE FUNDAÇÃO



CONCRETO EM SAPATA DE EXTREMA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE FUNDAÇÃO



DESFORMA DE UM PILAR DE CONCRETO JÁ CURADO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

VIGA BALDRAME CONCRETADA



ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARÇÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARCÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL



ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM 1 CAMADA PROTETORA DE ZARCÃO E 2 CAMADAS DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZUL





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO PISO DA AMPLIAÇÃO DO GINASIO COM TELA NERVURADA CONFORME PROJETO



APLICAÇÃO DE GOLDA EM CONCRETO PARA POSTERIOR LIXAMENTO COM MAQUINA DE POLIR CONCRETO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

CARREGAMENTO DE CAMINHÕES COM MATERIAL PARA A OBRA



BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE



BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM


LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 12/11/2021 - 26/11/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE

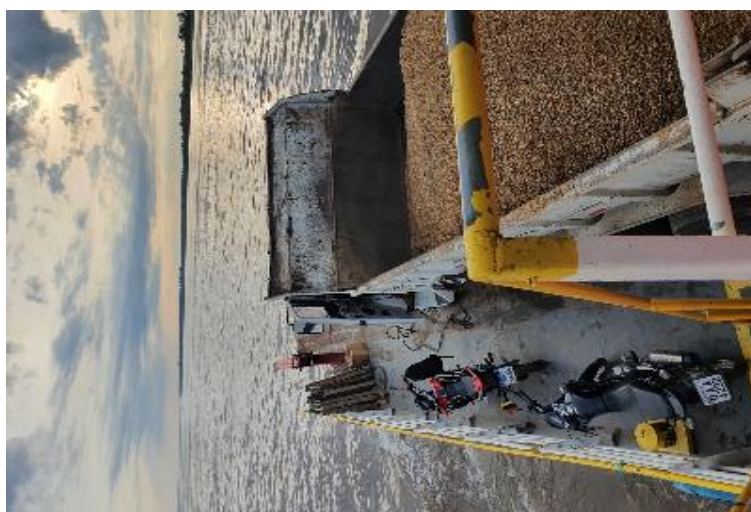

BALSA COM SEIXO E AREIA PARA TRANSPORTAR ATÉ A VILA AMAZONIA E DE LA IR POR ESTRADA ATÉ A COMUNIDADE





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

ENGENHEIRO, MESTRE DA OBRA E A PLACA DA OBRA AO FUNDO



ALVENARIA COM TIJOLO DEITADO NO PRIMEIRO PATAMAR DA ARQUIBANCADA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

ALVENARIA COM TIJOLO DEITADO NO PRIMEIRO E SEGUNDO PATAMAR DA ARQUIBANCADA



SERVIÇO DE ATERRO NA PARTE INTERIOR DOS PATAMARES DOS DEGRAIS DAS ARQUIBANCADAS





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

SERVIÇO DE ATERRO NA PARTE INTERIOR DOS PATAMARES DOS DEGRAIS DAS ARQUIBANCADAS



SERVIÇO DE ATERRO NA PARTE INTERIOR DOS PATAMARES DOS DEGRAIS DAS ARQUIBANCADAS





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

SERVIÇO DE ATERRO NA PARTE INTERIOR DOS PATAMARES DOS DEGRAIS DAS ARQUIBANCADAS



EXECUÇÃO DA ALVENARIA DOS DEGRAIS DAS ARQUIBANCADAS





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



PILARES E TESOURA METÁLICA INSTALADA





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 27/11/2021 - 19/12/2021

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO

TESOURA E TERÇAS METÁLICAS INSTALADAS



COBERTURA AMPLIADA, COM CALHAS INSTALADAS E PRONTAS PARA USO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 20/12/2021 - 07/01/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 20/12/2021 - 07/01/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 20/12/2021 - 07/01/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 20/12/2021 - 07/01/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO





ENGENHARIA E
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PALCO NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO HENRIQUE

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA RITA DA VALÉRIA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM

REFERÊNCIA: SINAPI 07/2021 - Amazonas

PERÍODO: MEDIÇÃO: 20/12/2021 - 07/01/2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO

ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO



ARQUIBANCADA FINALIZADA, CHAPISCADA E REBOCADA E COM CONTRA PISO PRONTO

